


DESCRIZIONE FASE: "4" - "5" - "6" - "7"

- TRAFFICO:**
- DEFINITIVO SU NUOVA SEDE SECONDO CONFIGURAZIONE DI PROGETTO DA PK 18+280.00 A 21+710.00
 - SEDE ALTERNATA SU ATTUALE SS16 NELLE DUE DIREZIONI DA PK 21+710.00 A PK 22+280.00
- LAVORAZIONI:**
- RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E REALIZZAZIONE DELLA 'CONTINUITA' CON 'VIABILITA' INTERFERITE ED ACCESSI.
 - NEI TRATTI IN LAVORAZIONE OBBLIGATORIAMENTE SOTTO TRAFFICO, SARANNO ADOTTATE OPPORTUNE SOTTO-FASI A GARANZIA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI E DELLA MAESTRANZE.
- REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:**
- FASE 4:**
-
- FASE 5:**
- 1) Completamento tratto finale nuova sede SS16 da PK 21+660.00 A PK 22+280.00 (esecuzione lavori in carreggiate alternate)
- FASE 6:**
- 1) Demolizione Rampa provvisoria n°5
 - 2) Demolizione Rampa provvisoria n°6
 - 3) Opere di rifiniture parziali e Definitive con Completamento delle Opere a Verdi esterne alla sede stradale
- FASE 7:**
- 1) Rimozione Area Cantiere operativo CO_02 e ripristino area
 - 2) Rimozione Area Tecnica AT_4 e ripristino area

SCHEMA FASI REALIZZATIVE - FASE 5 (DA PK 21+660.00 A PK 22+280.00)

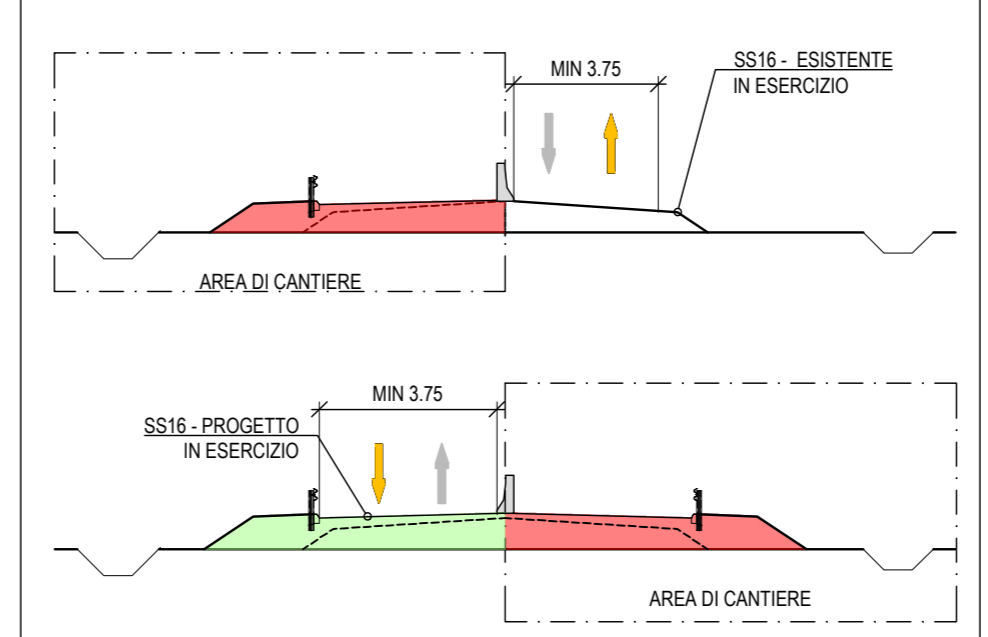

sanas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Strada Statale 16 "ADRIATICA"
LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA E SAN SEVERO

PROGETTO DEFINITIVO COD. BA 136

PROGETTISTI: **RIFA**, **AMBERG ENGINEERING**, **ETACONS S.p.A.**, **cdb** INGEGNERI ASSOCIATI, **LAND**

PROGETTISTI: Ing. Tommaso Di Bari - Ordine Ing. Taranto n. 1083
Ing. Vito Caporaso - Ordine Ing. Taranto n. 1080
Arch. Andrea Gior - Ordine Arch. Bari n. 1339 - Proprietà e Rendite Banco UNI Bari 54
Ing. Pirina Sisti - Ordine Ing. Lecce n. 842

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Alessandro Aiello - Ordine Ing. Genova n. 79954

COLLABORATORI:
Ing. Cristina Siano - Ordine Ing. Lecce n. 3648
Arch. Lucia Maria Lapore - Ordine Arch. Lecce n. 541

IL GEOLOGO
Dott. Gian Maria Stani - Ordine Geol. Puglia n. 279

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Vito Caporaso - Ordine Ing. Taranto n. 1080

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI
Ing. Nicola Marzi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Corrado Marzi

COLLABORATORI:
Arch. Claudio Massaro
Dott. Geol. Pasquale Scario

CANTIERIZZAZIONE
Fasi di traffico e costruzione - Fase 4-5-6-7 - Tav.5 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:	FOGLIO:
STBA136	T00CA00CANPE15_A	A	1:2000	05/05
03				
02				
01				
00	PRIMA EMISSIONE	Maggio 2022	F. Bolettieri	V. Caporaso
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO
