

Aregu Wind Srl

[Ottobre 2022]

Parco Eolico Aregu sito nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS)

Cronoprogramma



Aregu Wind Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesAre-CLP-CIV-TR-10	Rev 0	Pagina 2 di 5
----------------	---------------------	------------------------------------	-------	------------------

Regione Autonoma della Sardegna	Comune di Giave	Comune di Cossoine	Comune di Cheremule
			

<i>Committente:</i>	Aregu Wind Srl	Aregu Wind Srl Via Sardegna, 40 00187 Roma P.IVA/C.F. 16181141009
---------------------	-----------------------	---

<i>Titolo del Progetto:</i>	Parco Eolico Aregu sito nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS)
-----------------------------	---


<i>Documento:</i>	CRONOPROGRAMMA	<i>N° Documento:</i>	IT-VesAre-CLP-CIV-TR-10
-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------

STUDIO DI PROGETTAZIONE ING. MAURIZIO CONTU	<i>Progettista:</i> <i>Ing. Maurizio Contu</i>
Via Portoscals, 33 09124 Cagliari (CA) Tel. +39 070 4511580 Mob. +39 3388487648 e-mail: contumaurizio@gmail.com	


Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	19.10.2022	Prima emissione			

ID	Nome attività	Durata	Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4													
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14
1	Parco Eolico Aregu 66 Mwp	253 g	[Gantt bar from s1 to s14]													
2	Avvio Cantiere	30 g	[Gantt bar from s1 to s7]													
3	Consegna Lavori	1 g	[Small blue bar at s1]													
4	Allestimento Cantiere	7 g	[Blue bar from s1 to s3]													
5	Attività di tracciamento	25 g	[Blue bar from s1 to s6]													
6	Interventi su viabilità: come da report "MOLISANA"	25 g	[Blue bar from s2 to s7]													
7	Adeguamento Viabilità esistente	75 g	[Gantt bar from s4 to s14]													
8	Adeguamento strade esistenti	70 g	[Blue bar from s4 to s14]													
9	Realizzazione innesti/slarghi su viabilità esistente	60 g	[Blue bar from s7 to s14]													
10	Piazzole Temporanee Pale AG	131 g	[Gantt bar from s10 to s14]													
11	Nuova Viabilità di accesso Pale AG	60 g	[Blue bar from s10 to s14]													
12	Predisposizione piano di posa Piazzole Temporanee	40 g	[Blue bar from s12 to s14]													
13	Scavo Plinti Pale AG 01-02-03-04-05-06	29 g														
14	Scavo Plinti Pale AG 07-08-09-10-11	30 g														
15	Fondazioni Pale AG	82 g														
16	Installazione Pale AG	82 g														
17	Montaggio torri, navicella e pale	46 g														
18	Collegamenti elettrici Pale AG	30 g														
19	Opere edili e tecnologiche	30 g														
20	Collaudi e Avvio Impianto	21 g														
21	Collaudo impianto eolico	15 g														
22	Avviamento Impianto	7 g														

COMMITTENTE: AREGU WIND SRL

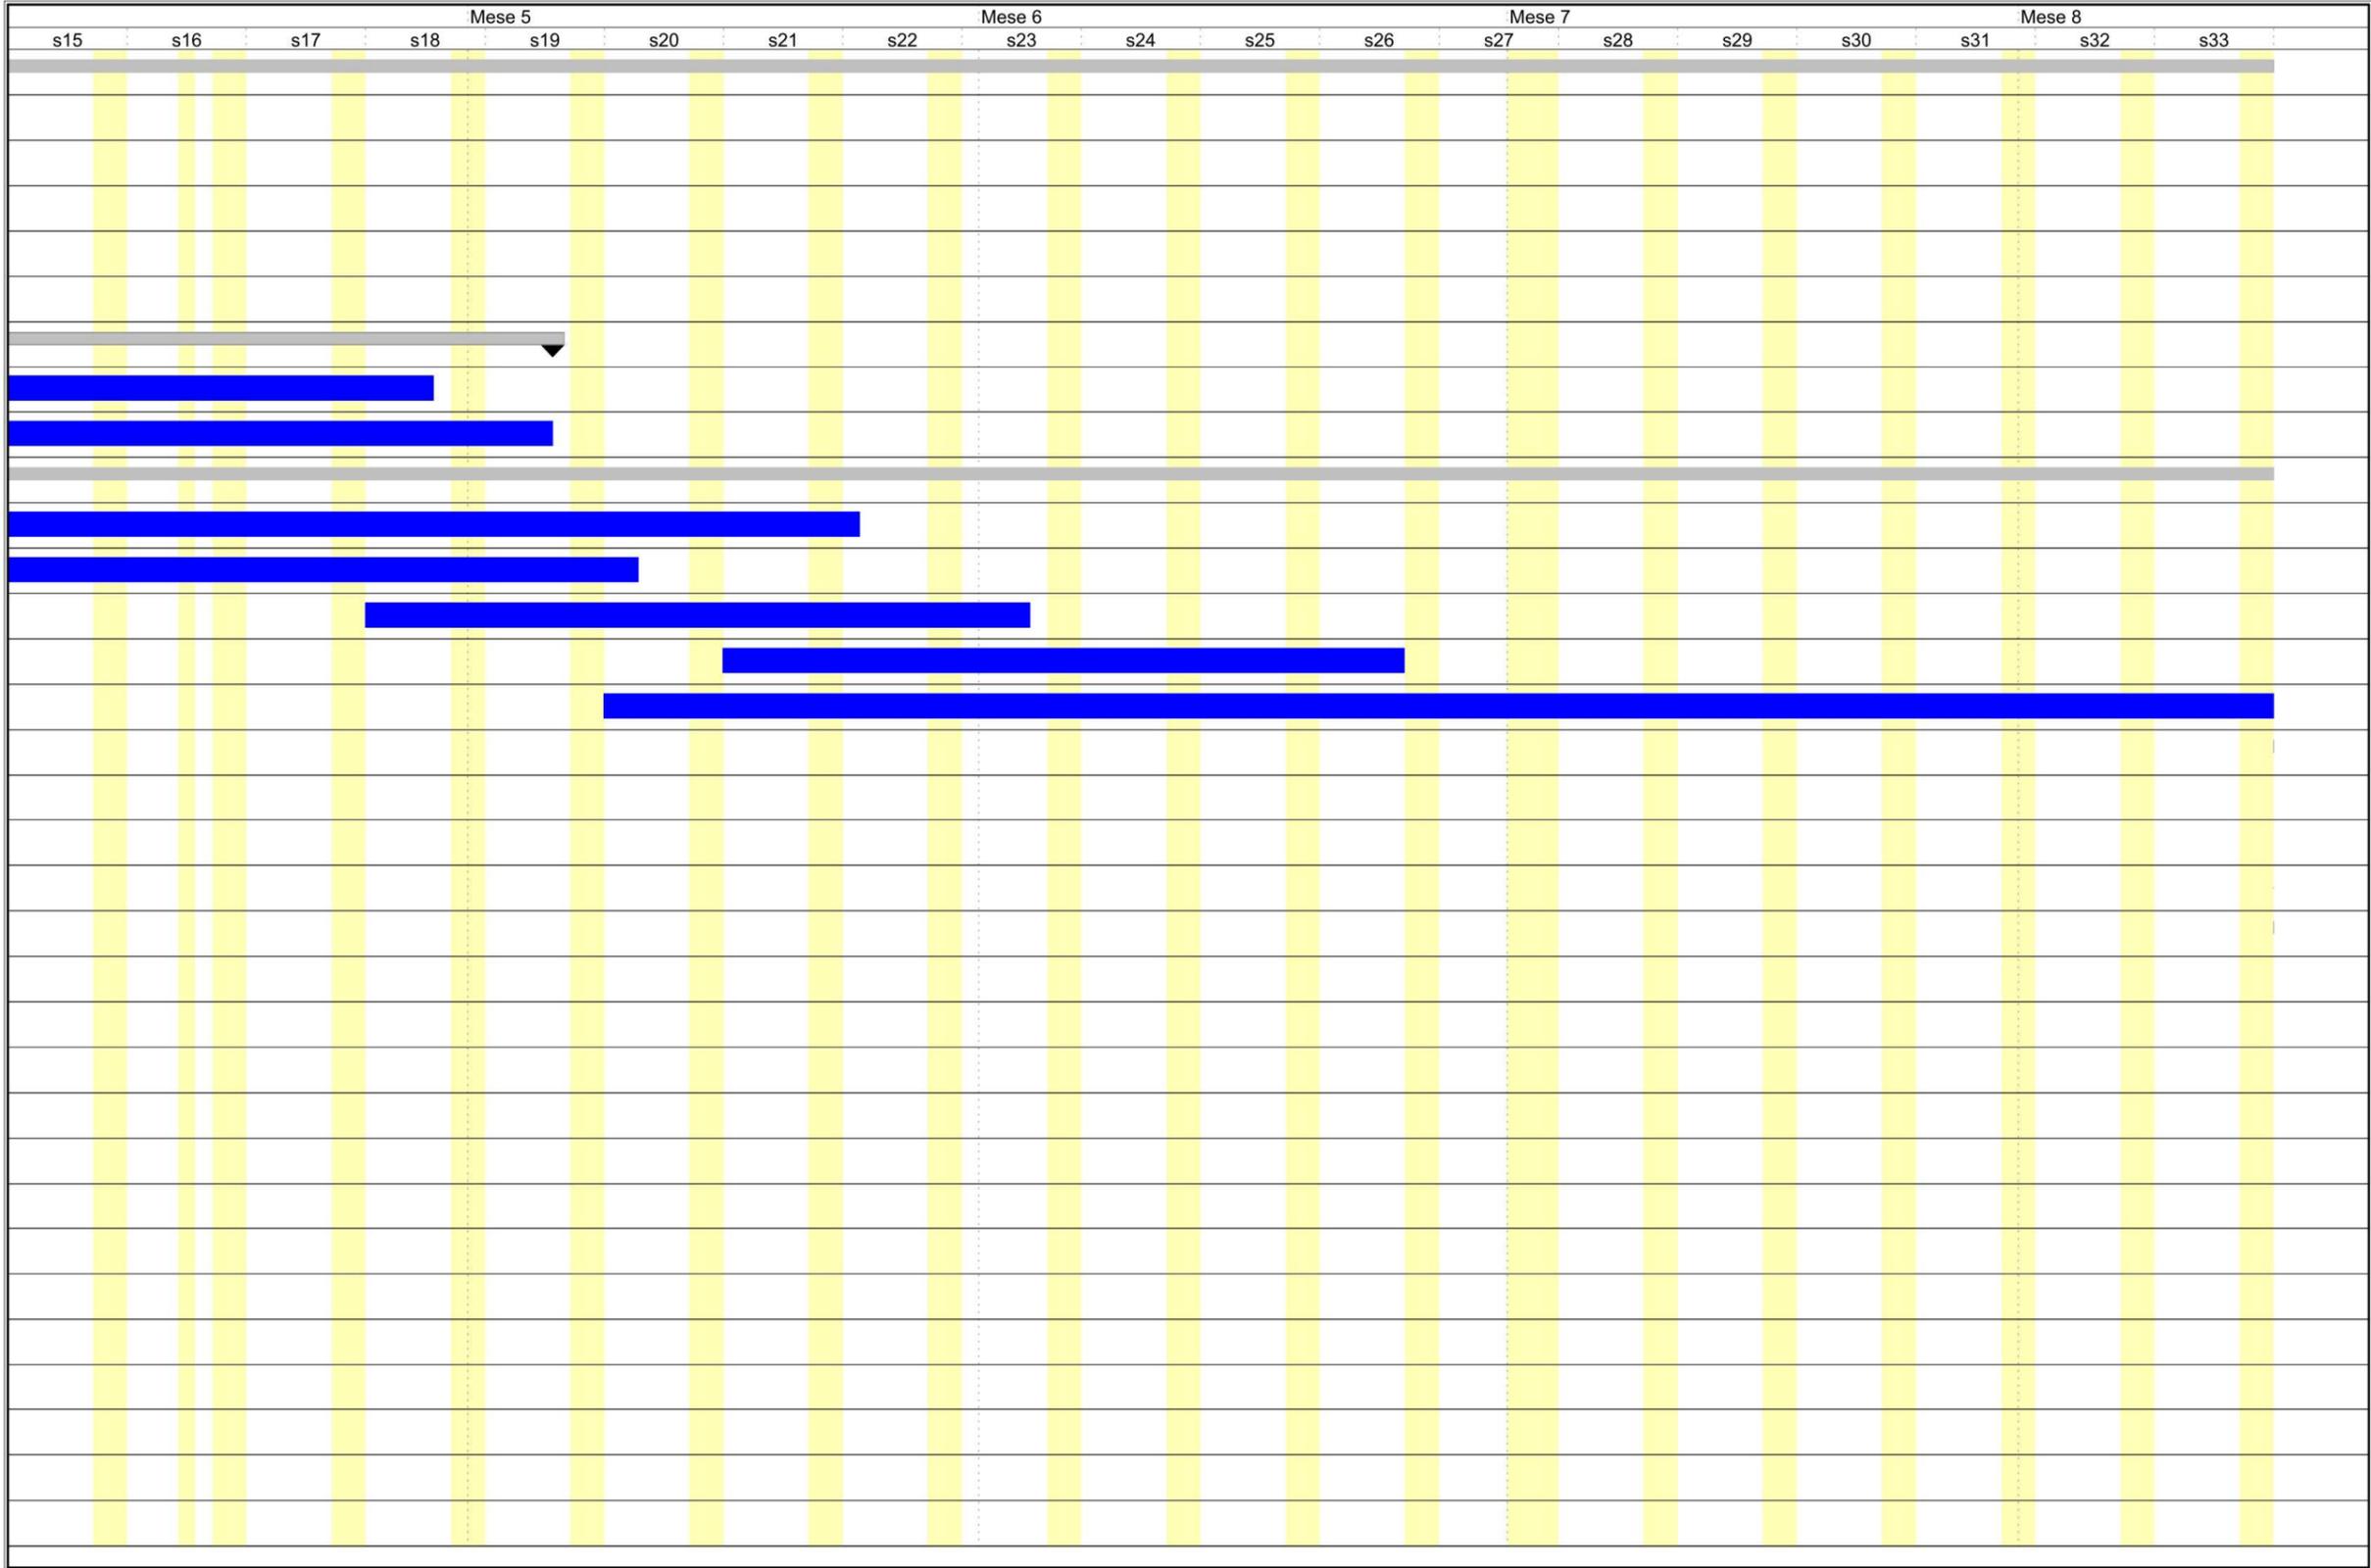

COMMITTENTE: AREGU WIND SRL

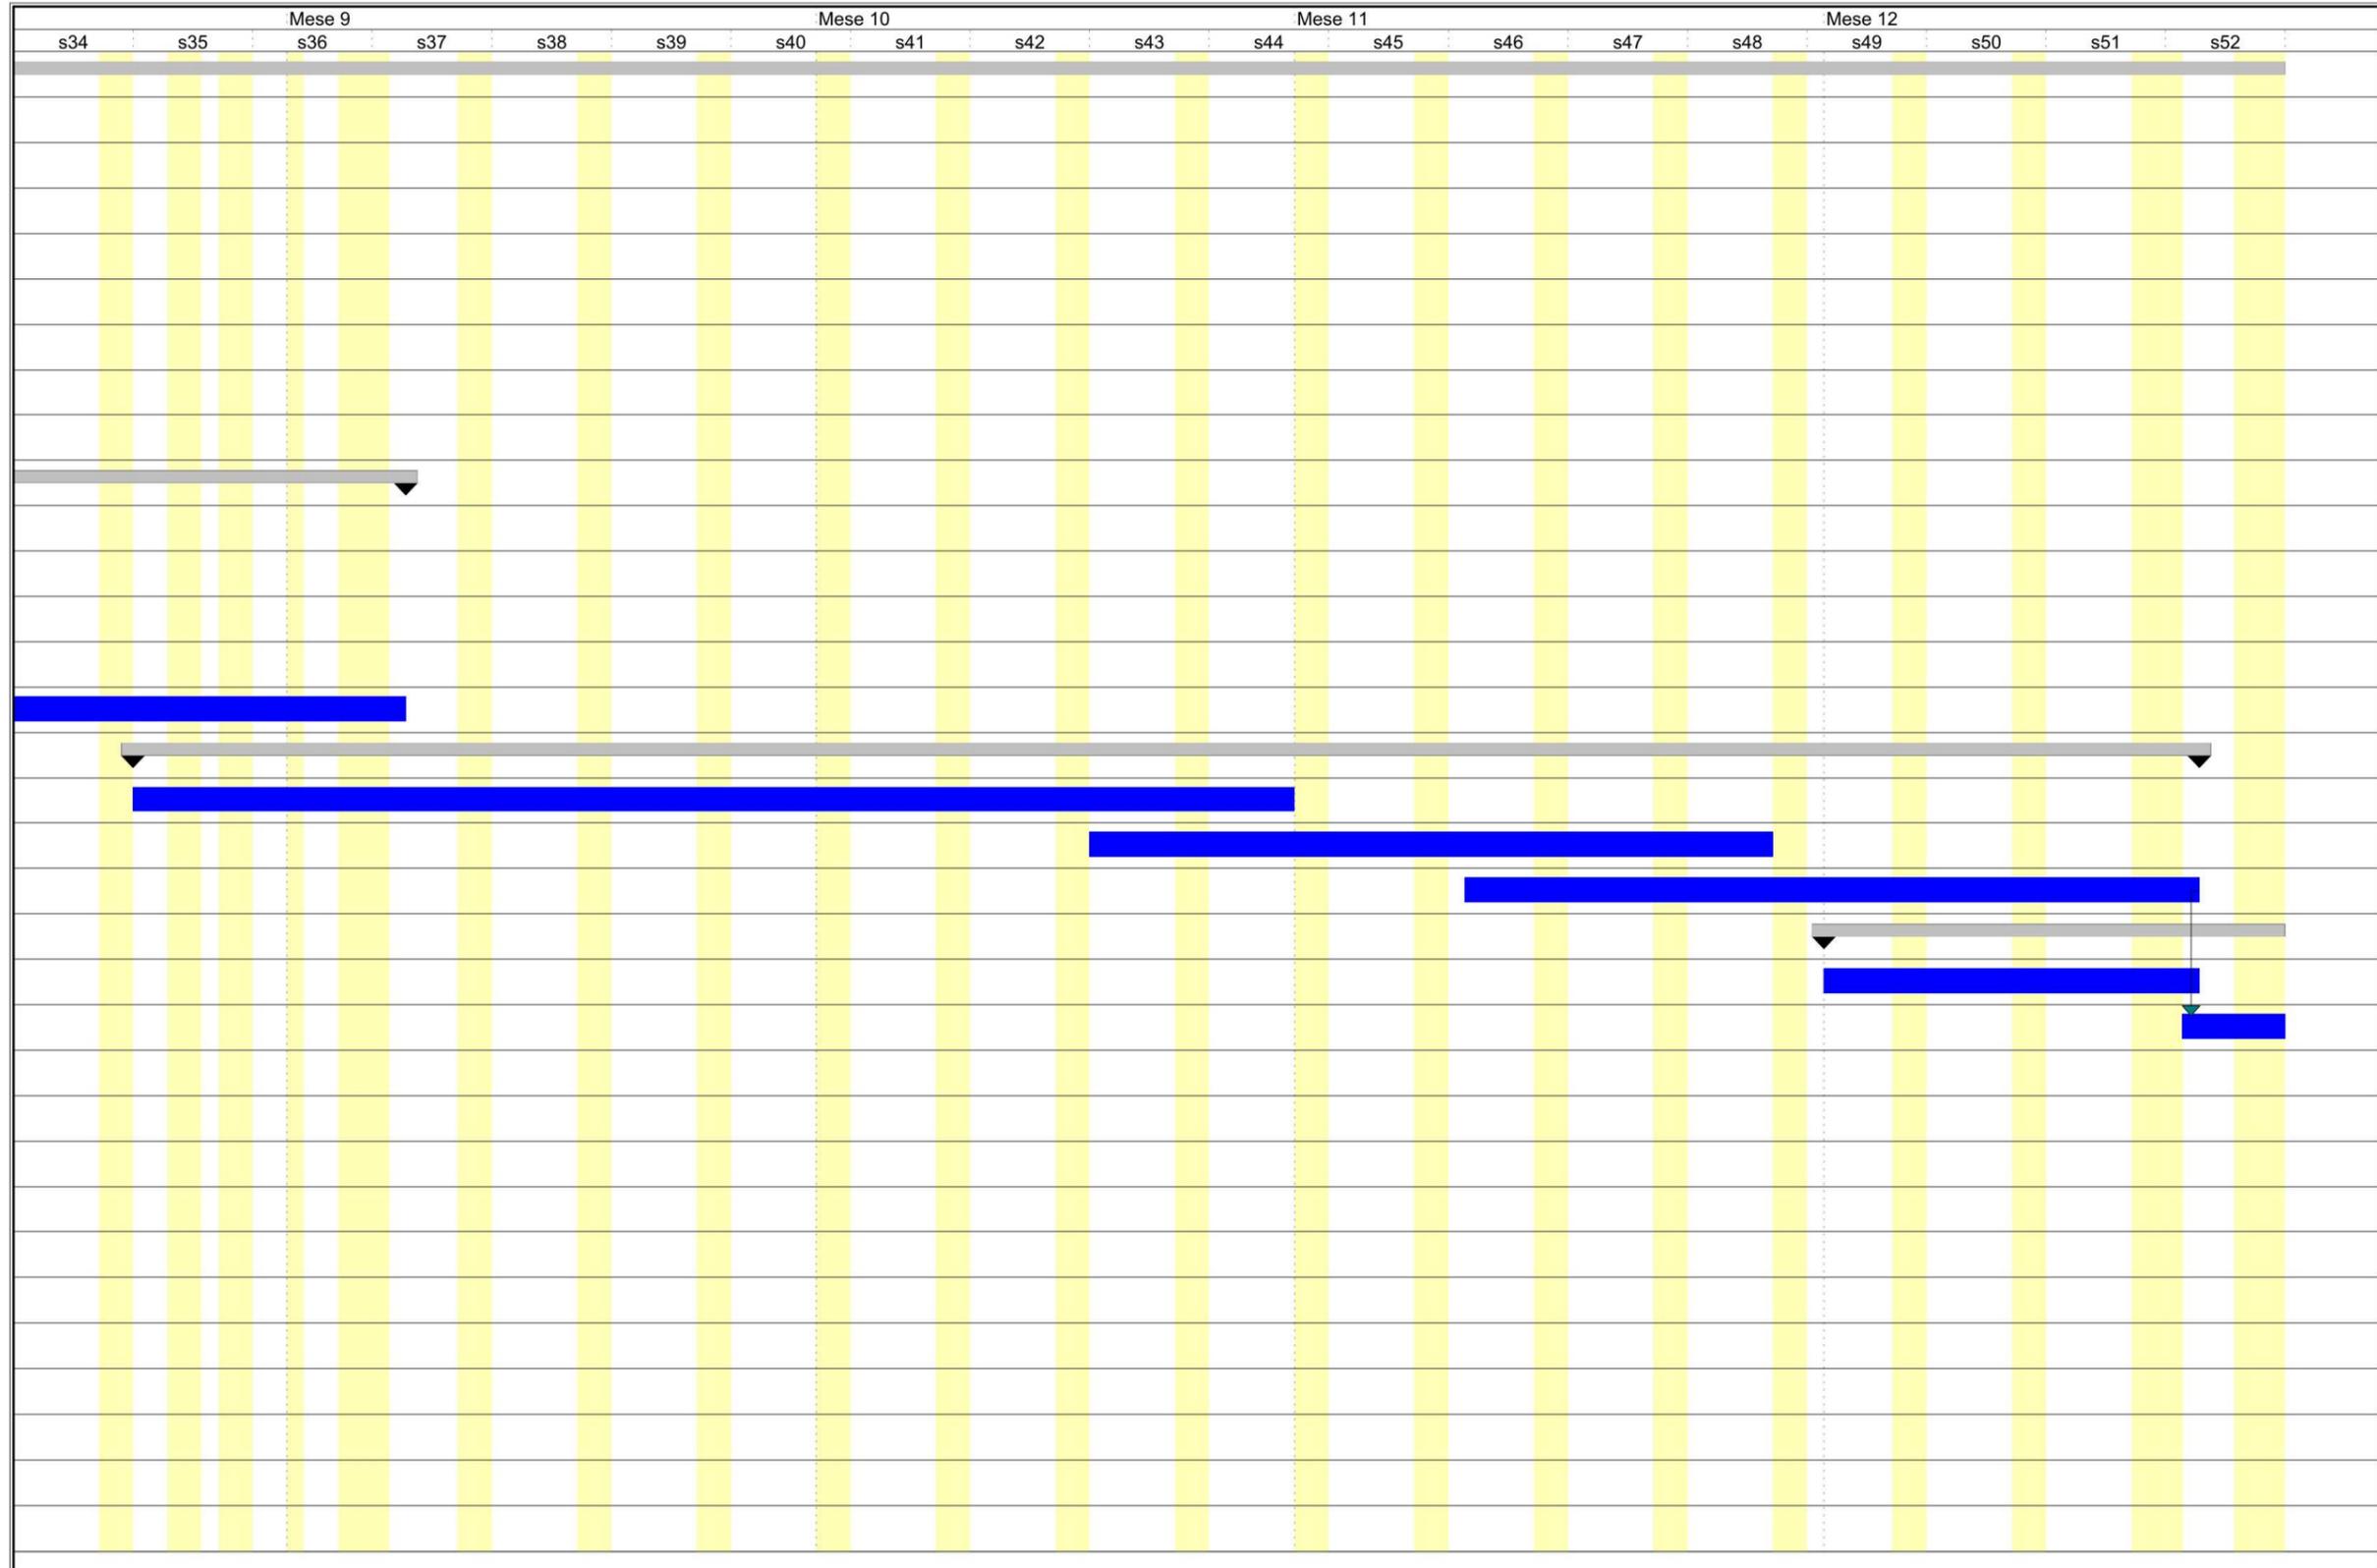

COMMITTENTE: AREGU WIND SRL
