


FASE 1  
1:500



FASE 2  
1:500



FASE 3  
1:500

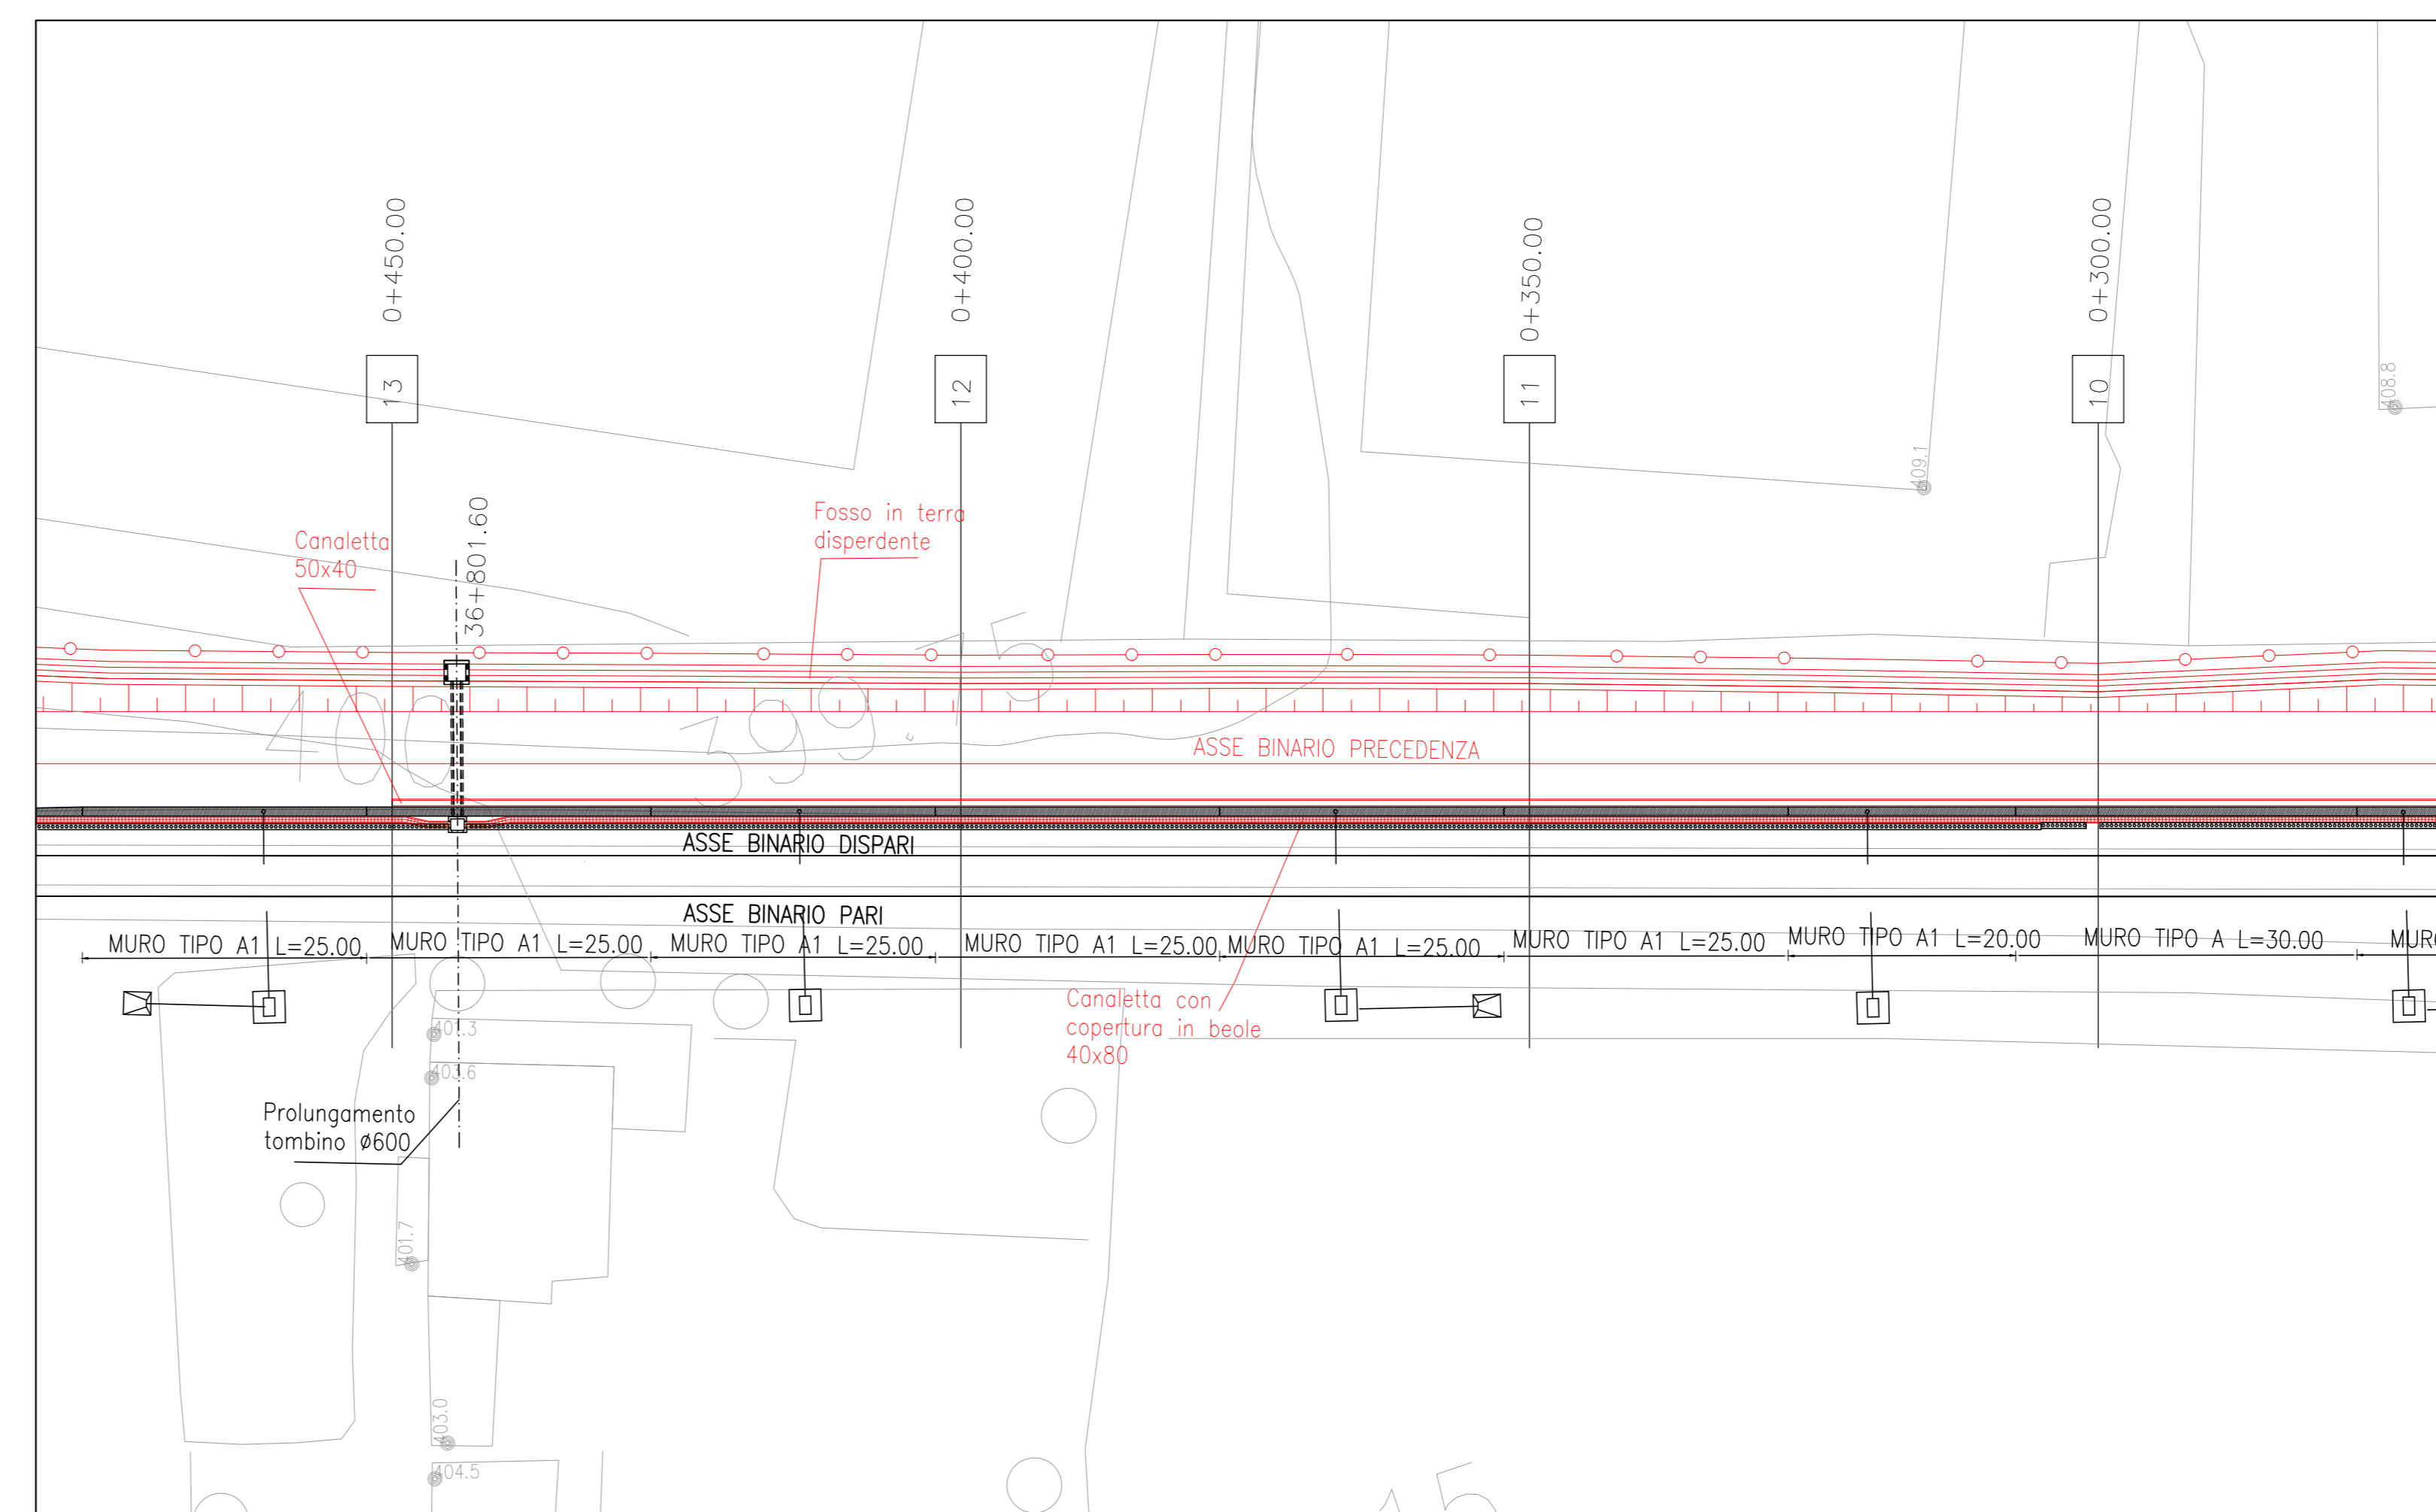

FASE 4  
1:500

- FASE 1
- Realizzazione tombino idraulico ø 600 (Prog. Km 36+506.30);
  - Realizzazione prolungamento tombino idraulico ø 600 (Prog. Km. 36+801.60).
- FASE 2 - In interruzione programmata di orario (PO) e disalimentazione della tensione elettrica della Linea
- Realizzazione berlinese di micropali a sostegno dei tronconi all'interno della proprietà privata (Acciaierie Beltrame) dalla Prog. Km 37+857.40 alla Prog. Km 36+107.40;
  - Realizzazione berlinese di micropali per la realizzazione dei muri di sostegno del nuovo binario di precedenza. Le opere provvisorie dovranno essere disposte in modo da non interferire i basamenti dei pali TE esistenti;
  - Realizzazione dei concetti di muro a cavallo dei basamenti di pali TE esistenti.
- FASE 3 - In interruzione programmata di orario (PO) e disalimentazione della tensione elettrica della Linea
- Montaggio dei nuovi pali TE sulla testa dei muri realizzati e attivazione della linea nuova;
  - Rimozione dei pali TE esistenti e demolizione dei basamenti;
  - Realizzazione dei restanti concetti di muro in corrispondenza dei pali TE rimossi.
- FASE 4 - Ripresa dell'esercizio ferroviario e ripristino dell'alimentazione della tensione elettrica della Linea esistente Torino-Lione
- Allargamento della sede ferroviaria in corrispondenza del nuovo binario di precedenza;
  - Realizzazione del nuovo binario di precedenza e delle opere impiantistiche (idraulica di piattaforma, canalizzazioni elettriche, recinzioni e parapetti, ecc.).

- LEGENDA
- Interventi realizzati nella fase
  - Interventi realizzati in fasi precedenti
  - Demolito nella fase

COMMITTENTE:  **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA MODANE-TORINO**  
**ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO-AVIGLIANA**  
**REALIZZAZIONE DI PRECEDENZE A MODULO 750 m NELLE LOCALITÀ DI**  
**BORGONE-BRUZOLO (BIN. DISPARI) E CONDOVE-VAIE (BIN. PARI)**

**PM BRUZOLO**  
**FASI REALIZZATIVE**

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NT01 04 D 26 P8 R10200 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazio	Data
A	Emissione esecutiva	A. Ingini	02/09/2014	[Signature]	02/09/2014	[Signature]	02/09/2014	[Signature]	02/09/2014

File: H100402088020001A.DWG In. Etab: [Signature]
