

Impianto agrivoltaico "Piana Palazzo" Comune di Rotello (CB)

Proponente



SORGENIA RENEWABLES S.r.l
Via Algardi, 4 – 20148 Milano
tel. 02 671941 – fax 02 67194210
<http://www.sorgenia.it>
sorgeniarenewables@sorgenia.it
PEC sorgenia.renewables@legalmail.it



CRONOPROGRAMMA


PROGETTISTA



Tiemes Srl
Via Sangiorgio 15- 20145 Milano
tel. 024983104/ fax. 0249631510
pec: info@pec.tiemes.it
www.tiemes.it


0	30/11/2021	Prima emissione	LM	VDA		
Rev.	Data emissione	Descrizione	Preparato	Approvato		
CODICE						
Origine File: 20006RTL.SA.D.01.00 - Cronoprogramma.docx		Commessa	Proc	Tipo doc	Num	Rev
		20006	RTL	SA	D	01 00
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden						

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	dic	Tri 1, 2023 gen	feb	mar	Tri 2, 2023 apr	mag	giu	Tri 3, 2023 lug	ago	set	Tri 4, 2023 ott	nov	dic	Tri 1, 2024 gen	
1	1 Attività owner	6 g	lun 09/01/23	lun 16/01/23																
2	1.1 permesso a costruire	1 g	lun 09/01/23	lun 09/01/23																
3	1.1.1 esito positivo AU	1 g	lun 09/01/23	lun 09/01/23																
4	1.2 Due Diligence	5 g	mar 10/01/23	lun 16/01/23	3															
5	1.2.1 DD Legale	5 g	mar 10/01/23	lun 16/01/23																
6	1.2.2 DD Corporative	5 g	mar 10/01/23	lun 16/01/23																
7	1.2.3 DD amministrativo	5 g	mar 10/01/23	lun 16/01/23																
8	1.2.4 DD Tecnico	5 g	mar 10/01/23	lun 16/01/23																
9	2 Attività EPC	220 g	mar 10/01/23	lun 13/11/23																
10	2.1 Progettazione	25 g	mar 10/01/23	lun 13/02/23	3															
11	2.1.1 Pull out test	10 g	mar 10/01/23	lun 23/01/23																
12	2.1.2 Progetto esecutivo impianto fotovoltaico	15 g	mar 24/01/23	lun 13/02/23	11															
13	2.1.3 Progetto esecutivo di connessione	15 g	mar 24/01/23	lun 13/02/23	11															
14	2.2 Procurement incluso consegna in sito	60 g	mar 14/02/23	lun 08/05/23	12															
15	2.2.1 Moduli	60 g	mar 14/02/23	lun 08/05/23																
16	2.2.2 Fondazioni tracker	25 g	mar 14/02/23	lun 20/03/23																
17	2.2.3 Strutture tracker	35 g	mar 14/02/23	lun 03/04/23																
18	2.2.4 Inverters	45 g	mar 14/02/23	lun 17/04/23																
19	2.2.5 Stazioni MT	45 g	mar 14/02/23	lun 17/04/23																
20	2.2.6 Cabina di smistamento	45 g	mar 14/02/23	lun 17/04/23																
21	2.2.7 Cavi	45 g	mar 14/02/23	lun 17/04/23																
22	2.2.8 Recinzione e cancelli	15 g	mar 14/02/23	lun 06/03/23																
23	2.2.9 Sistema di monitoraggio	30 g	mar 14/02/23	lun 27/03/23																
24	2.2.10 Sistema di sicurezza - TVCC	30 g	mar 14/02/23	lun 27/03/23																
25	2.2.11 Altri materiali per la connessione	40 g	mar 14/02/23	lun 10/04/23																
26	2.3 Installazione del cantiere	16 g	mar 09/05/23	mar 30/05/23	14															
27	2.3.1 Installazione del cantiere	1 g	mar 09/05/23	mar 09/05/23																
28	2.3.2 Attività di tracciamento	5 g	mer 10/05/23	mar 16/05/23	27															
29	2.3.3 Pulizia del sito	15 g	mer 10/05/23	mar 30/05/23	27															
30	2.4 Costruzione dell'impianto agrivoltaico	119 g	mer 31/05/23	lun 13/11/23	26															
31	2.4.1 Opere civili	15 g	mer 31/05/23	mar 20/06/23																
32	2.4.1.1 Recnizione e cancelli	15 g	mer 31/05/23	mar 20/06/23																
33	2.4.1.2 Strada temporanea	10 g	mer 31/05/23	mar 13/06/23																
34	2.4.1.3 Strada definitiva	10 g	mer 31/05/23	mar 13/06/23																

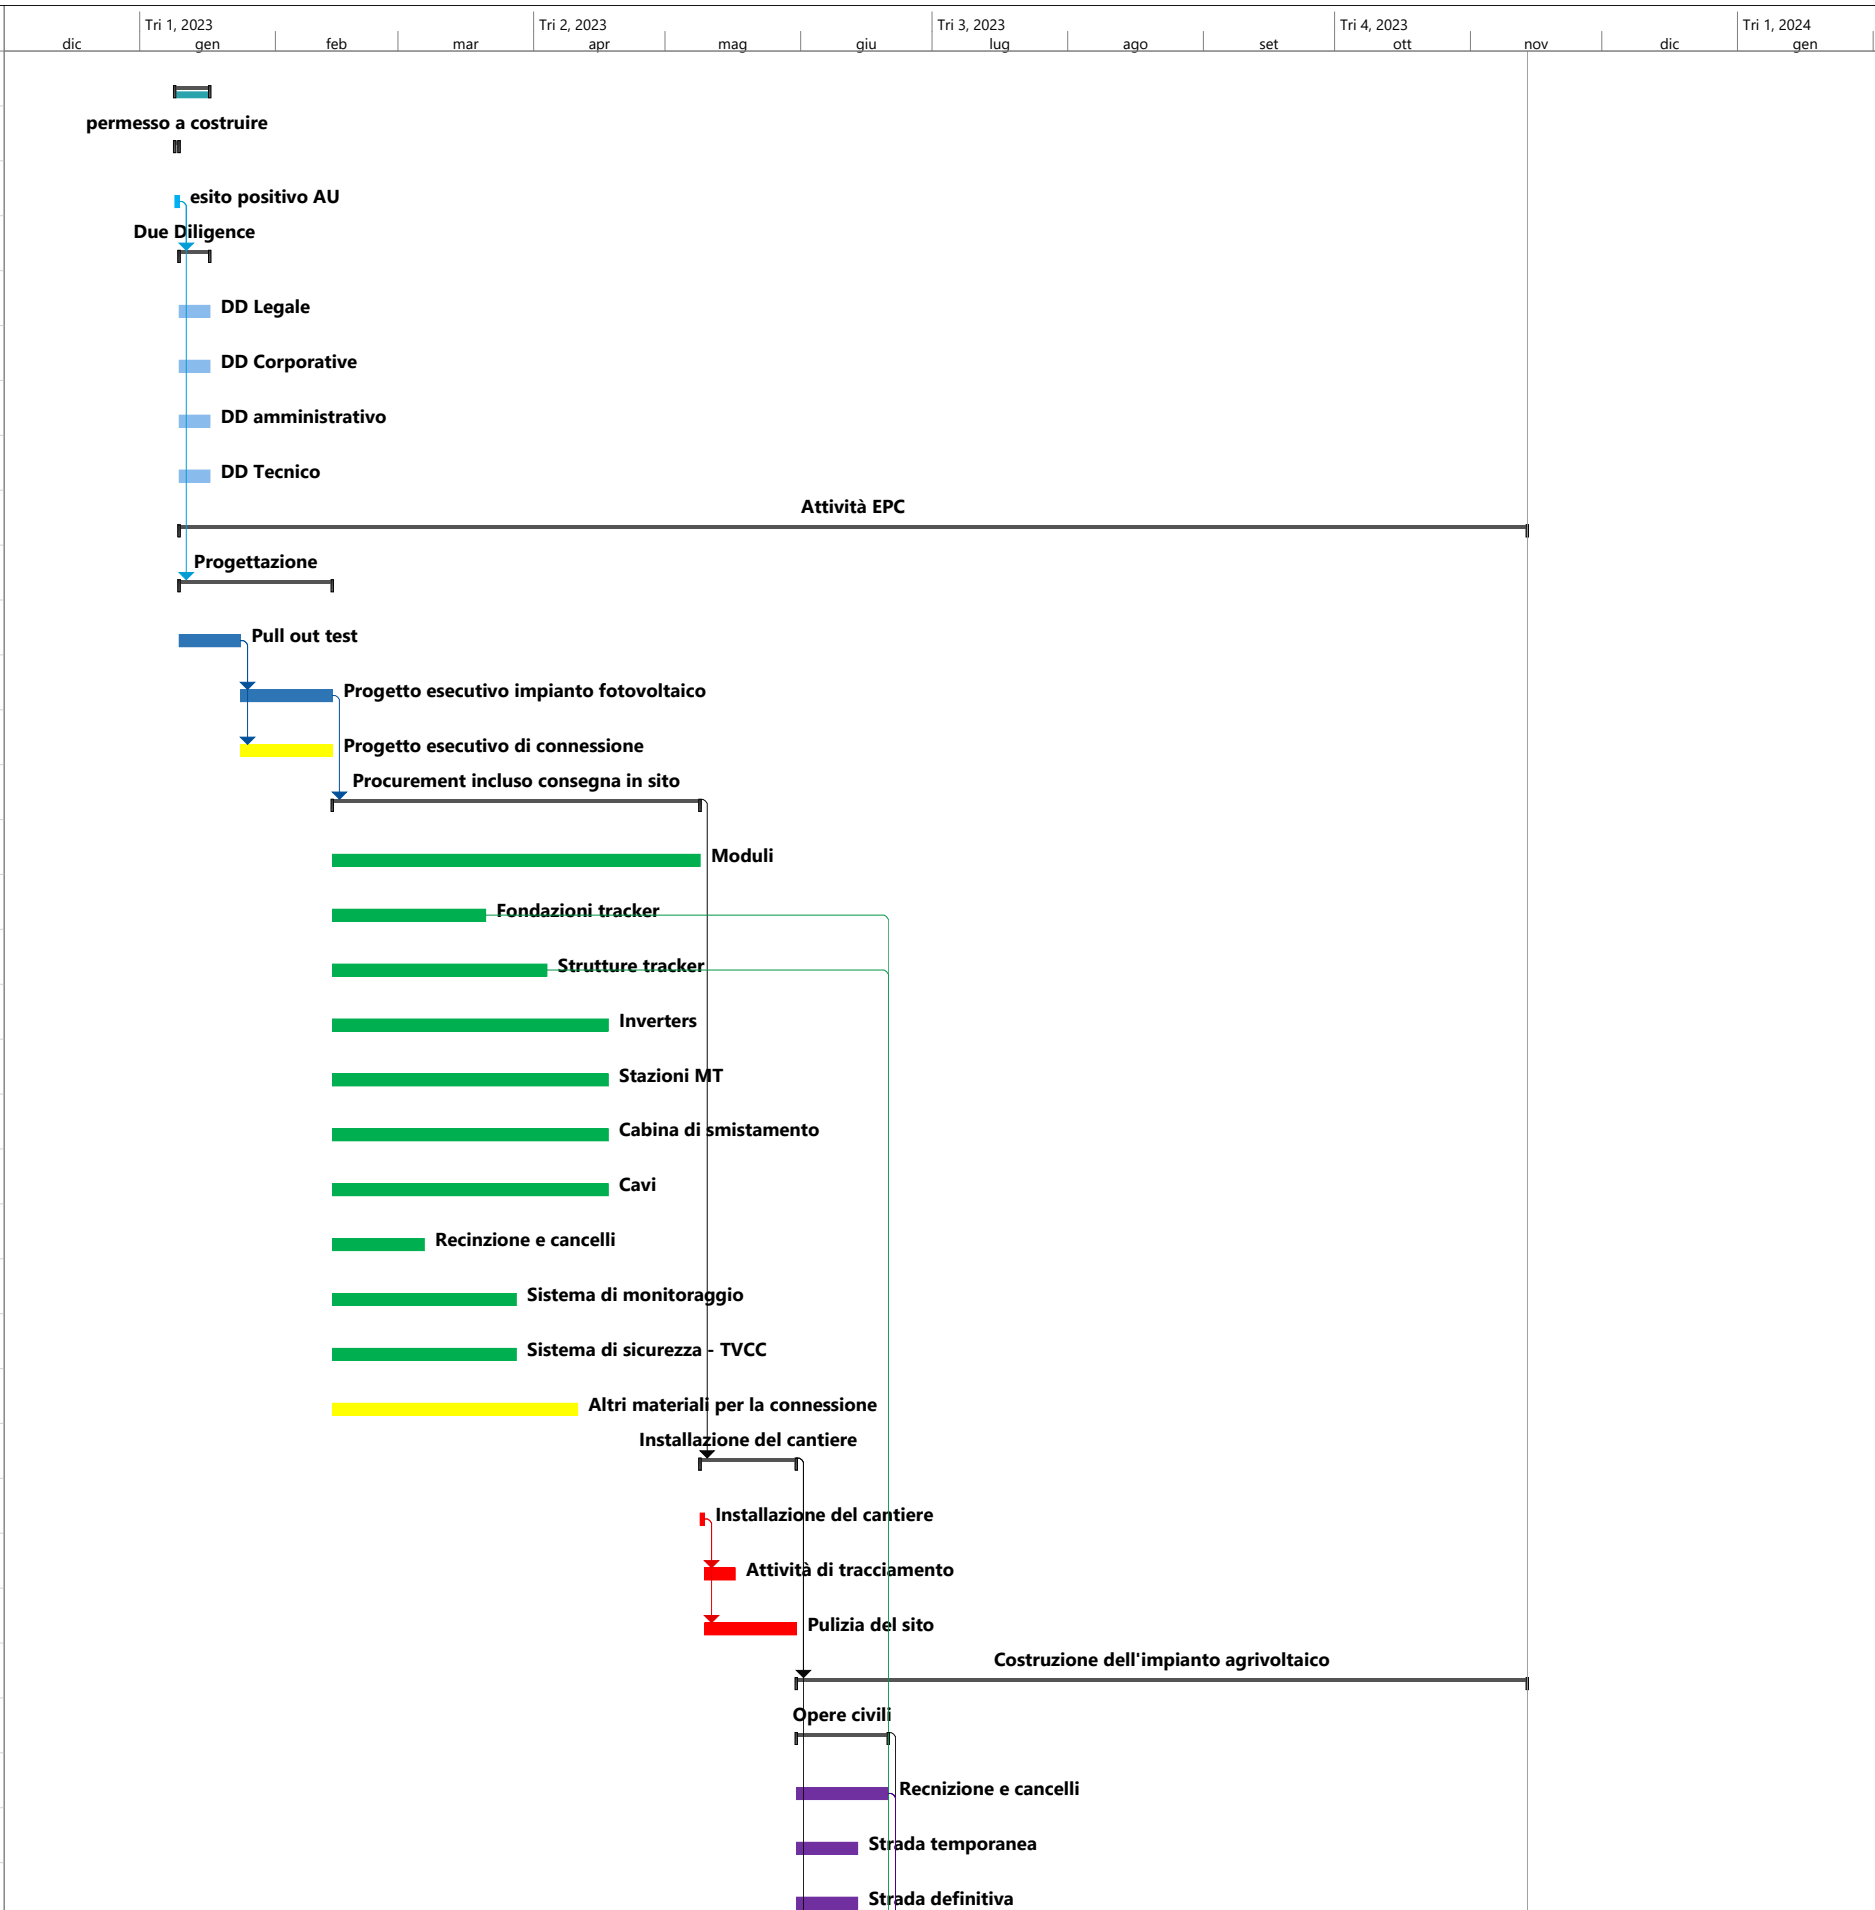

Progetto: Simple Project Plan
Data: ven 17/12/21

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo durata		Solo inizio		Cardine esterno		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo fine		Scadenza			
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento			

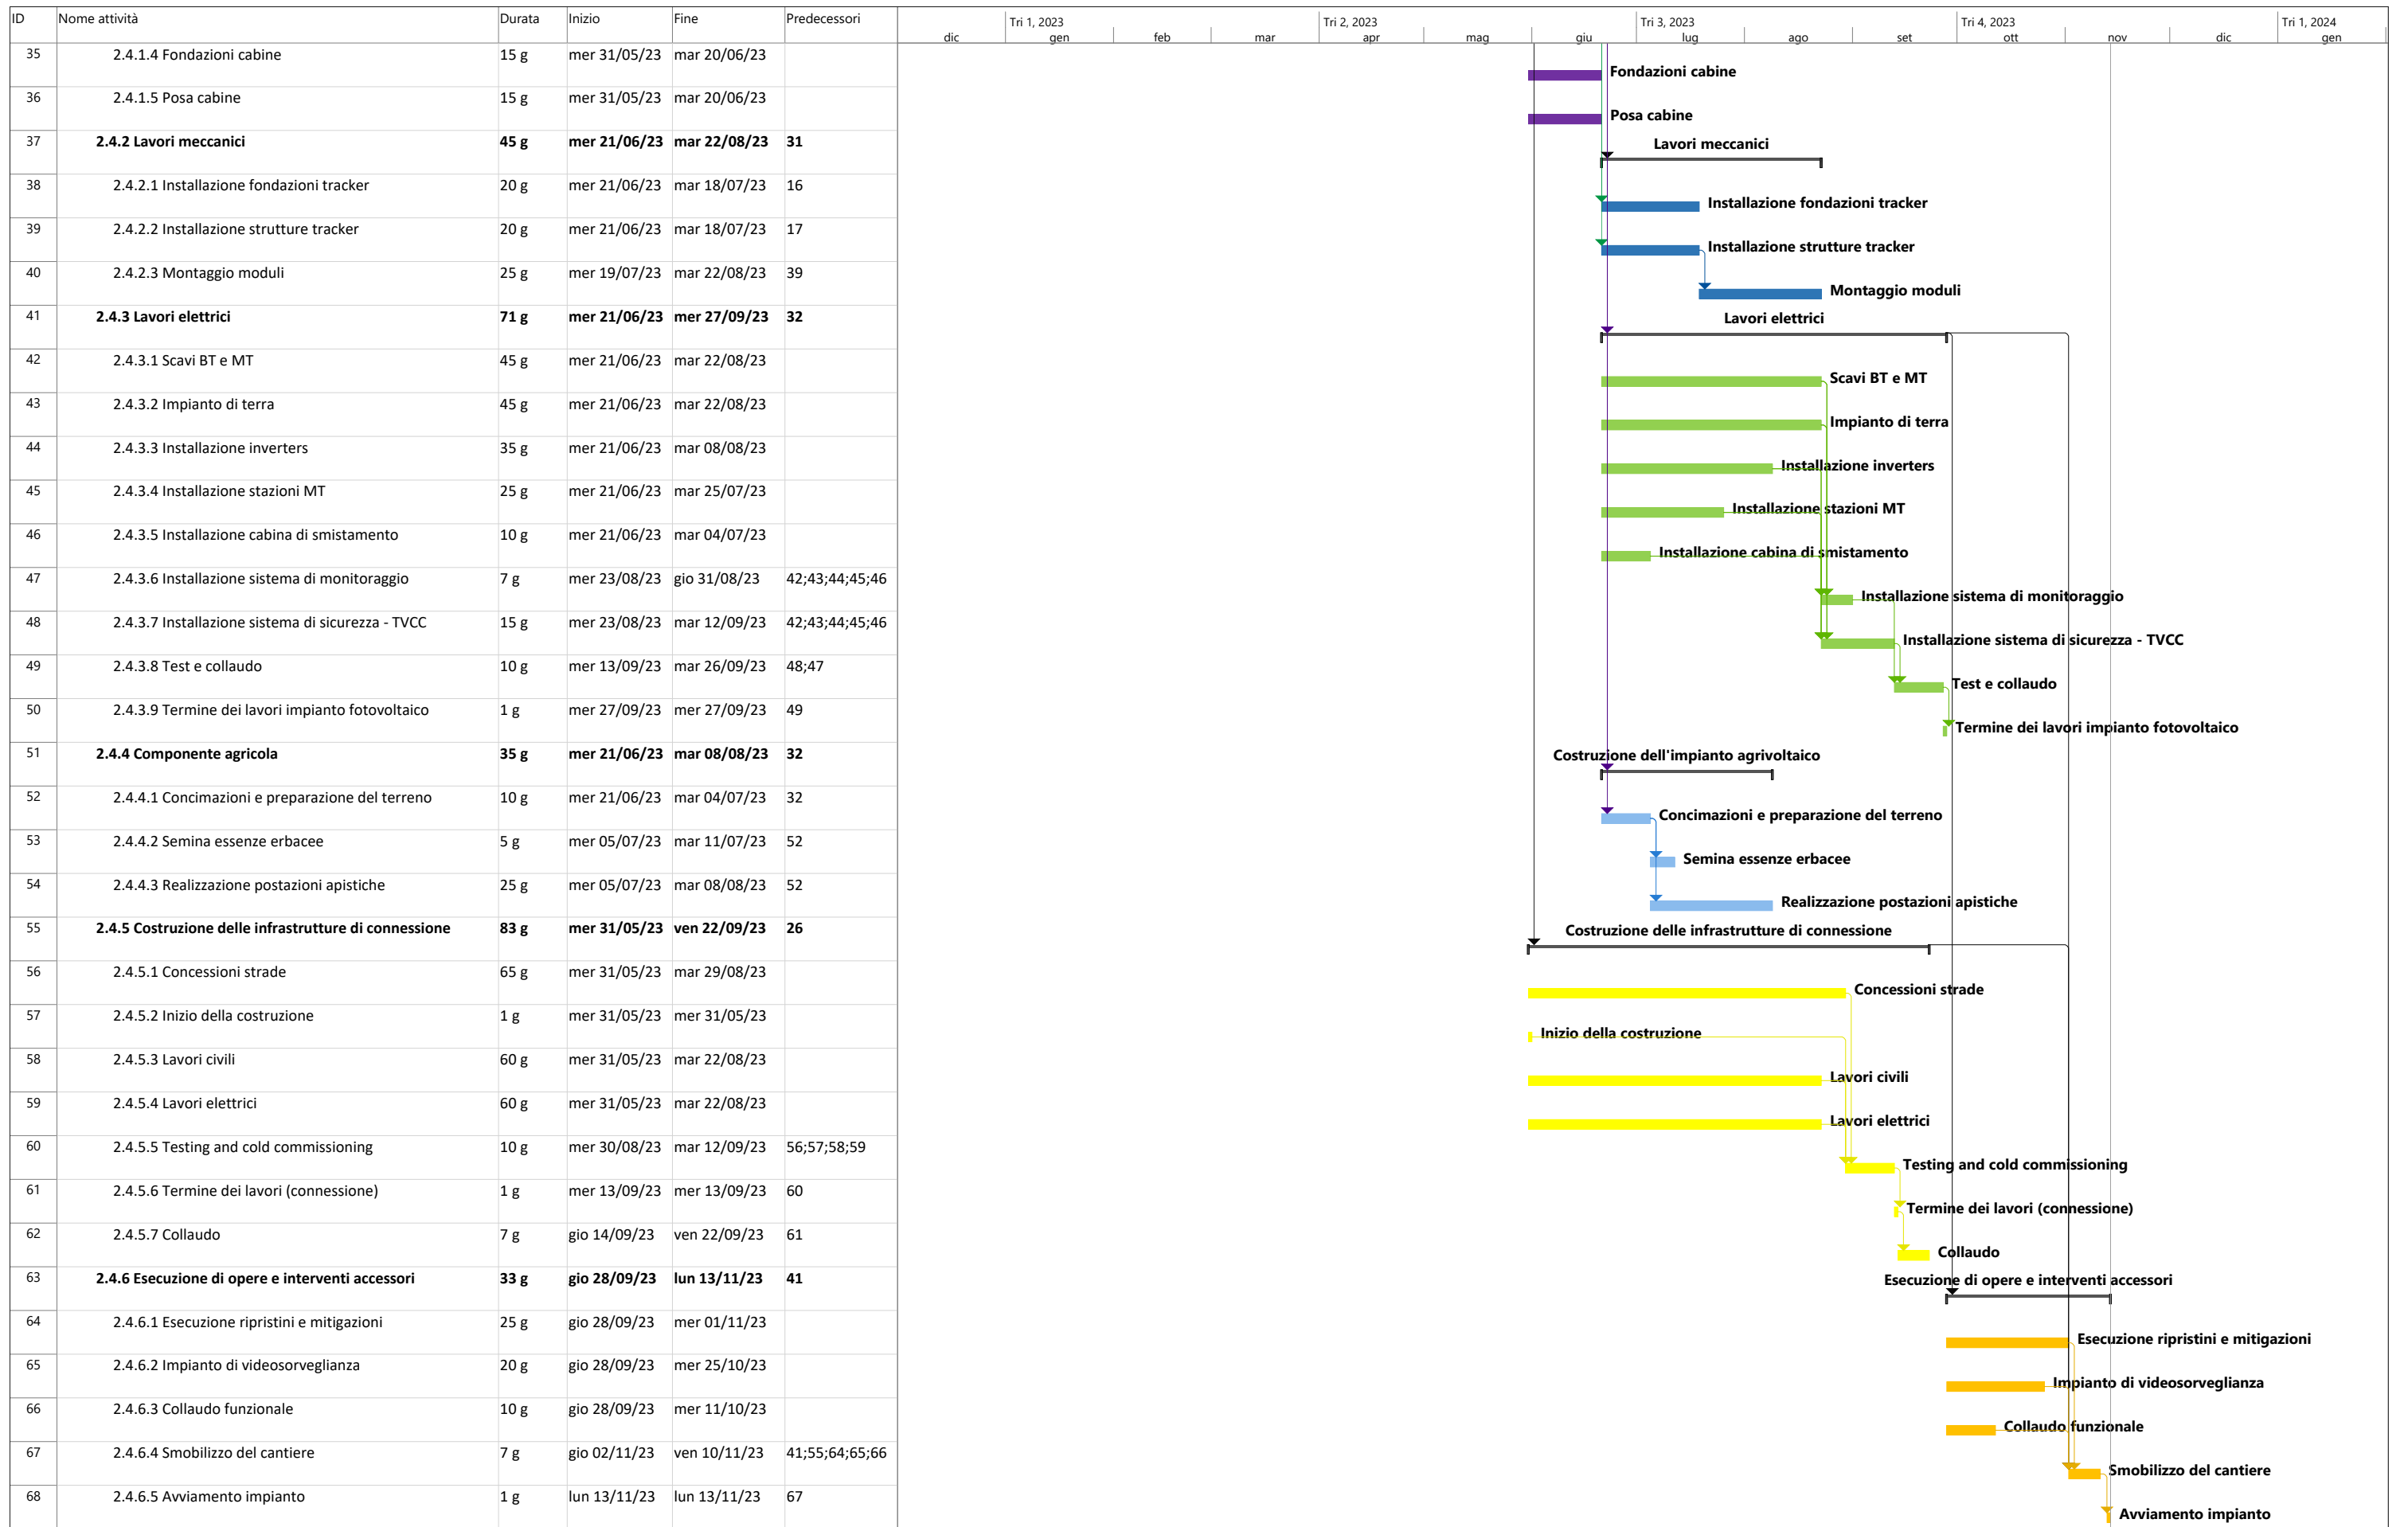

Progetto: Simple Project Plan
Data: ven 17/12/21

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo durata		Solo inizio		Cardine esterno		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo fine		Scadenza			
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento			
