

Prot. n.108 del 28/03/2023

Raccomandata a mezzo pec

Spett.le **Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Orientale**
Viale C. Colombo, 6
54033 – Marina di Carrara (MS)
protocollo@pec.adspmarligureorientale.it

c.a. Responsabile del Procedimento
Ing. Mirko Leonardi

c.a. Assistente del Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico Ciavarella
d.ciavarella@adspmarligureorientale.it

e p.c. Egr. **Direttore dei Lavori**
Ing. Antonino Sutera
c/o Dinamica Srl
pec@pec.dinamica-isc.com
a.sutera@dinamicasrl.eu

e p.c. Egr. **Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione**
Ing. Diego Nespolo
nespolo.diego@ingpec.eu
diego.spesrl@gmail.com

Oggetto: Affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori relativi all'ambito 4 progetto interfaccia porto città "Interventi per la fruibilità protetta della passeggiata sul mare in corrispondenza del molo di Ponente" - Marina di Carrara. - **CIG:8813677C56**
- **CUP: F81B21002560007**

Aggiornamento cronoprogramma

La scrivente impresa esecutrice dei lavori di cui in oggetto, preso atto del Decreto nr.5618 del 22.03.2023 di autorizzazione all'immersione in mare ex art.109, nonché facendo seguito alla nota prot. n. 1957 del 20.01.2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con la presente, invia in allegato l'aggiornamento del cronoprogramma delle lavorazioni, con particolare riguardo alle opere a mare, ai fini della completa ottemperanza alla condizione ambientale nr.4 della nota pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. nr.6773 del 18.01.2023 in esito al procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali.

L'occasione è gradita per porre distinti saluti.

R.C.M. Costruzioni s.r.l.


Administratore Unico

Elio Rainone

Allegati:

- ✓ *Cronoprogramma con rappresentazione delle opere marittime (Tav. A-PE-GEN).*



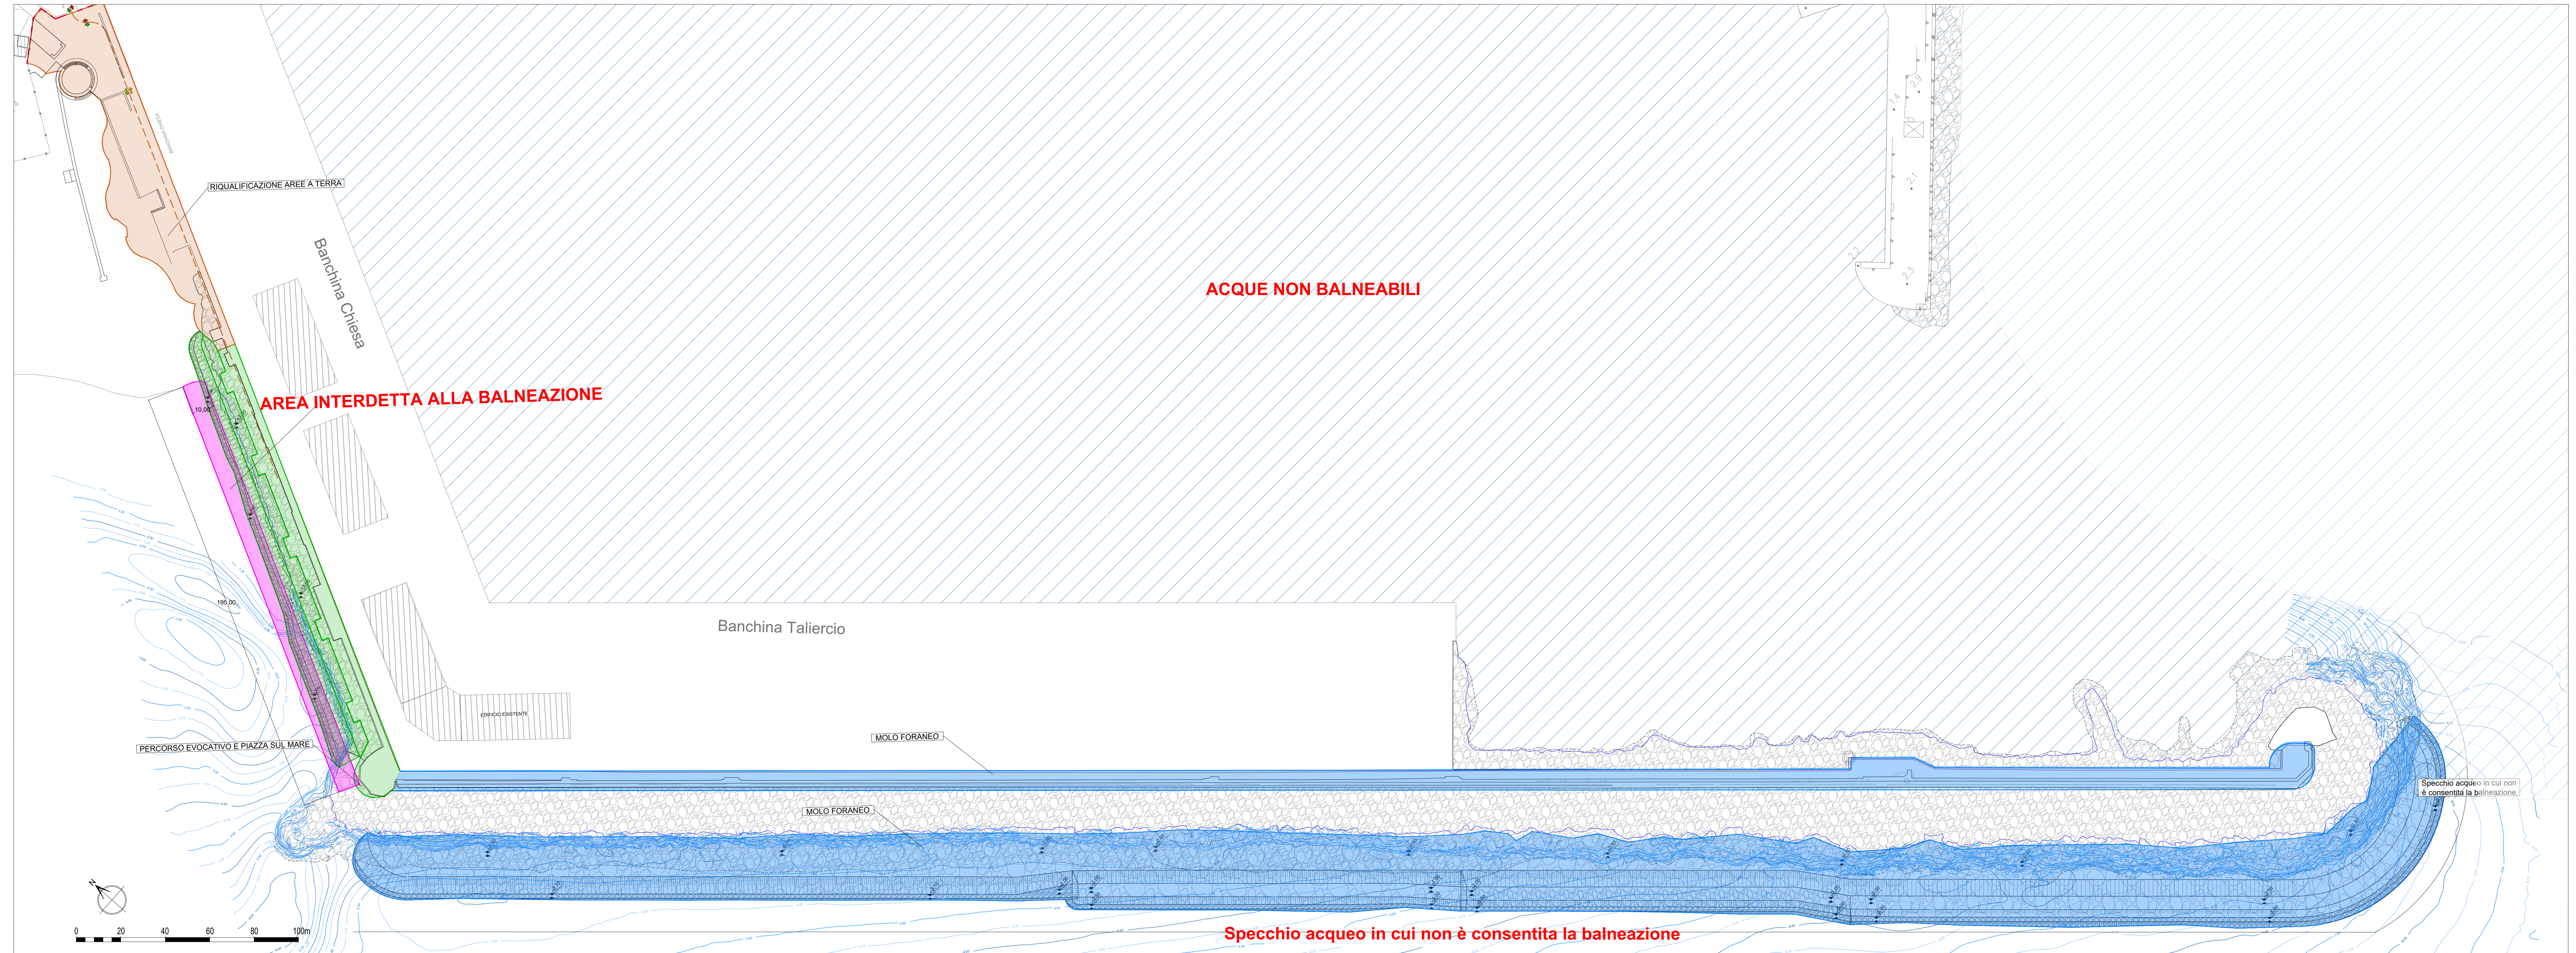

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AI SENSI DEL CSA

Inizio 4 Aprile 2023 Fine 25 Settembre 2024

Durata (mesi)	Giorni	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	GENNAIO 2024	FEBBRAIO 2024	MARZO 2024	APRILE 2024	MAGGIO 2024	GIUGNO 2024	LUGLIO 2024	AGOSTO 2024	SETTEMBRE 2024	
0) DURATA DEI LAVORI	540	[Gantt bar from April 2023 to September 2024]																		
1) ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	30	[Gantt bar in April 2023]																		
1.1 Allestimento cantiere, prequalifiche e approvvigionamenti	30	[Gantt bar in April 2023]																		
1.2 Smobilizzo cantiere e pulizia	30	[Gantt bar in April 2023]																		
2) ITINERARIO PANORAMICO PRESSO MOLO FORANEO	485	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.1 - OPERE MARITTIME		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.1.1 Salpamenti	40	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.1.2 Scogliera passeggiata su molo foraneo_singola berna	90	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.1.3 Scogliera passeggiata su molo foraneo_doppia berna	210	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.2 - STRUTTURE		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.2.1 Demolizioni	15	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.2.2 Strutture Molo Foraneo	120	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.2.3 Strutture piazza in testata	50	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.3 - FINITURE		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.3.1 Intonaci e pitture	10	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.3.2 Pavimentazioni	60	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.3.3 Ringhiere parapetti e muretti	30	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.4 - IMPIANTI TECNOLOGICI		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
2.4.1 Elettrico	30	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3) ITINERARIO EVOCATIVO E PIAZZA SUL MARE	360	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.1 - OPERE MARITTIME		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.1.1 Scogliera percorso evocativo	90	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.2 - STRUTTURE		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.2.1 Demolizioni	60	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.2.2 Strutture percorso evocativo	180	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.2.3 Strutture piazza sul mare	30	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.3 - FINITURE		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.3.1 Intonaci e pitture	10	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.3.2 Pavimentazioni	30	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.3.3 Ringhiere parapetti e muretti	15	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.4 - IMPIANTI TECNOLOGICI		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
3.4.1 Elettrico	15	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4) RIQUALIFICAZIONE AREE A TERRA	360	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.1 - STRUTTURE		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.1.1 Demolizioni	20	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.1.2 Strutture Area a terra	60	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.2 - FINITURE		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.2.1 Pavimentazioni	45	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.2.2 Arredo urbano	15	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.2.3 Verde	5	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.2.4 Riempimento dune	10	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.3 IMPIANTI TECNOLOGICI		[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.3.1 Elettrico	20	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		
4.3.2 Scavi	10	[Gantt bar from April 2023 to August 2024]																		

LEGENDA

- Stato di fatto
- Demolizione stato di fatto
- Limite intervento - Riqualificazione aree a terra
- Riqualificazione aree a terra
- Limite intervento - Percorso evocativo e Piazza sul mare
- Percorso evocativo e Piazza sul mare
- Limite intervento - Molo Foraneo
- Molo Foraneo
- Limite d'intervento lato terra
- + Viabilità di accesso al cantiere
- Limite area interdetta alla balneazione
- Area interdetta alla balneazione

N.B. I colori dei retini della planimetria coincidono con i colori delle fasi del cronoprogramma

**AMBITO 4 PROGETTO INTERFACCIA PORTO CITTÀ
INTERVENTI PER LA FRUIBILITÀ PROTETTA DELLA
PASSEGGIATA SUL MARE IN CORRISPONDENZA DEL
MOLO DI PONENTE**

PROGETTO CANTIERABILE

Responsabile del Procedimento:
Ing. Mirko Leonardi

Impresa Affidataria:



Progettista Indicatore: R.T.P.

Membro:   

Responsabile delle Integrazioni Specialistiche:
Ing. Guglielmo Migliorino

Progettazione Specialistica:
Ing. Guglielmo Migliorino

TITOLO ELABORATO


GEN - ELABORATI GENERALI
SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

Cronoprogramma con rappresentazione delle opere marittime

CONSEGNA	APPALTO	FASE	OPERA	DISC.	TPOLOGIA	PROGR.	REV.	SCALA
2	1	2	M	S	A	P	E	GEN
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0							0	VARIE

0 MARZO 2023 Prima Emissione C.P. M.M. G.M.
Rev. Data Descrizione Esiguita Controllata Approvata

Buongiorno,
In riferimento all'oggetto, inviamo nota con relativo allegato.
Cordiali Saluti



R.C.M. COSTRUZIONI S.r.l.

Via Pioppazze 81 - 84087 - SARNO (SA) | Italy | T: +39 0815137104
L.mare Trieste 104 - 84121 - SALERNO | Italy | T: +39 089229682
Via G.Antonio Zani, 11 - 48122 - RAVENNA| Italy | T: +39 0544430282
Via Opisso, 6 - 16155 - GENOVA| Italy | T: +39 010 3751437

www.rcmcostruzioni.it

Avvertenze ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016 e Testo Unico sulla Privacy D.Lgs.196/03 nella revisione aggiornata dal D.Lgs. 101/18

Questa comunicazione deve intendersi riservata esclusivamente ai destinatari sopra indicati e può contenere informazioni personali e confidenziali o privilegiate tutelate dalla vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali; è vietata qualsiasi distribuzione, copia, pubblicazione od uso di queste informazioni. Coloro che la dovessero ricevere per errore sono pregati di distruggerla e di avvisare tempestivamente il mittente dell'errato ricevimento, rispondendo a questa mail e specificando come oggetto del messaggio "errato ricevimento". Gli indirizzi e-mail del ns. archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o che risultano pubblicati. In ottemperanza al GDPR 679/2016 ed al Testo Unico sulla Privacy D.Lgs.196/03, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati in ns. possesso. Nel caso le ns. comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ogni ulteriore disturbo, semplicemente rispondendo a questa e-mail e specificando l'indirizzo da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancella". R.C.M. Costruzioni S.r.l. ha fatto i possibili controlli per assicurarsi che questo messaggio ed eventuali allegati siano privi di Virus. Si consiglia di trattare lo stesso, applicando corrette procedure per assicurarsi che ne sia privo al suo utilizzo.

This communication must be considered as reserved exclusively for the recipients indicated above and may contain personal and confidential or privileged information protected by current legislation on privacy and protection of personal data; any distribution, copying, publication or use of this information is prohibited. Those who receive it by mistake, are asked to destroy it and to promptly notify the sender of the incorrect receipt, by replying to this e-mail and specifying as the subject of the "incorrect receipt" message. The e-mail addresses of our archive, come from personal contacts or lists and services in the public domain or published. In compliance with GDPR 679/2016 and the Consolidated Privacy Law D.Lgs.196 / 03, at any time it is possible to modify or delete the data in ns. possession. In the case our communications that are not of interest to you, it will be possible to avoid any further inconvenience, by simply replying to this e-mail and specifying the address to be removed and as the subject of the "Cancel" message. R.C.M. Costruzioni S.r.l. has made the possible checks to make sure that this message and any attachments are free of viruses. It is advisable to treat the same, applying correct procedures to ensure that it is free of its use.
