

FASE 8

LEGENDA

- AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO
- AREA TECNICA OPERATIVA - ATO
AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP
- DEMOLIZIONE
- WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE
- WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI
- VIABILITA' IN ESERCIZIO
- VIABILITA' INTERROTTA
- VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
- PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO (L= 6 m)
- PISTE DI CANTIERE (L= 4 m)
- RECINZIONE TEEM
- RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2.00 m)
- RETE METALLICA DI RECINZIONE
- VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
- AUTOGRU

LAVORAZIONI

- FASE 8
- Demolizione deviazione provvisoria della rampa Ad5 - A4 dir. Milano
 - Fondazioni ed elevazioni MU17
 - Corpo stradale RA07 e RA08 nel tratto affiancato fino al CV10
 - Demolizione rampa A4 dir. Milano -A58 preesistente


AREE DI CANTIERE

L'area di cantiere è ubicata nei quadranti a nord-ovest ed a sud-ovest dell'attuale svincolo A58-A4. L'accesso alla ATP03 avverrà mediante pista di cantiere provvisoria con passaggio sul CV10 (previo collaudo statico) per accesso all'area interclusa tra le rampe autostradali in esercizio.

Per l'accesso al quadrante nord-ovest si utilizza varco V15 su Via Damiano Chiesa con la relativa pista di cantiere verso sud, per l'accesso al quadrante sud-ovest si dovrà utilizzare il varco provvisorio ubicato in corrispondenza della corsia di marcia in destra della RA09 realizzato in fase 3

VIABILITÀ PUBBLICA

- Rete autostradale:
Rampa Ad5 - A4 dir. Milano: disattivazione della deviazione provvisoria e contestuale messa in esercizio della nuova RA14 realizzata nelle fasi precedenti.
- Rete urbana:
La viabilità urbana durante la fase in esame non subirà soggezioni al traffico.

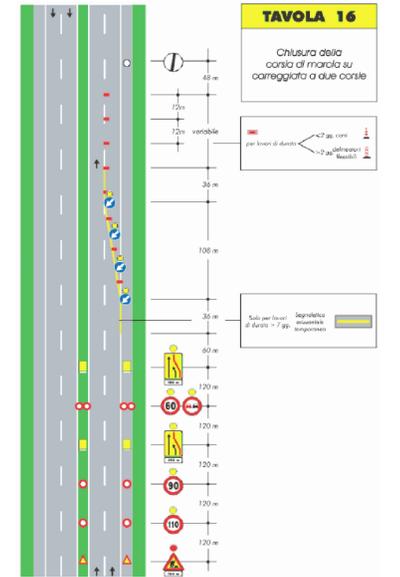

CONCESSIONE AUTOSTRADALE
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
 (OPERA CUI 778/2007)
PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA D
FASI DI LAVORO SVINCOLO A58 - A4
PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: FASE 8

IDENTIFICAZIONE ELABORATO				PROGETTAZIONE			
FASE PROGETTUALE	ANNO	TITOLARI	STATO	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	VERIFICA E VALIDAZIONE
TRATTA				03/09/2023	Emilia	Autosole	Autosole
CANTIERE						Autosole	Autosole
OPERA						Autosole	Autosole
PROGETTO						Autosole	Autosole
PROVA						Autosole	Autosole
PROVA						Autosole	Autosole
PROVA						Autosole	Autosole
