

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



Progetto Definitivo

Parco Eolico Abruzzo

Titolo elaborato:

Cronoprogramma

REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	
PDF	PDF	GD	EMMISSIONE	07/12/23	0	0

PROPONENTE



SVILUPPO PRIME SRL

Via A. De Gasperi n. 8
74023 Grottaglie (TA)

CONSULENZA



GECODOR SRL

Via A. De Gasperi n. 8
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA

Ing. Gaetano D'Oronzio

Codice
ABEG005

Formato A4

Scala

Foglio 1 di 4

INDICE	2
1 PREMESSA	3
2 CRONOPROGRAMMA	4

1 PREMESSA

La **Sviluppo Prime s.r.l.** è una società costituita per realizzare un impianto eolico in Abruzzo, denominato “**Parco Eolico Abruzzo**”, nel territorio dei Comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tufillo e Furci (Provincia di Chieti), di potenza totale pari a 66 MW e con punto di connessione in corrispondenza della stazione elettrica RTN Terna 380/150/36 kV di futura realizzazione nel Comune di Fresagrandinaria.

A tale scopo, la GE.CO.D'OR s.r.l., società italiana impegnata nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare focus nel settore dell'eolico e proprietaria della suddetta Sviluppo Prime s.r.l., si è occupata della progettazione definitiva per la richiesta di Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione e l'esercizio del suddetto impianto eolico e della relativa Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

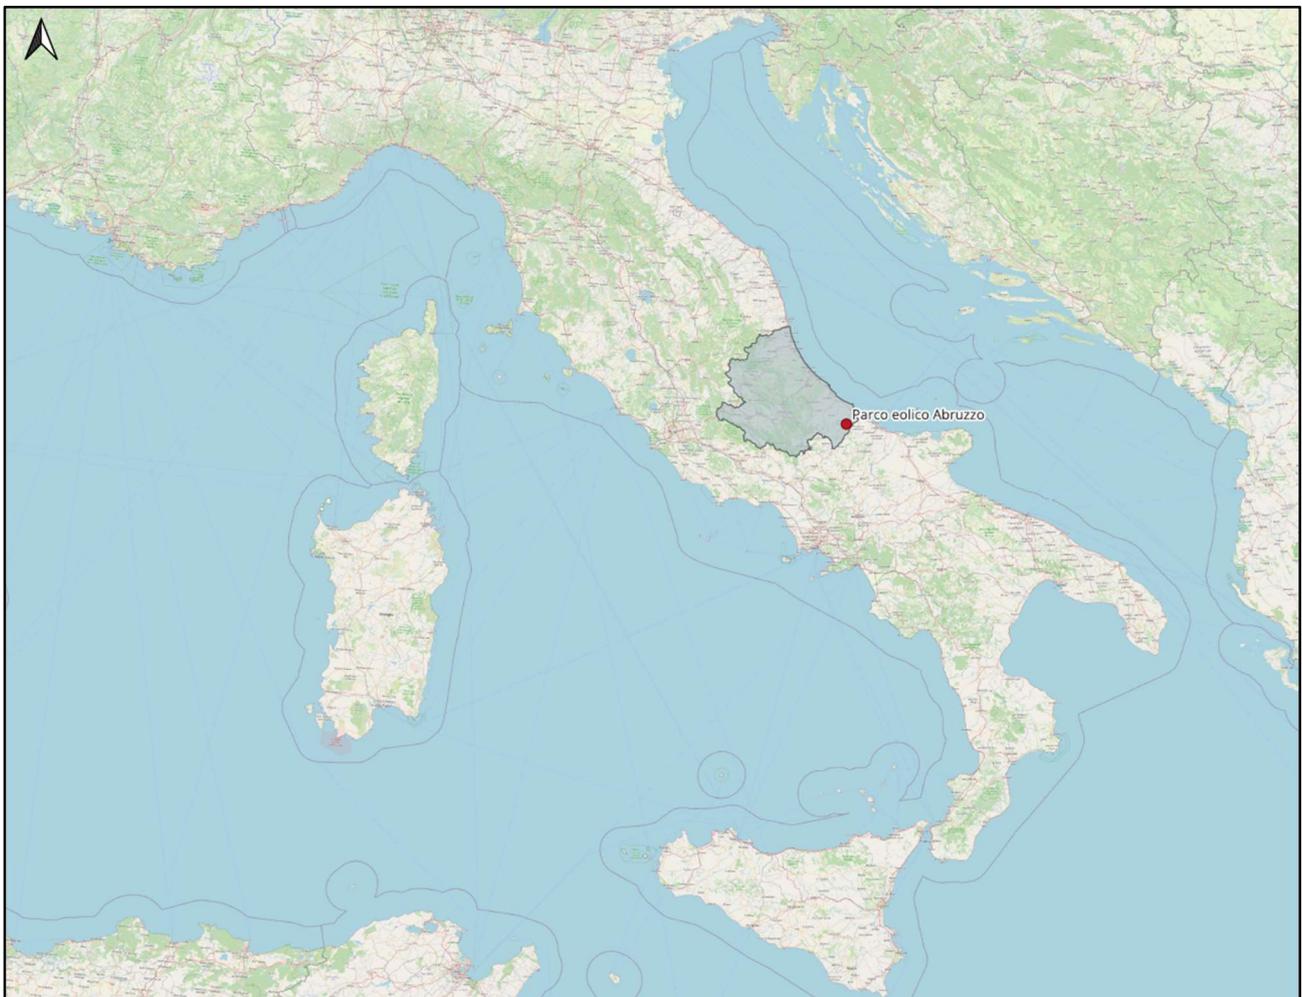


Figura 1.1: Localizzazione Parco Eolico Abruzzo

Il presente documento riporta il Cronoprogramma di sintesi per la realizzazione del progetto.

2 CRONOPROGRAMMA

Parco Eolico Abruzzo														
Cronoprogramma (mesi)														
Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Allestimento Cantiere														
Realizzazione viabilità di cantiere														
Realizzazione piazzole di montaggio														
Realizzazione fondazioni aerogeneratori														
Completamento viabilità e piazzole di montaggio														
Realizzazione Sottostazione di trasformazione SEU														
Realizzazione RTN Terna 380/150/36 kV														
Realizzazione linee di distribuzione Media Tensione														
Realizzazione linea di collegamento AT														
Montaggio Aerogeneratori														
Energizzazione Sottostazione e impianto eolico														
Commissioning aerogeneratori														
Entrate in esercizio impianto eolico														
Ripristino opere civile e definizione piazzole definitive														
Chiusura cantiere														

Tabella 2.1: Cronoprogramma Parco Eolico Abruzzo
