
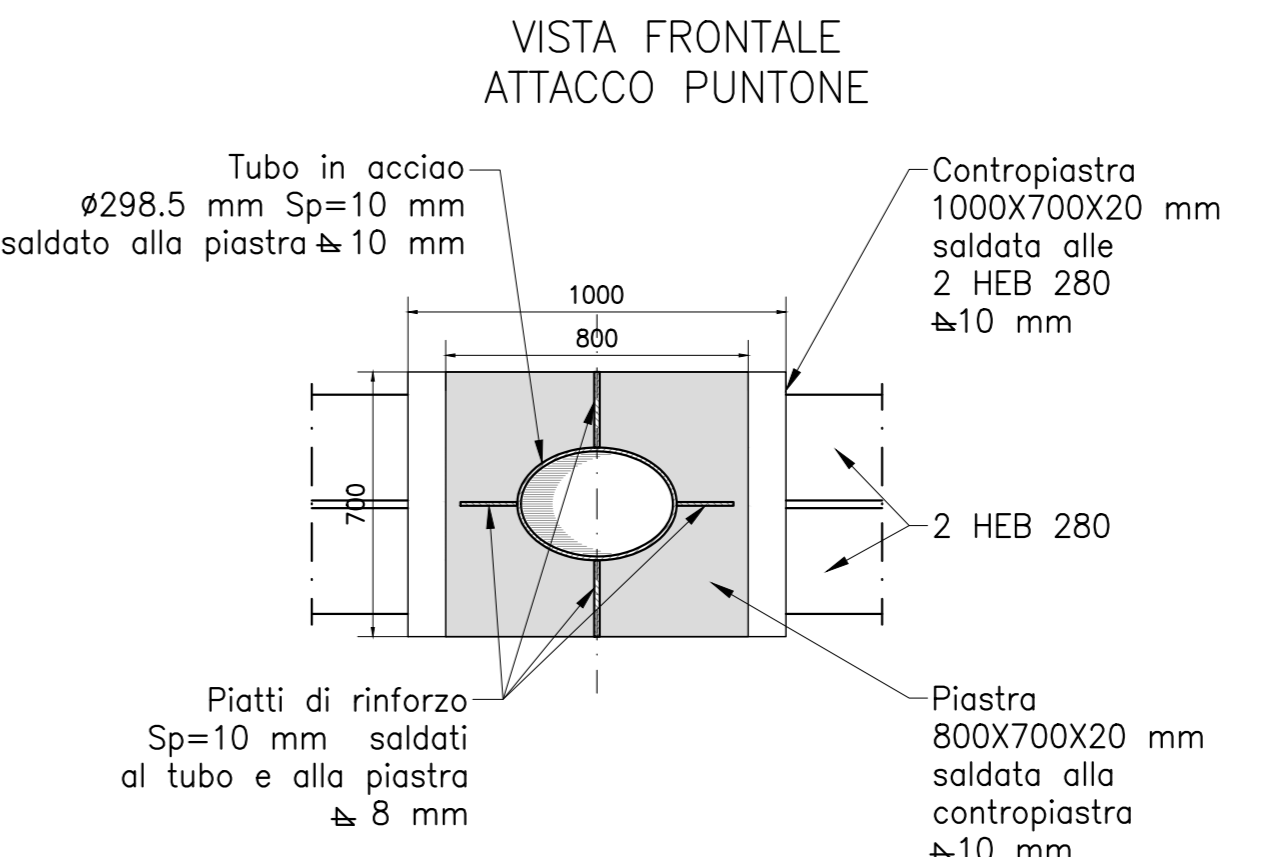
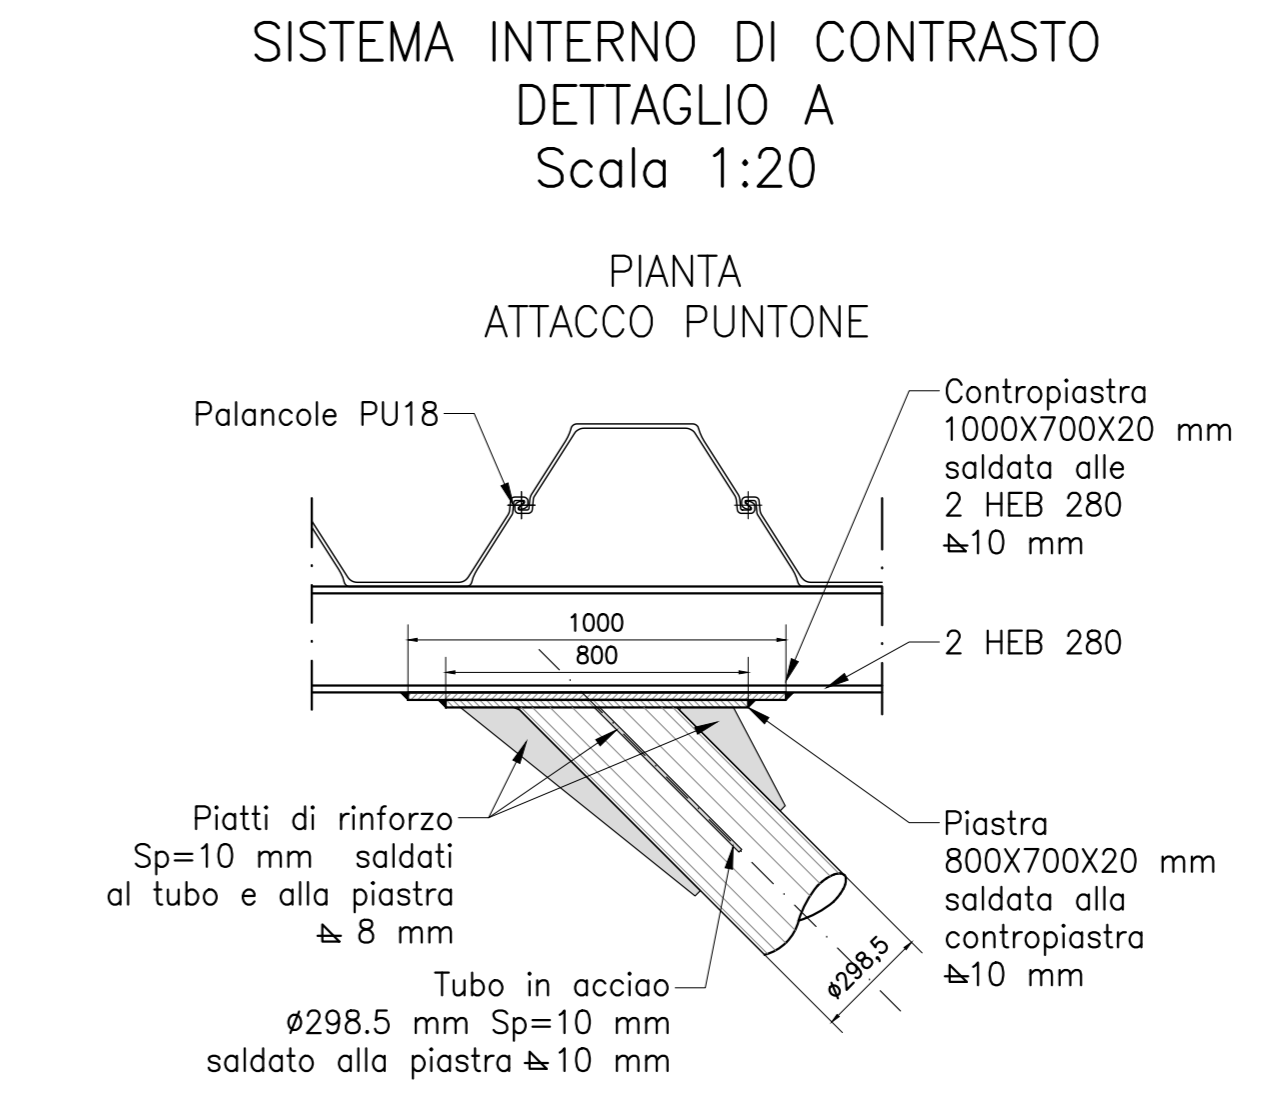



NOTA: il sistema interno di contrasto potrà essere rimosso dopo la realizzazione del pinto di fondazione

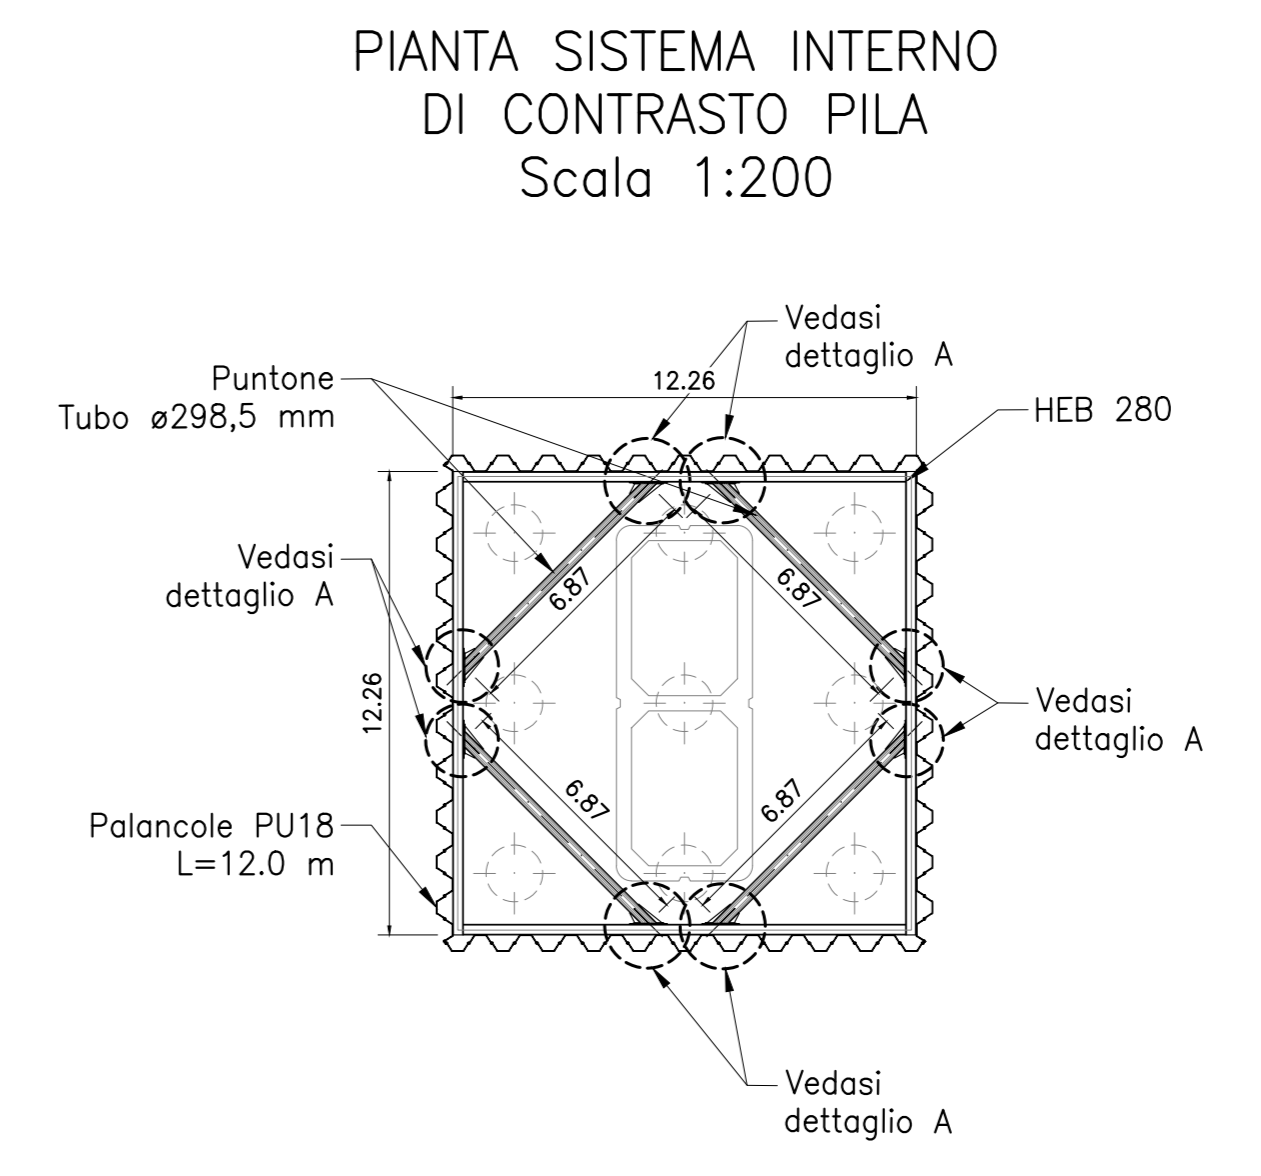

NOTE PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI

- Preliminarmente all'esecuzione degli scavi si dovranno effettuare i traccamenti sul sito, controllando la rispondenza alle ipotesi progettuali. Le eventuali difformità dovranno essere sottoposte ai progettisti per opportuna risoluzione.
- Preliminarmente, si controlleranno i livelli della falda dai piezometri predisposti esternamente agli scavi, per verifica della rispondenza alle ipotesi progettuali. Si avrà cura di evitare di effettuare scavi nei periodi nei quali il livello freatico è prossimo ai massimi delle oscillazioni stagionali o superiore alle previsioni progettuali (+45.50 m sim) o dopo periodi particolarmente piovosi.
- Ove la quota della falda si confermasse superiore al fondo scavo previsto l'esecutore degli scavi dovrà provvedere l'apportamento di tutti i mezzi necessari per il dewatering. Le datazioni dovranno essere dimensionate con prudenza per tener conto delle incertezze previsionali sulla variabilità dei livelli freatici e sulle eterogeneità delle caratteristiche di permeabilità dei terreni più superficiali.
- Se previsti, o ritenuti utili, i pozzi di emungimento saranno predisposti e verificato il funzionamento e l'efficacia. L'eventuale aggettamento sarà attivato con le modalità da verificare in corso d'opera in relazione all'effettivo livello idrico rilevato, alla stratigrafia locale, alle caratteristiche di portata dell'acquifero ed alla risposta del sistema.
- Qualora con scavi prossimi al completamento, si rilevasse una imprevedibile condizione di livello piezometrico tendente a superare le previsioni progettuali, si dovrà abbandonare lo scavo e interrompere il dewatering e lasciare allagare.

- #### FASI ESECUTIVE
1. Preparazione piano di lavoro;
 2. realizzazione pozzi di aggettamento;
 3. infissione delle palancole;
 4. realizzazione pali di fondazione con tratto a vuoto variabile;
 5. installazione del sistema di contrasto interno;
 6. scavo fino al piano di imposta fondazione e scapitozzatura pali;
 7. realizzazione fondazioni ed elevazioni pile e spalle;
 8. reinterro fino al p.c. e sistemazione finale.

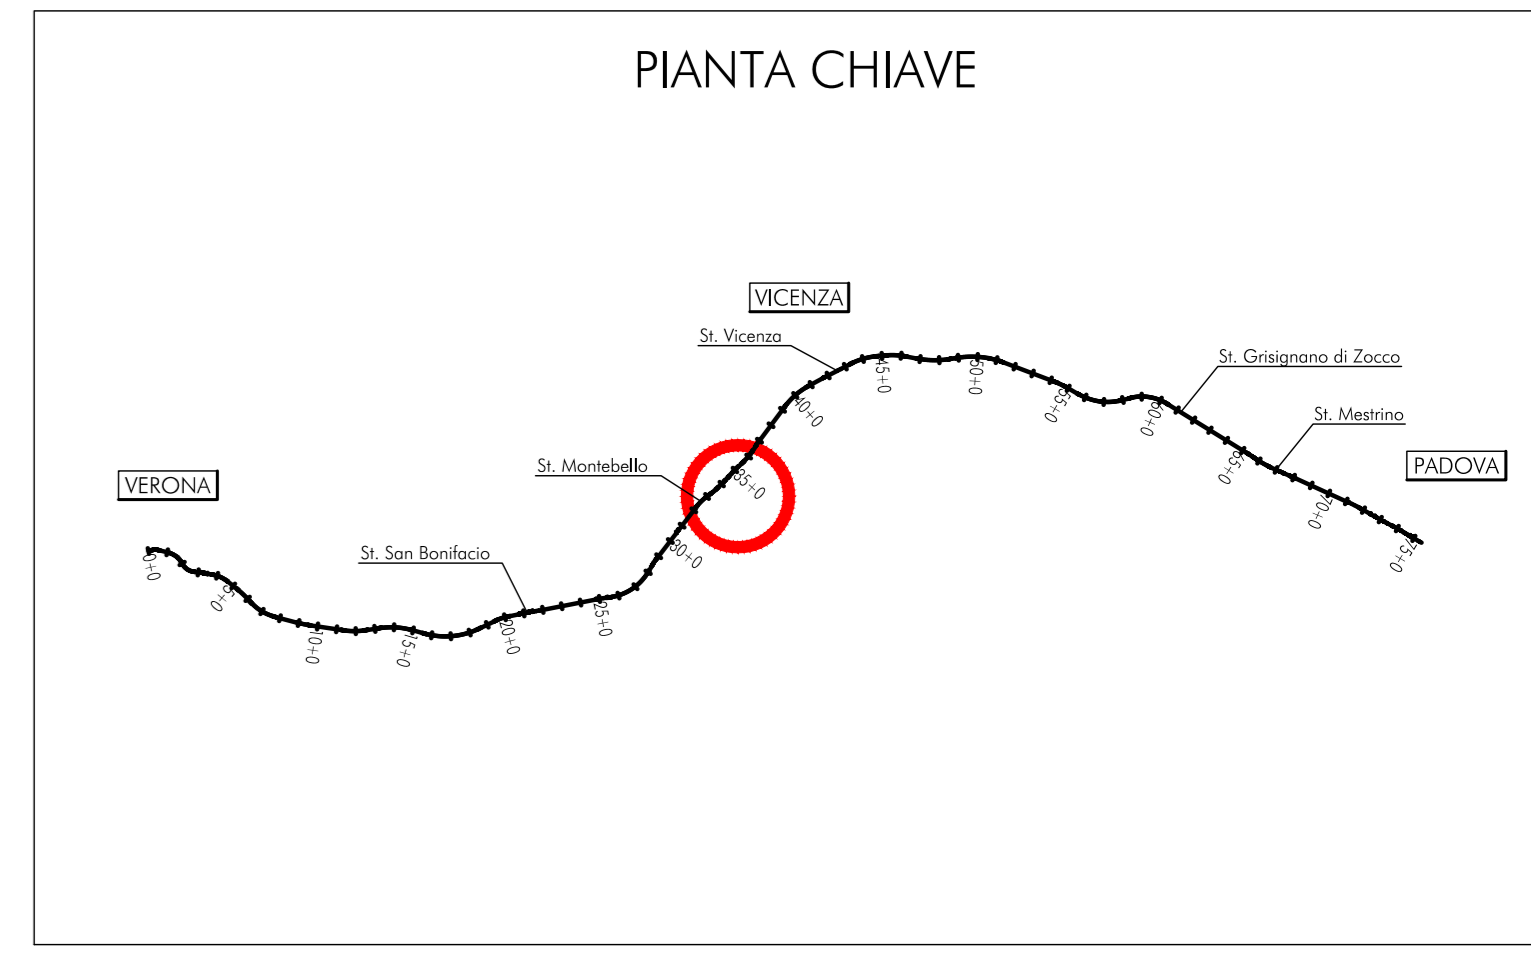

NOTE GENERALI

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
PER LE MACRO FASI DI COSTRUZIONE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI DI PE (WBS SF16)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATE IN QUESTO ELABORATO, VEDASI: IN1710E2ITV0000001 - TABELLA MATERIALI E PRESCRIZIONI

GENERAL CONTRACTOR:
ITICAV2

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
VIADOTTI E PONTI
AV - Viadotto Rio Guà dal km 33+722,75 al km 34+047,75
SCAVI, DEMOLIZIONI, OPERE PROVVISORIALI

Pianta opere provvisoriale e di scavo delle fondazioni, sezione longitudinale e tabella movimenti terra 2 di 2

COMMITTENTE:				DIRETTORE LAVORI		SCALA:	
ALTA SORVEGLIANZA:				Iricav Due		1:200	
GENERAL CONTRACTOR:				Firma		FOGLIO	
PRINCIPALE INTERVENITORE		CONTRATTORE		DATA		REV.	
IRFI		Iricav Due		02/04/2022		01	
PROGETTO		VERIFICA		APPROVAZIONE		DATA	
IN17		E12		V109A1		02/04/2022	
COMMESSA		LOTTO		FASE		ENTRATA IN SERVIZIO	
IN17		12		E		12	
PROGETTO		VERIFICA		APPROVAZIONE		DATA	
IN17		E12		V109A1		02/04/2022	
PROGETTO		VERIFICA		APPROVAZIONE		DATA	
IN17		E12		V109A1		02/04/2022	

PROGETTO: **INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**
PROGETTO: **INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**
PROGETTO: **INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

COI: 8377937001 CUP: A11E19100000009 FILE: IN1712E2P7CS000007.dwg
Progetto cofinanziato dalla Unione Europea Cod. originato: caos

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA
