Firmato digitalmente da:
MARTONE CARMEN
Firmato il 2023/12/21 12:05
Seriale Certificato: 637472
Valido dal 28/07/2021 al 28/07/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

NARDONE RAFFAELE
2023.12.21 12:40:30
CN=NARDONE RAFFAELE
C=IT
2.5.4.4=NARDONE
2.5.4.42=RAFFAELE
RSA/2048 bits

REGIONE SICILIA | PROVINCIA DI PALERMO | COMUNE DI SCLAFANI BAGNI | COMUNE DI VALLEDOLMO | COMUNE DI CALTAVUTURO | COMUNE DI POLIZZI GENEROSA | COMUNE DI CASTELLANA SICULA | COMUNE DI VILLALBA

OGGETTO:

Progetto di realizzazione di un parco eolico della potenza di 85,8 MW denominato "CATERINA I" situato nei comuni di Sclafani Bagni, Valledolmo, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Castellana Sicula in provincia di Palermo(PA) e Villalba, in provincia di Caltanissetta (CL).

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

PROPONENTE:

AEI WIND PROJECT X S.R.L.
P.I. 17264891007
Via Savoia 78,
00198 Roma

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 17264891007
Numero REA RM: 1707098
Domicilio digitale/PEC: aeiwindprojectx@legalmail.it

PROGETTAZIONE:

Ing. Carmen Martone
Iscr. n.1872
Ordine Ingegneri Potenza
C.F MRTCMN73D56H703E

EGM PROJECT S.R.L.

Geol. Raffaele Nardone
Iscr. n. 243
Ordine Geologi Basilicata
C.F NRDRFL71H04A509H

EGM PROJECT S.R.L.
VIA VERRASTRO 15/A
85100- POTENZA (PZ)
P.IVA 02094310766
REA PZ-206983

Livello prog.	Cat. opera	N°. prog.elaborato	Tipo elaborato	N°foglio/Tot. fogli	Nome file	Scala
PD	I.IE	22	D		_CRONOPROGRAMMA	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	DICEMBRE 2023	EMISSIONE		Ing. Carmen Martone EGM Project	Ing. Carmen Martone EGM Project

Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	8 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g
Impianti di servizio del cantiere	9 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g
Impianto eolico a terra	86 g
Scavi e rinterri	23 g
Scavo a sezione obbligata	13 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	10 g
Fondazione per eolico a terra	29 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	9 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	10 g
Installazione eolico	36 g
Montaggio componenti di impianto eolico	14 g
Installazione di impianto eolico	22 g
Smobilizzo del cantiere	9 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

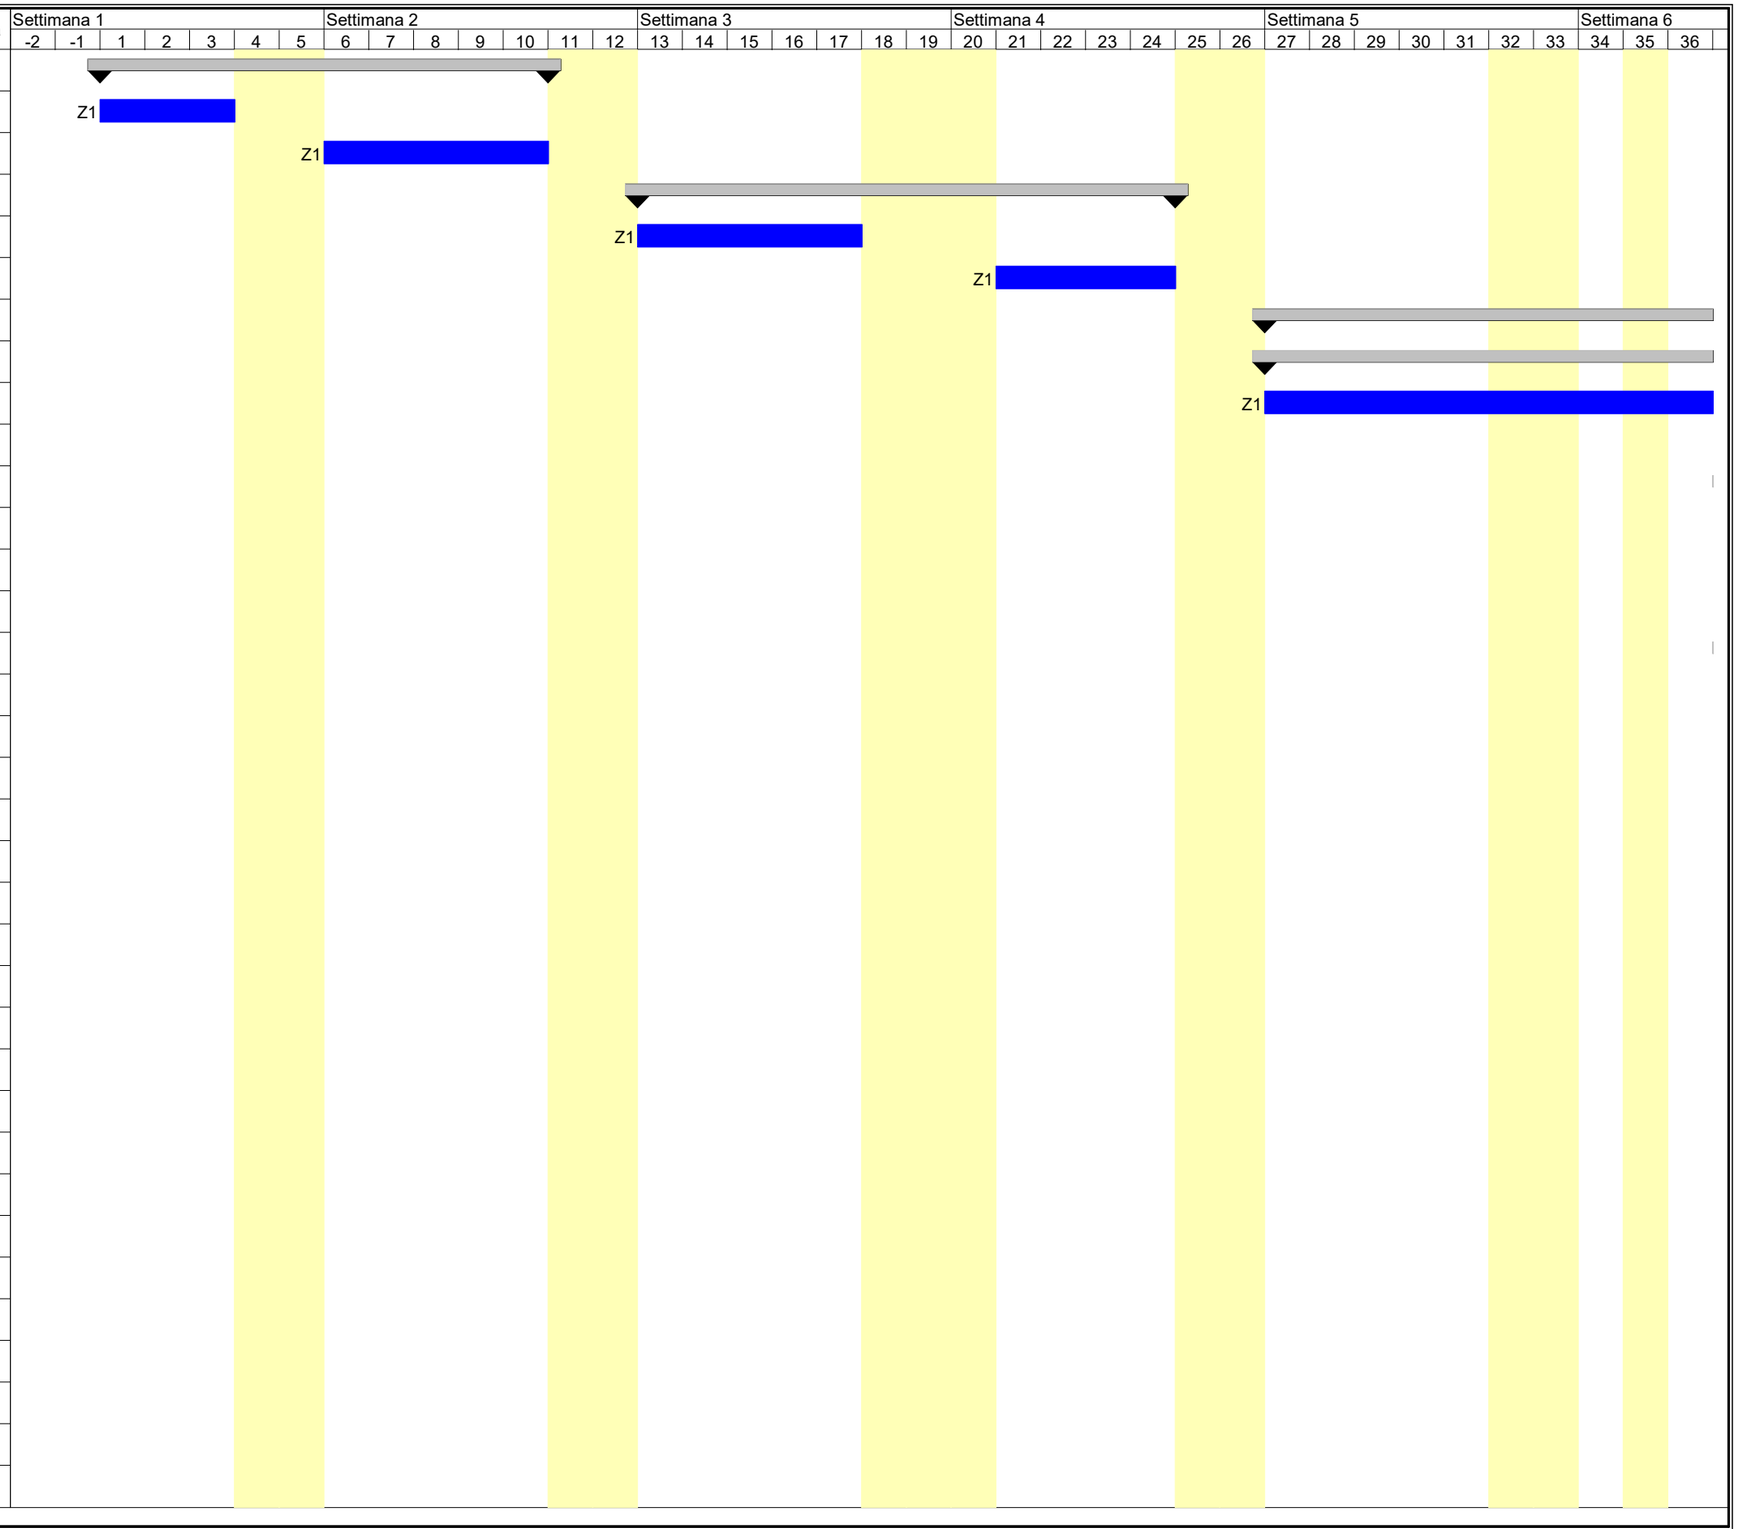

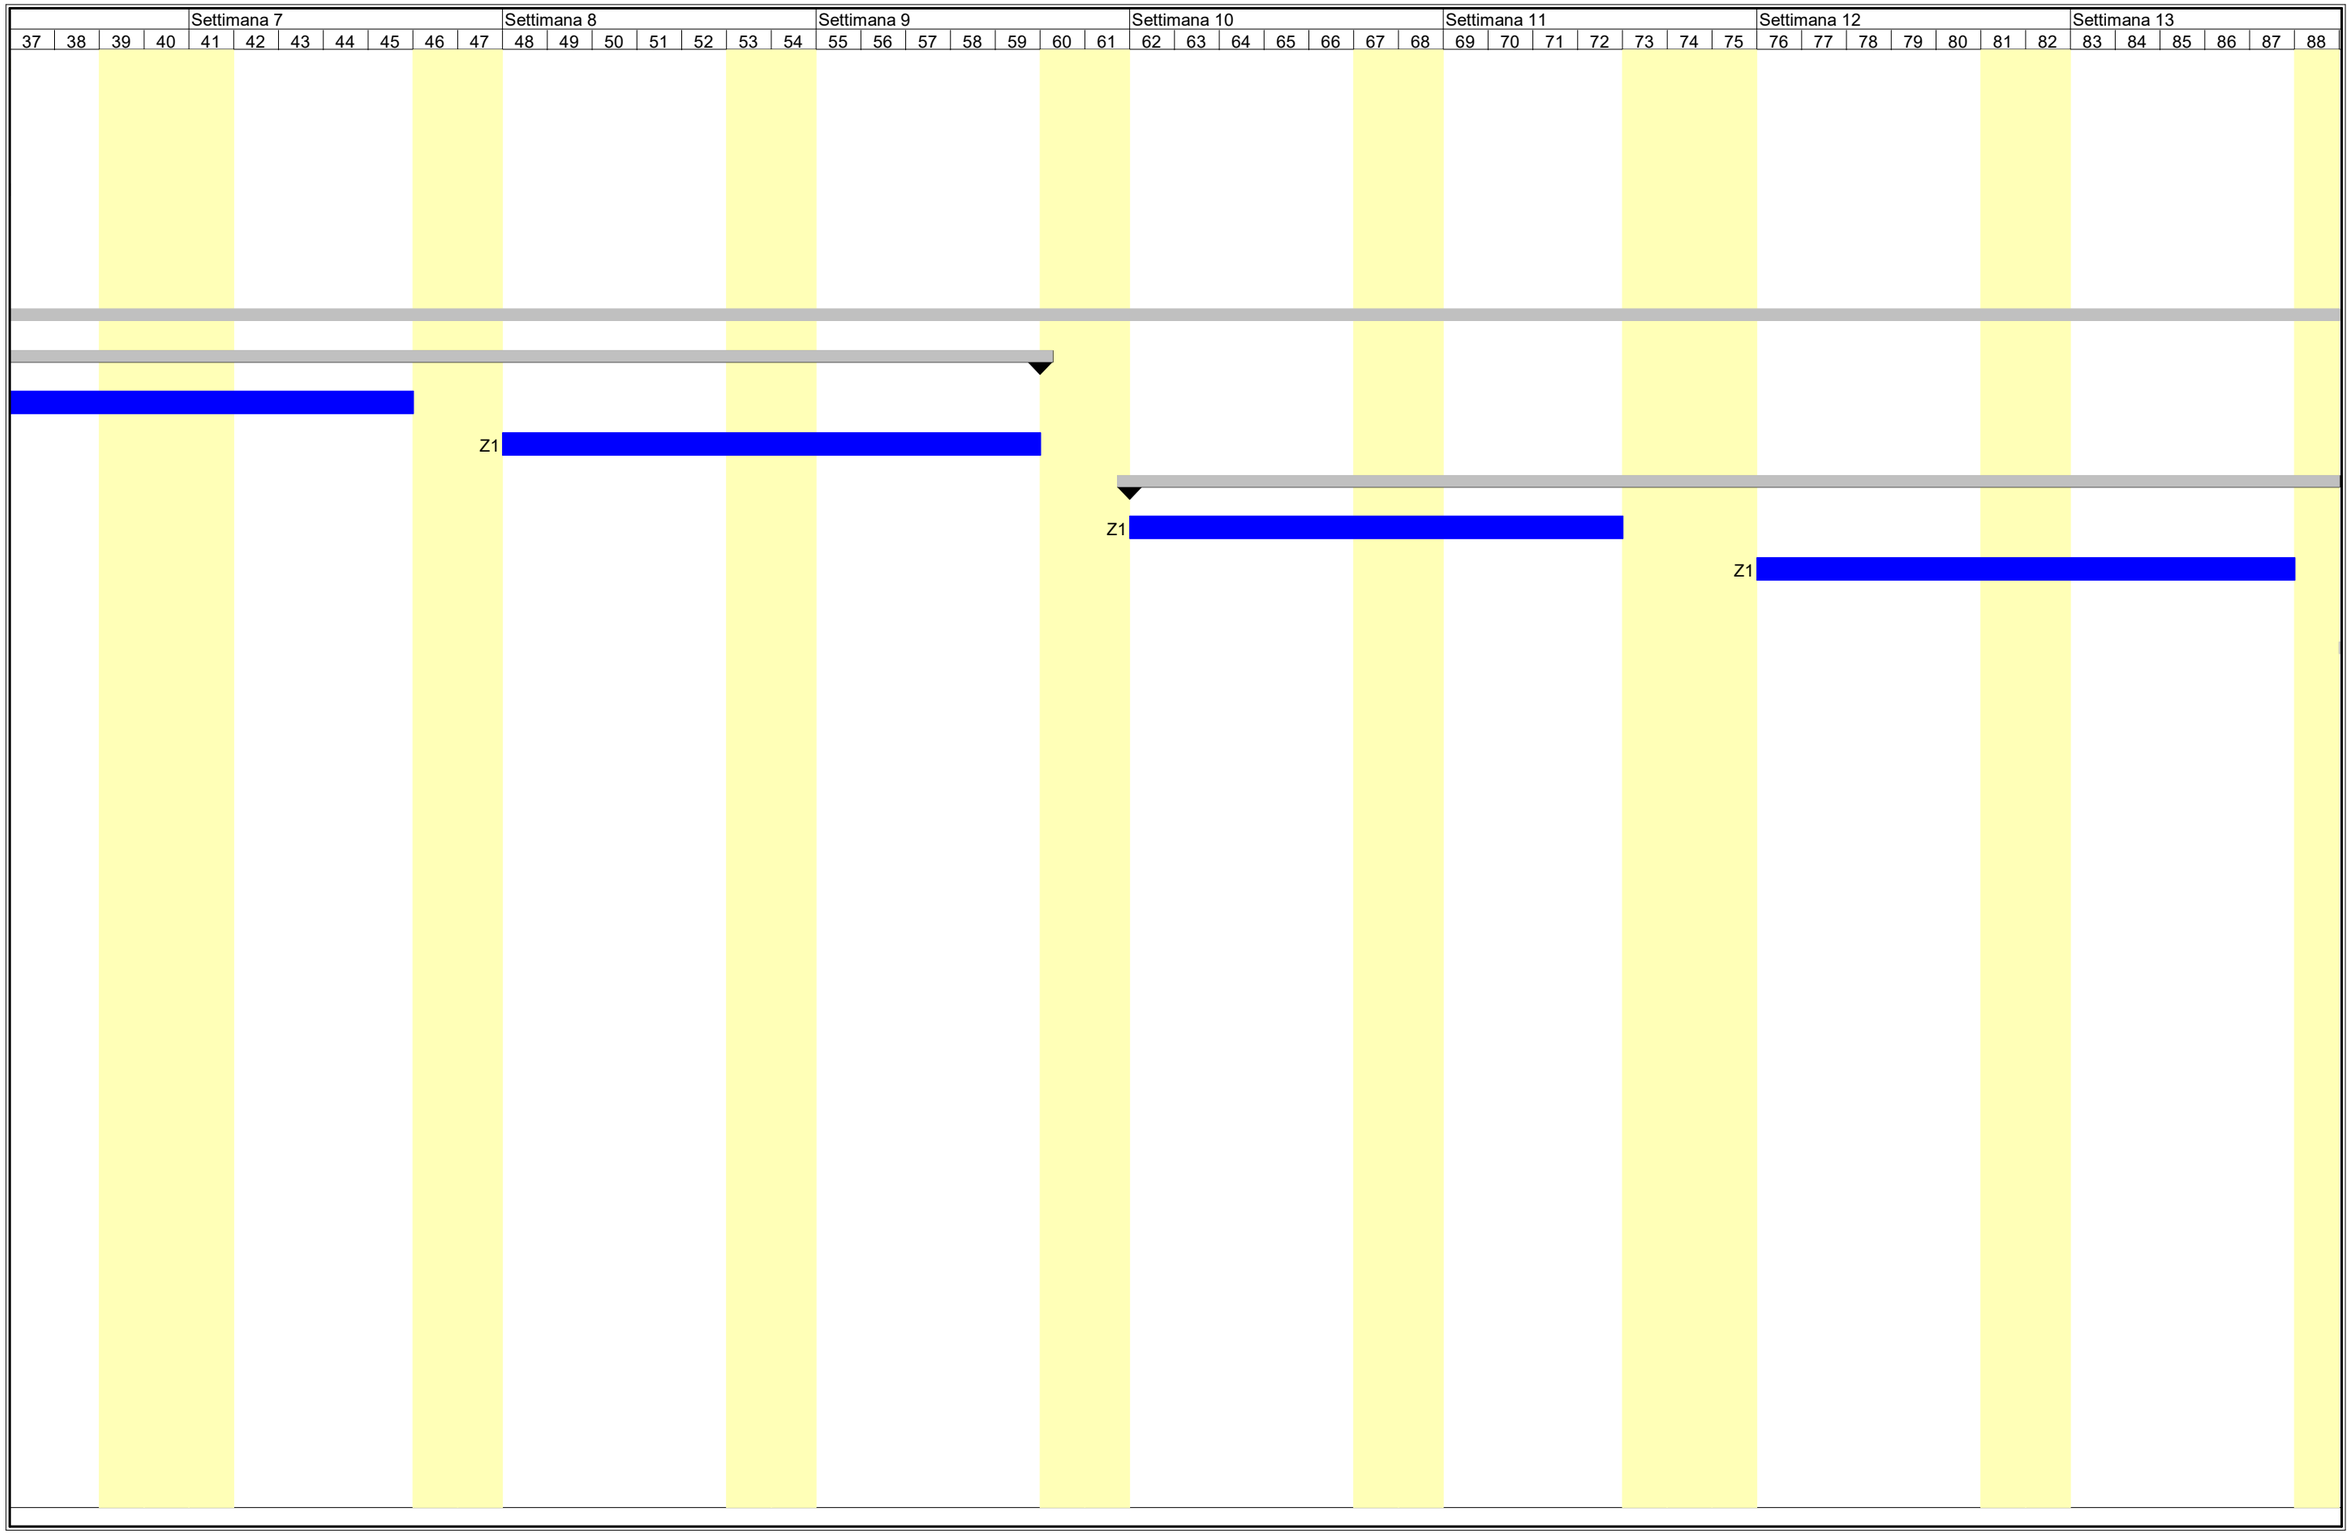
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Z1
Z1
Z1

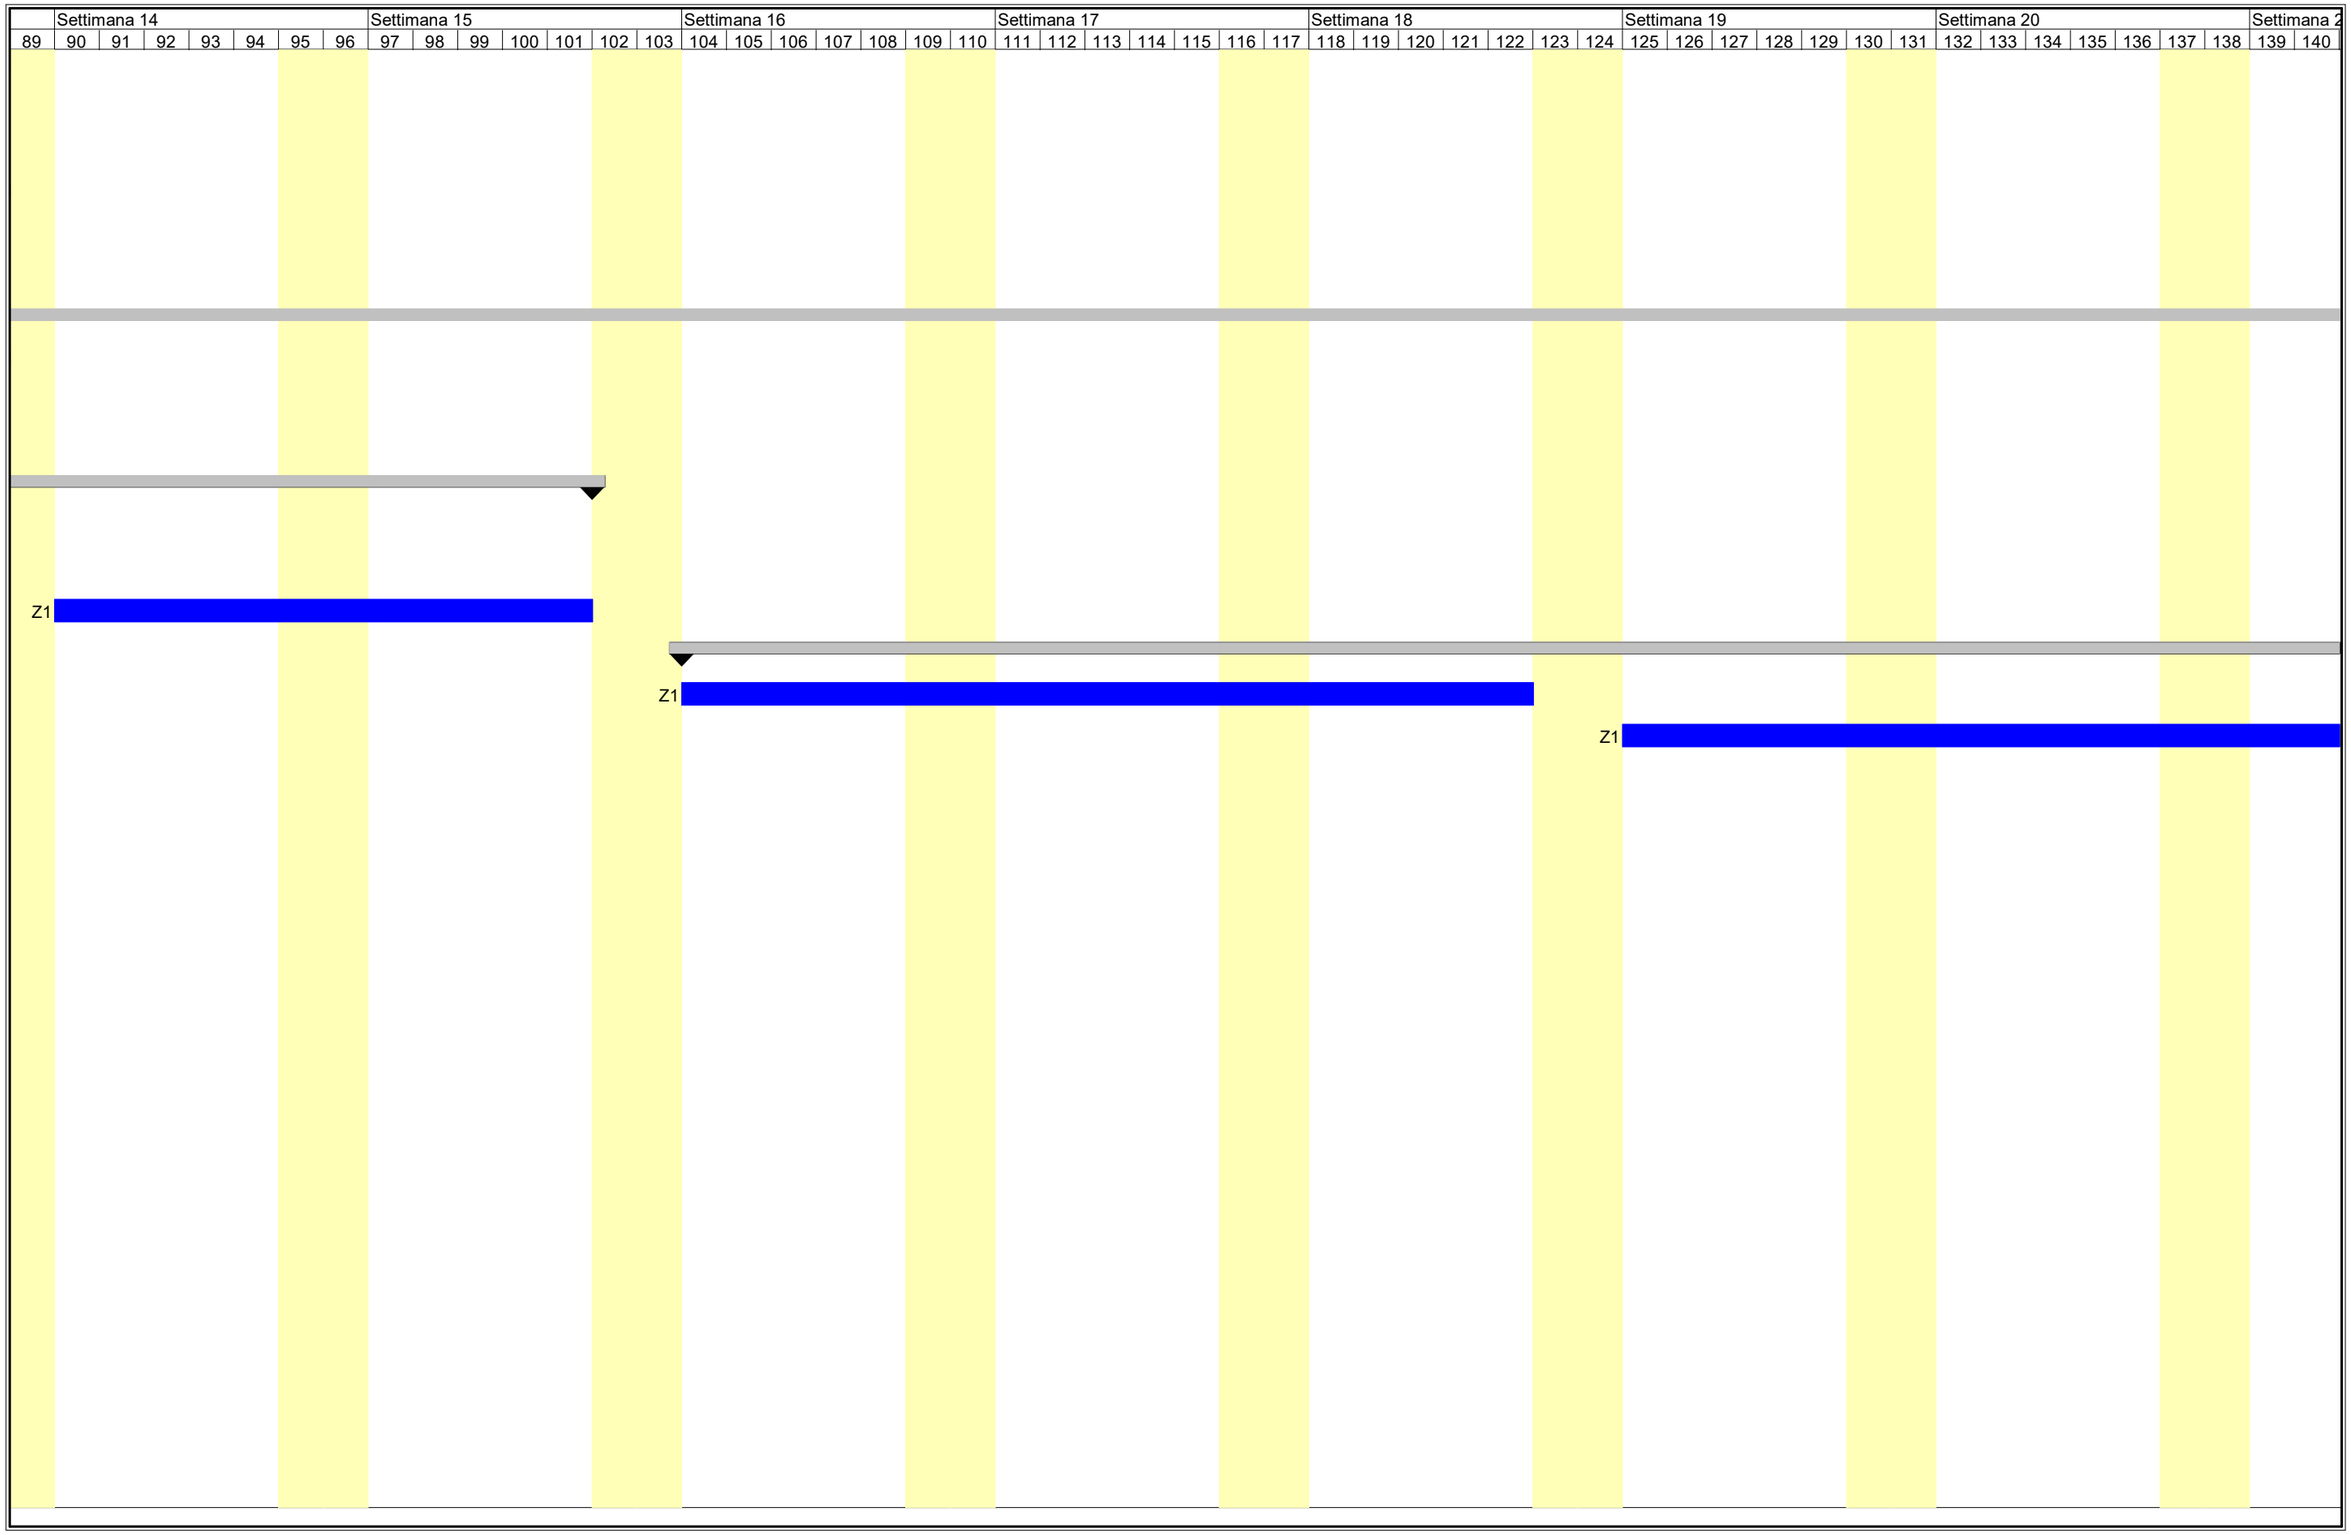
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
Settimana 17
Settimana 18
Settimana 19
Settimana 20
Settimana 2
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Z1
Z1
Z1

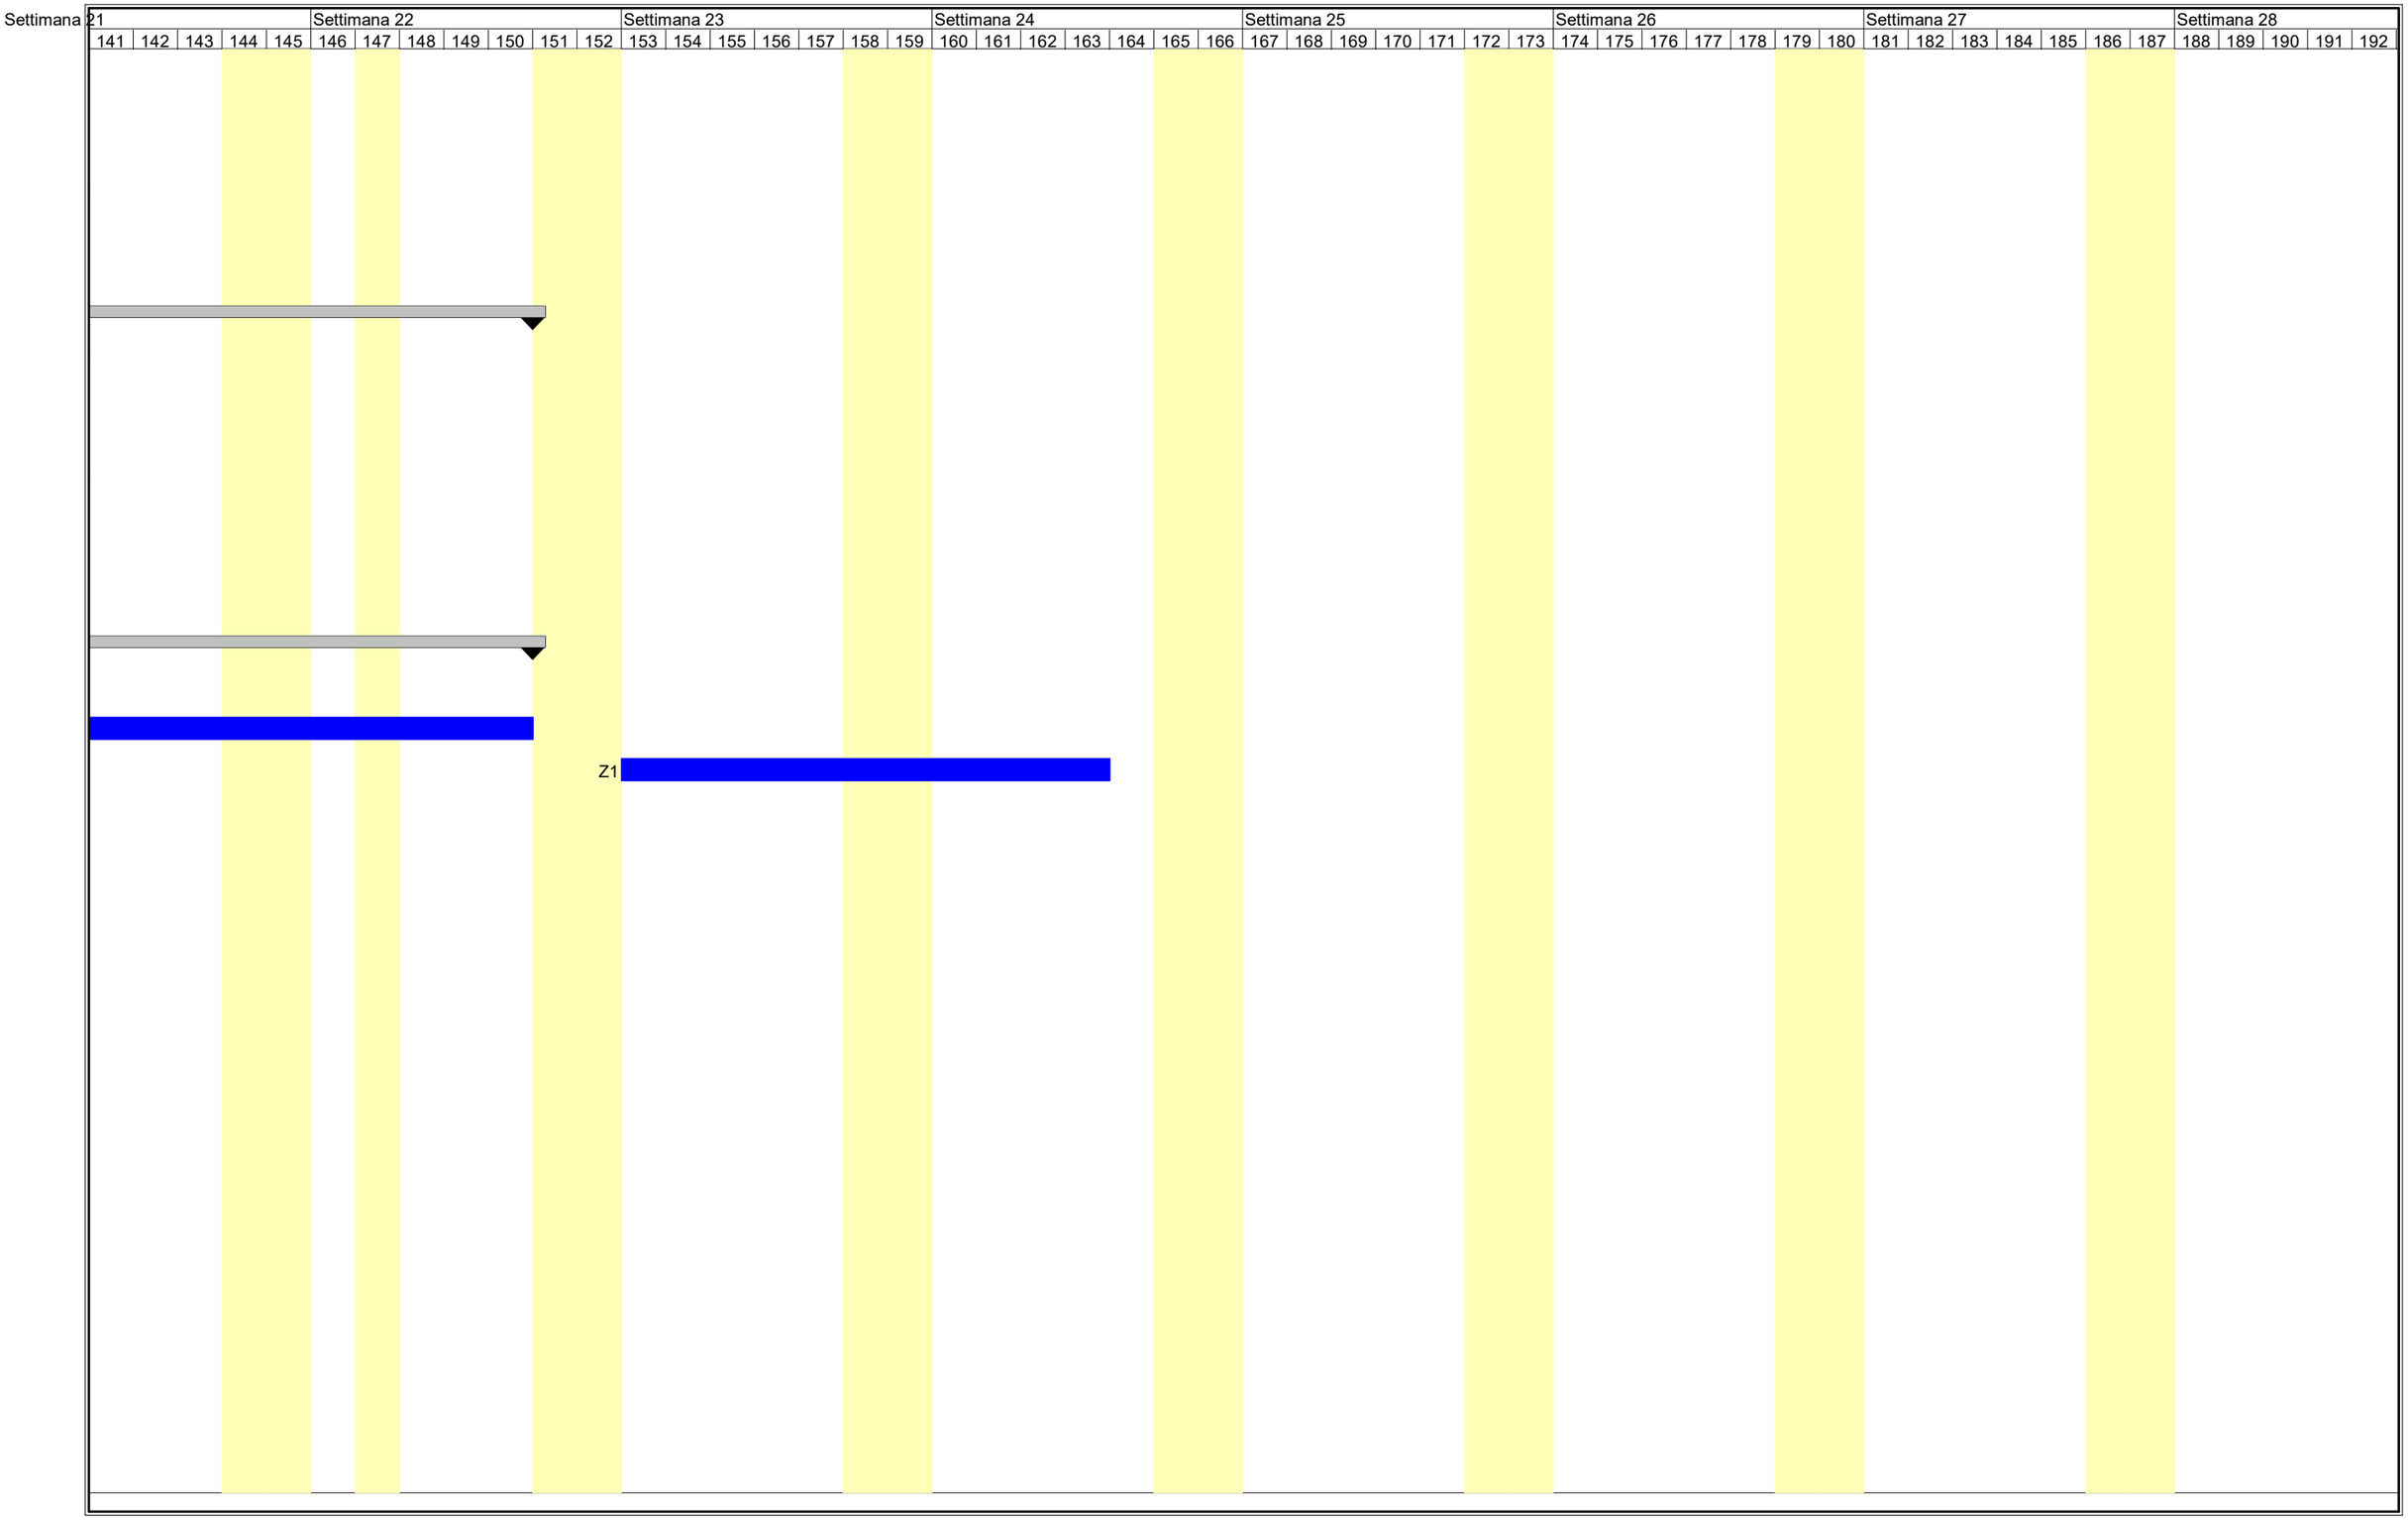
Settimana 21
Settimana 22
Settimana 23
Settimana 24
Settimana 25
Settimana 26
Settimana 27
Settimana 28
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
Z1
