REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	16.10.2023	034	013	093	Emissione per autorizzazione

COMMITTENTE

sorgenia
YOUR NEXT ENERGY

IMPIANTO

SE 150/36 kV CASACALENDA

INGEGNERIA & COSTRUZIONI

BRULLI
trasmissione

TITOLO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI
-	A3	1 / 2

N. DOCUMENTO

6 5 4 0 2 A

BRULLI trasmissione

SE 150/36 kV CASACALENDA

Cronoprogramma delle attività

65402A

2

ID	Nome attività
1	**Milestones**
2	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio
3	Voltura autorizzazione a Terna
4	Acquisizione aree
5	Messa in servizio SE 150/36 kV Casacalenda
6	Esecuzione raccordi 150 kV in cavo interrato
7	Termine delle attività
8	**Progettazione**
9	Elaborati generali di commessa
10	**Stazione elettrica SE 150/36 kV Casacalenda**
11	**Progettazione esecutiva**
12	Rilievo topografico area stazione elettrica
13	Elaborati costruttivi opere civili
14	Elaborati costruttivi opere meccaniche
15	Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT
16	Progetto elettrico sistema di automazione & controllo
17	Riesame della progettazione
18	Approvazione progetto esecutivo
19	**Acquisti**
20	RdO, ordine, costruzione e collaudo TR AT/AT
21	RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT
22	RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri 36 kV
23	RdO e subappalto opere civili
24	RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici
25	RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT
26	RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio
27	RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc
28	RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT
29	RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo
30	RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT
31	**Esecuzione opere**
32	**OOCC**
33	Allestimento cantiere e vie di accesso
34	Tracciatura capisaldi
35	Realizzazione fondazione fabbricati
36	Realizzazione fondazioni TR AAT/AT
37	Realizzazione fondazioni apparecchiature AT
38	Realizzazione rete di terra primaria
39	Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche
40	Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura
41	Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade
42	Realizzazione recinzione
43	Asfaltature strade
44	Sistemazione aree a verde
45	**Montaggi elettromeccanici**
46	Posa TR AT/AT
47	Posa carpenterie metalliche
48	Posa apparecchiature AT
49	Montaggio sbarre AT e collegamenti AT
50	Realizzazione rete di terra secondaria
51	**Montaggi 36 kV, MT/BT**
52	Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna
53	Posa quadri 36 kV
54	Posa apparecchiature MT
55	Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc
56	Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo
57	Posa e collegamento cavi MT e BT
58	**Collaudi e MIS**
59	Verifiche di passo e contatto rete di terra
60	Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc
61	Collaudo apparecchiature AT di piazzale
62	Collaudo quadri 36 kV
63	Taratura protezioni di linea e di impianto
64	Disponibilità rete dati per teleconduzione
65	Collaudo e verifiche SCADA
66	**Ripristini e smobilizzo cantiere**

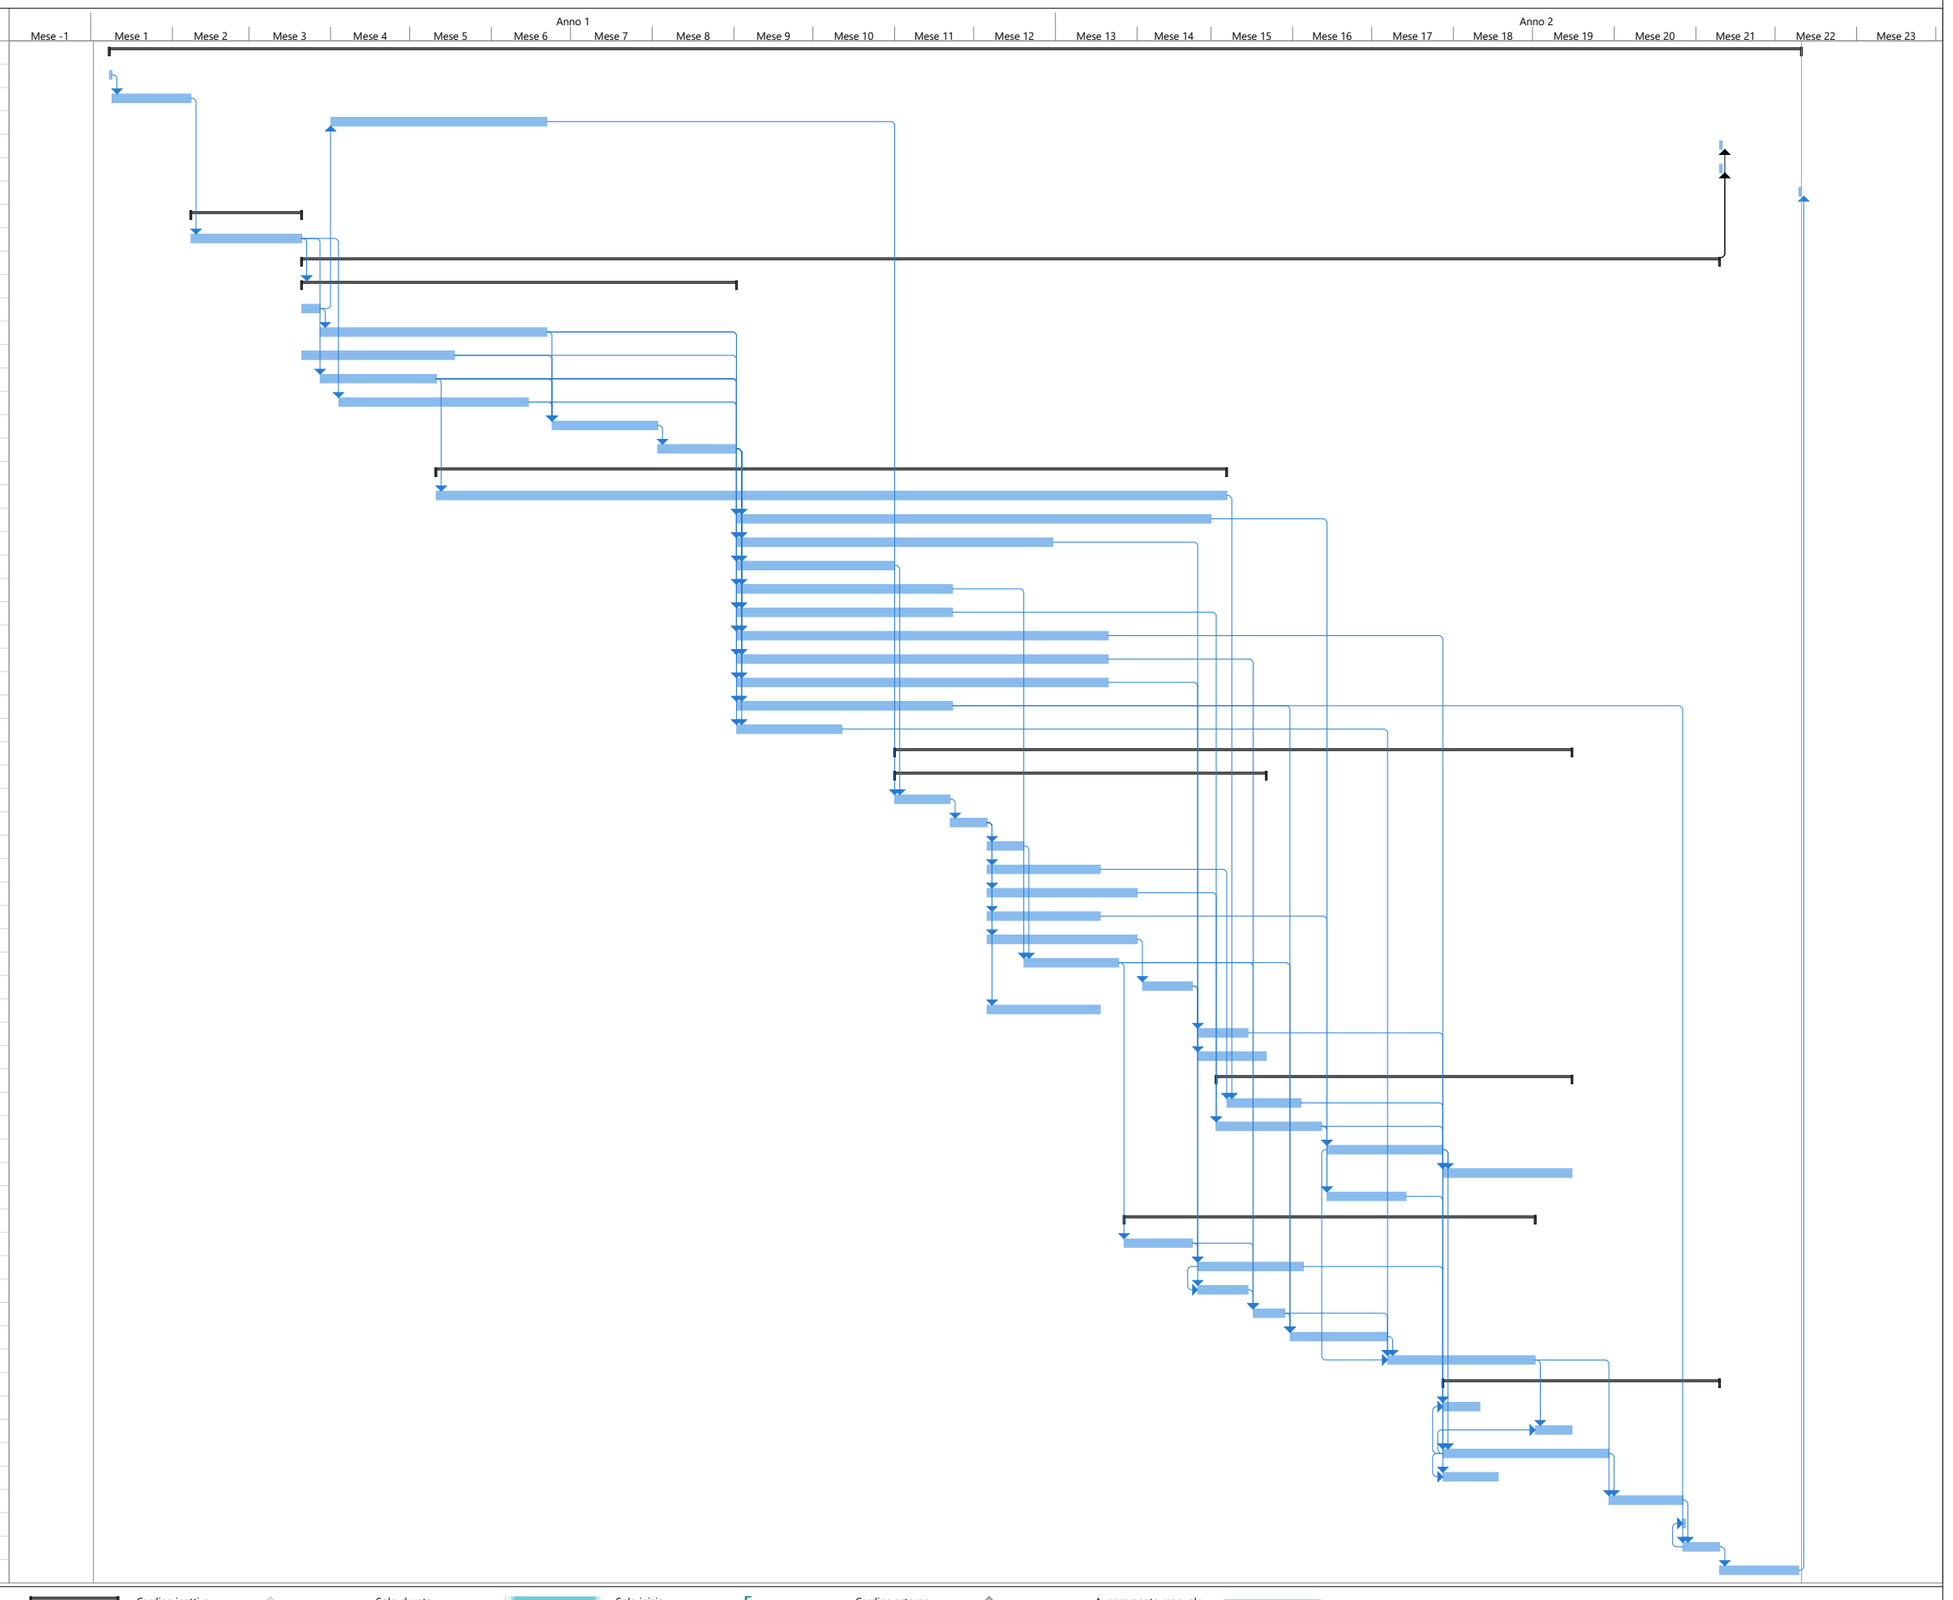

Attività · Divisione · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività inattiva · Cardine inattiva · Riepilogo inattiva · Attività manuale · Solo-durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo-fine · Attività esterne · Cardine esterno · Scadenza · Avanzamento · Avanzamento manuale
