D'APPOLONIA

CENTRALE DI BRINDISI NORD
REALIZZAZIONE DI UN CICLO COMBINATO DA 400 MW
Programma generale lavori

ID	Nome attività	Durata
1	**Realizzazione Ciclo Combinato 400 MW**	**590 g**
2	Assegnazione ordine EPC	0 g
3	Apertura cantiere	0 g
4	Realizzazione fondazioni principali	88 g
5	Montaggio turbina a gas	173 g
6	Commissioning turbina a gas	40 g
7	1° fuoco - prove - 1° parallelo turbina a gas	20 g
8	Montaggio generatore di vapore	193 g
9	Precommissioning generatore di vapore	20 g
10	Soffiature tubazioni vapore & ripristini	45 g
11	Modifiche su turbina a vapore	130 g
12	Commissioning turbina a vapore	42 g
13	1° parallelo turbina a vapore e prove a carico c.c.	95 g
14	Marcia commerciale ciclo combinato	0 g
15	**Modifica dell' Opersa di Presa**	**277 g**
16	Assegnazione contratto	0 g
17	Ingegneria	90 g
18	Fornitura materiali	90 g
19	Inizio cantiere	0 g
20	Scavi / opere civili	90 g
21	Montaggi	30 g
22	Collaudi e prove	7 g
23	Impianto operativo	0 g

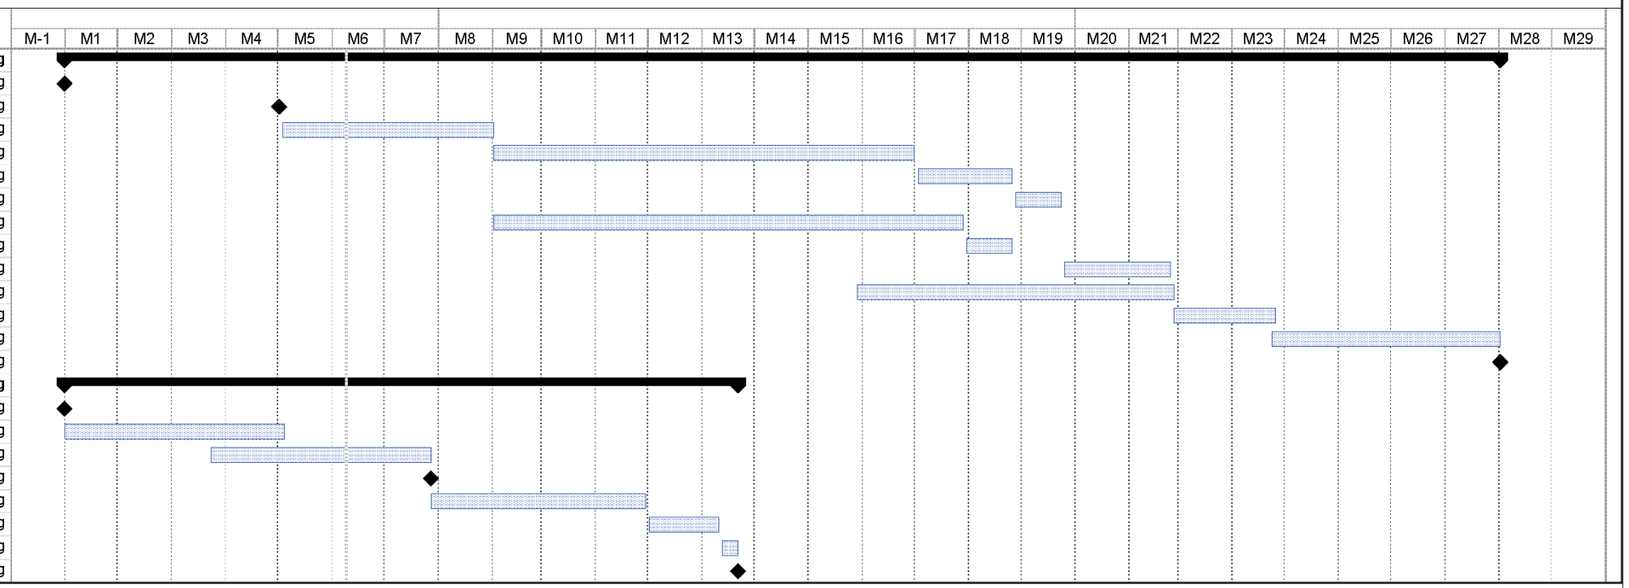

RIFERIMENTI

D'APPOLONIA, 2003 C; EDIPOWER, 2004 C

FIGURA 4.1

REVISIONE PROGETTO E SIA
RELAZIONE TECNICO - AMBIENTALE
RIPOTENZIAMENTO DELLA CTE DI BRINDISI
CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

PREPARATO PER

EDIPOWER S.p.A.
MILANO
