ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**00 - Opere di compensazione ambientale**	**3653 g**	**lun 01/02/16**	**sab 29/09/26**
2	Area ursida "Il Piano" - Signa	210 g	lun 01/02/16	dom 29/08/16
3	Area canopeica "I pratacci" - Fucognano	120 g	lun 01/02/16	lun 30/05/16
4	Area canopeica e ursida "S. Croce" - Osmanoro	150 g	lun 01/02/16	ven 29/07/16
5	Parco periurbano di Sesto F.no	365 g	dom 01/07/18	dom 30/06/19
6	Area "Mollaia"	120 g	lun 01/02/16	lun 30/05/16
7	Parco ecologico-ricreativo	120 g	sab 02/05/26	sab 29/08/26
8	**01 - Opere Gruppo A**	**211 g**	**lun 01/02/16**	**ven 19/08/16**
9	Realizzazione cassa di espansione D aeroporto/Polo	180 g	mar 02/03/16	sab 30/07/16
10	Fognature Polo UNIFI	180 g	lun 01/02/16	ven 29/07/16
11	Allacciamento vasca di scarico	20 g	dom 31/07/16	ven 19/08/16
12	Deviazione interferenze sottoservizi opere a rete	180 g	lun 01/02/16	ven 29/07/16
13	Adeguamento canale dell'Aeroporto	120 g	lun 01/02/16	lun 30/05/16
14	**02 - Opere Gruppo B**	**390 g**	**lun 01/02/16**	**ven 24/02/17**
15	**Modifica quota traffo autostrada A11**	**360 g**	**lun 01/02/16**	**mar 25/01/17**
16	Costruzione carreggiata bypass - corsia Pisa	70 g	lun 01/02/16	dom 10/04/16
17	Costruzione manufatto sfiradoio intersezione A11 e rialzamento corsia Firenze	110 g	lun 11/04/16	ven 29/07/16
18	Costruzione manufatto sfiradoio intersezione A11 e rialzamento corsia Pisa	110 g	sab 30/07/16	mer 16/11/16
19	Demolizione opere bypass	70 g	gio 17/11/16	mer 25/01/17
20	**Canale di Gronda e Fosso Lupaia**	**390 g**	**lun 01/02/16**	**ven 24/02/17**
21	Nuovo Canale di Gronda	60 g	lun 01/02/16	gio 31/03/16
22	Nuovo Fosso Lupaia Guinchi	60 g	lun 01/02/16	gio 31/03/16
23	Collegamento relicolo	30 g	gio 26/01/17	ven 24/02/17
24	**Fosso Reale a cesa di espansione A, B, C**	**330 g**	**lun 01/02/16**	**lun 26/12/16**
25	Arginature dx	150 g	lun 01/02/16	mer 29/06/16
26	Arginature sx	150 g	lun 01/02/16	mer 29/06/16
27	Cassa di espansione A	60 g	lun 01/02/16	gio 31/03/16
28	Cassa di espansione B	60 g	ven 01/04/16	lun 30/05/16
29	Opere di deviazione (Bastia) NO collegamento	30 g	mar 31/05/16	mer 29/06/16
30	Deviazione provvisoria in alveo F.R. a Casa Passerini (Palacciolo)	70 g	gio 30/06/16	mer 07/09/16
31	Deviazione provvisoria in alveo F.R. alla Bastia (Palacciolo)	70 g	gio 30/06/16	mer 07/09/16
32	Collegamento nuovo Fosso Reale	10 g	gio 17/11/16	sab 26/11/16
33	Cassa C e modellazione morfologica ex alveo F. Reale	30 g	dom 27/11/16	lun 26/12/16
34	**Cantiere Viabilità Principale Sesto F.no - Osmanoro**	**245 g**	**lun 01/02/16**	**mar 27/09/16**
35	Viabilità Principale Sesto F.No - Osmanoro (Lato Nord Pista)	130 g	lun 01/02/16	lun 30/05/16
36	Viabilità Principale Sesto F.No - Osmanoro (Lato Sud Pista)	80 g	dom 10/07/16	mar 27/09/16
37	Ponte Viab. Osmanoro per deviaz. Fosso Reale (compreso deviaz provvisoria viabilità)	90 g	mar 01/03/16	dom 29/05/16
38	Rotatoria Viab. Principale - Collag. Università'	70 g	mar 31/05/16	lun 08/08/16
39	Rotatoria Viab. Principale Collag. Viab. Case Passerini	40 g	mar 31/05/16	sab 09/07/16
40	**Cantiere Nuovo Svincolo Autostrada A11**	**320 g**	**lun 01/02/16**	**ven 16/12/16**
41	**Nuovo Svincolo Autostrada A11 - Viab. Principale Sesto F.No - Osmanoro**	**320 g**	**lun 01/02/16**	**ven 16/12/16**
42	Nuova Rotatoria Svincolo Autostrada A11 - Viab. Principale Sesto F.No - Osmanoro	90 g	dom 16/08/16	ven 16/12/16
43	Nuova Corsia di Uscita Autostrada A11 (NO collegamento)	70 g	dom 01/05/16	sab 09/07/16
44	Nuova Corsia di Entrata Autostrada A11 (NO collegamento)	70 g	dom 10/07/16	sab 17/09/16
45	Collegamento Nuova Corsia Svincolo Autostrada A11	10 g	lun 01/02/16	mer 10/02/16
46	Demolizione Svincolo esistente	30 g	lun 01/02/16	mer 01/03/16
47	**Nuovo Svincolo Autostrada A11 - Viabilità di Collag. Aeroporto**	**130 g**	**lun 01/02/16**	**gio 09/06/16**
48	Viabilità di Collag. Svincolo Autostrada A11 Aeroporto	90 g	lun 01/02/16	sab 30/04/16
49	Rotatoria Aeroporto	40 g	dom 01/05/16	gio 09/06/16
50	**Cantiere Viabilità Secondaria Case Passerini**	**90 g**	**dom 10/06/16**	**ven 16/12/16**
51	Viabilità Secondaria Case Passerini	90 g	dom 10/06/16	ven 16/12/16
52	Rotatoria Viab. Case Passerini	40 g	sab 05/10/16	mer 16/11/16
53	**03 - Opere Gruppo C**	**60 g**	**sab 20/06/16**	**mar 18/10/16**
54	Demolizione vecchia viabilità per Sesto F.no	60 g	sab 20/06/16	mar 18/10/16
55	Demolizione vecchia tracciato Fosso Reale	60 g	sab 20/06/16	mar 18/10/16
56	**04 - Opere Gruppo D**	**520 g**	**lun 01/02/16**	**lun 13/03/17**
57	**Cantiere Pista 12/30 - Lotto 1 (lato Lago Perebita)**	**360 g**	**mar 02/02/16**	**gio 26/01/17**
58	Bonifica Ordigni Bellici	120 g	mar 02/02/16	mar 31/05/16
59	Scavi e riporti	150 g	gio 03/03/16	sab 30/07/16
60	Fondazioni e sottofondo	180 g	sab 02/04/16	mer 28/09/16
61	Stagno Perebita - BOB, riempimento, corpo pista	40 g	lun 29/08/16	gio 27/10/16
62	Attuale vasca polo - BOB, riempimento, corpo pista	60 g	sab 20/08/16	mar 18/10/16
63	Pavimentazione in cls e opere impiantistiche superficiali	90 g	gio 29/09/16	mer 27/12/16
64	Strip	120 g	gio 29/09/16	gio 26/01/17
65	RESA	30 g	mar 28/12/16	gio 26/01/17
66	**Cantiere Pista 12/30 - Lotto 2 (lato stazioni di servizio A11)**	**360 g**	**lun 01/02/16**	**mer 25/01/17**
67	Bonifica Ordigni Bellici	120 g	lun 01/02/16	lun 30/05/16
68	Scavi e riporti	150 g	mar 02/03/16	ven 29/07/16
69	Fondazioni e sottofondo	180 g	ven 01/04/16	mar 27/09/16
70	Stagno La Querciola - BOB, riempimento, corpo pista	60 g	sab 30/07/16	mar 27/09/16
71	Pavimentazione in cls e opere impiantistiche superficiali	90 g	mar 29/09/16	lun 26/12/16
72	Strip	120 g	mar 29/09/16	mer 25/01/17
73	RESA	30 g	mar 27/12/16	mer 25/01/17
74	**Opere di completamento pista e nuovo sedime aeroportuale**	**210 g**	**mar 13/12/16**	**lun 10/07/17**
75	Cunette cantieri Lotto 1 e Lotto 2	90 g	mar 13/12/16	dom 12/03/17
76	Viabilità perimetrale e nuova recinzione aeroportuale	120 g	lun 13/03/17	lun 10/07/17
77	*Attivazione pista di volo*	0 g	lun 10/07/17	lun 10/07/17
78	**05 - Opere Gruppo E**	**810 g**	**lun 01/02/16**	**ven 20/04/18**
79	**Nuovo Terminal passeggeri**	**810 g**	**lun 01/02/16**	**ven 20/04/18**
80	Bonifica Ordigni Bellici e spostamenti sottoservizi	150 g	lun 01/02/16	mer 29/06/16
81		150 g	ven 15/06/16	dom 06/11/16
82	Chiusure verticali	240 g	lun 16/05/16	mar 16/05/17
83	Fondazioni e strutture in elevazione	240 g	lun 16/01/17	mer 12/09/17
84	Impianti	240 g	gio 11/05/17	ven 05/01/18
85	Finiture interne	240 g	lun 14/09/17	mer 10/04/18
86	Sistemazioni esterne	25 g	mar 27/03/18	ven 20/04/18
87	**Viabilità area terminal**	**391 g**	**gio 27/04/17**	**gio 12/04/18**
88	Accesso ai terminal - banchine	270 g	gio 27/04/17	dom 21/01/18
89	Viabilità servizio rendezvè	60 g	mar 23/01/18	gio 12/04/18
90	**06 - Opere Gruppo F**	**4187 g**	**lun 01/02/16**	**gio 29/07/27**
91	**Parcheggi**	**4187 g**	**lun 01/02/16**	**gio 29/07/27**
92	Ampliamento parcheggio rent a car	210 g	ven 01/01/27	gio 29/07/27
93	Parcheggio sosta breve - lotto1	365 g	mar 01/03/17	mer 28/02/18
94	Parcheggio sosta breve - lotto2	270 g	dom 01/03/20	mer 25/11/20
95	Parcheggio lunga sosta	150 g	ven 01/01/21	dom 30/05/21
96	Rifacimento parcheggio ambiente terminal esistente	180 g	ven 01/01/27	mar 29/06/27
97	Ampliamento parcheggio operatori TA ("Piazzale degli Spini")	210 g	lun 01/02/16	dom 29/08/16
98	Parcheggio Aviazione Generale	120 g	mar 01/01/19	mar 30/04/19
99	Parcheggio operatori area ovest - lotto1	210 g	lun 01/02/16	dom 29/08/16
100	Parcheggio operatori area ovest - lotto2	150 g	mar 01/06/21	gio 28/10/21
101	**07 - Opere Gruppo G**	**3837 g**	**dom 01/01/17**	**sab 24/07/27**
102	**Muri di ronga e polo logistico**	**2553 g**	**sab 01/01/17**	**mer 26/06/24**
103	Polo logistico uffici e spogliatoi	330 g	sab 01/01/17	sab 29/08/18
104	Rovvero mezzi piazzale est	300 g	ven 01/09/23	mer 26/06/24
105	Rovvero mezzi piazzale ovest	180 g	dom 01/07/18	gio 27/12/18
106	**Vigili del Fuoco**	**3837 g**	**dom 01/01/17**	**sab 24/07/27**
107	Caserma	270 g	ven 01/05/26	lun 25/01/27
108	Autorimesse	180 g	mar 26/01/27	sab 24/07/27
109	Bracciamento	210 g	dom 01/01/17	sab 29/07/17
110	**08 - Sub-concessioni e servizi**	**3653 g**	**lun 01/02/16**	**sab 22/06/24**
111	Aeroclub	365 g	ven 01/01/21	ven 31/12/21
112	Aviazione Generale	300 g	mar 01/01/20	lun 26/10/20
113	Cargo merci	480 g	lun 01/02/16	gio 26/05/17
114	Catering	210 g	gio 01/04/21	mer 27/10/21
115	Depositi carburanti	480 g	mar 01/03/23	sab 22/06/24

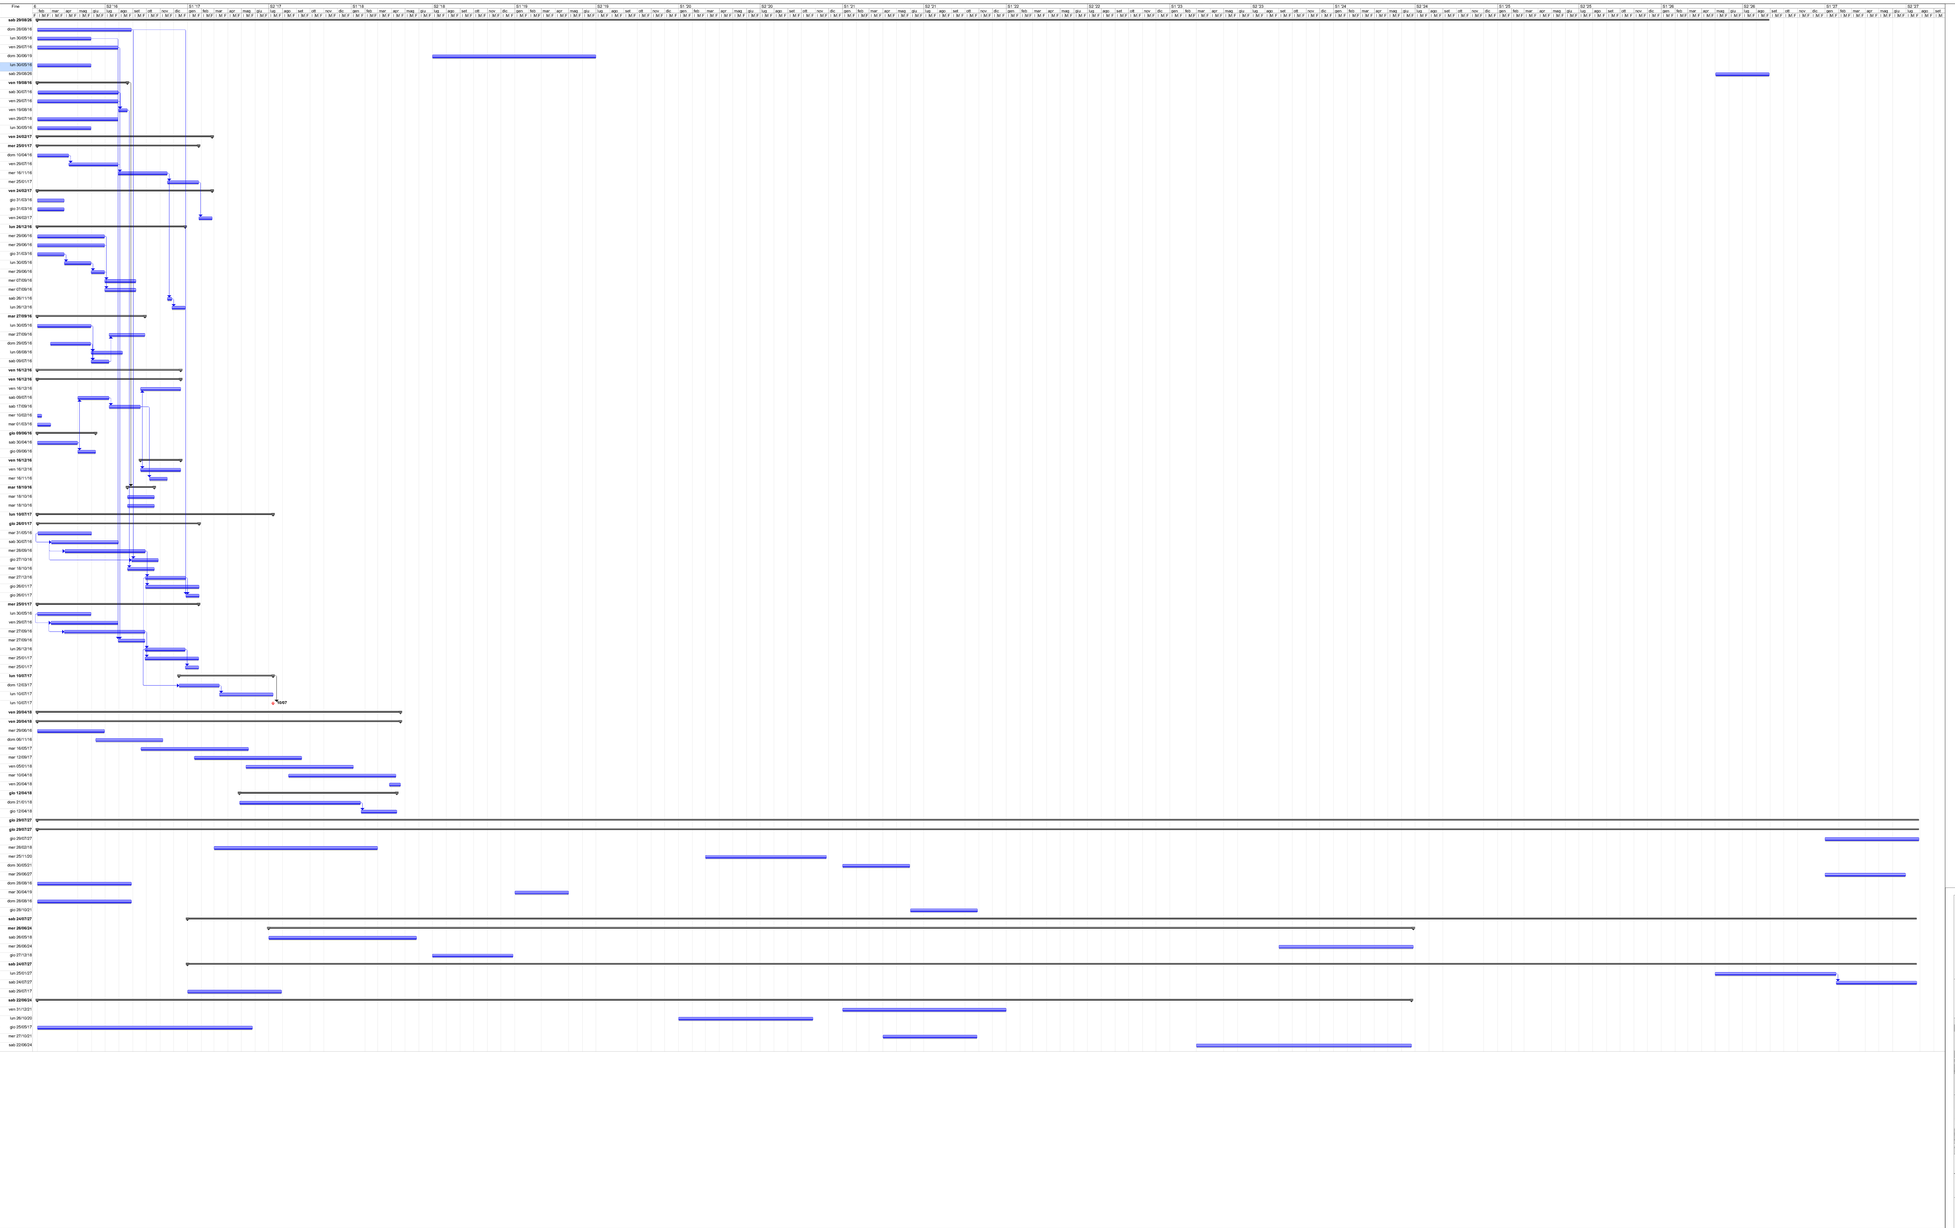

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Raptogo | Raptogo progetto | Attività esterna | Cardine esterno | Scadenza

PROPONENTE

ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
ITALIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY

Toscana Aeroporti

MASTER PLAN 2014-2029
AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI FIRENZE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ambiente
ingegneria ambientale e sviluppo

RESPONSABILE PROGETTO E COORDINATORE TECNICO
Ing. Lorenzo TINTORANI

NOME ELABORATO
Cronoprogramma dei Lavori

CODICE ELABORATO
INT-PGT-04-SCD-001

| Cartiglio elaborato | | |
