Impianto: Linea 380 kV UDINE OVEST - REDIPUGLIA e OPERE CONNESSE
Programma cronologico delle attività Realizzative post Decreto Autorizzativo

EGCR10001CGL00128
Rev.00 del 30/07/2014

ID	Nome attività
1	**Decreto autorizzativo UDINE OVEST-REDIPUGLIA e Opere Connesse**
2	
3	**PROGETTAZIONE Esecutiva Elettrodotti**
4	Progetto esecutivo e ottemperanza prescrizione Enti Interferenti
5	Assitsenza progettazione esecutiva e AS Build
6	
7	**FORNITURA Materiali Elettrodotti**
18	
26	
27	**REALIZZAZIONE**
28	**Interventi elettrodotti**
29	
30	
31	Invio Progetto esecutivo
32	Consegna aree e Capisaldi
33	**TRATTA 1 Opere Civili - Linea Aerea**
34	Apertura cantiere
35	Fondazioni Linea 380 kV dt Udine Ovest - Udine Sud
36	Fondazioni - Variante 380 kV st Planais - Udine Ovest
37	**TRATTA 1 Opere Elettromeccaniche - Linea Aerea**
38	Attività propedeutiche alla realizzazione
39	Apertura cantiere
40	Montaggi e tesatura 380 kV dt Udine Ovest - Udine Sud
41	Montaggi/Tesatura Variante 380 kV Planais - Udine O.
42	Demolizione 380 KV st tratto in Variante
43	**TRATTA 2 - Linea Aerea**
44	Attività propedeutiche alla realizzazione
45	Apertura cantiere
46	Realizzazione Linea 380 kV dt Udine Sud - Sostegno n.39
47	Raccordo SE Udine Sud 220 kV st Udine NE-Redipuglia
48	Demolizione 220 kV st da Raccordo Udine Sud - Sostegno n.80
49	**TRATTA 3 - Linea Aerea**
50	Attività propedeutiche alla realizzazione
51	Apertura cantiere
52	Realizzazione Linea 380 kV dt da Sostegno n.39 - Redipuglia
53	Variante 2 - Linea 380 kV st Planais - Redipuglia
54	Demolizione Linea 380 KV st tratto in Variante
55	Demolizione 220 kV st da Sostegno n.80-Redipuglia
56	Variante 3 - Linea aerea 132 kV st Schiavetti - Redipuglia
57	Demolizione 132 kV st Tratto in variante
58	
59	**Entra in servizio linea 380 kV dt Udine O-Udine S-Redipuglia**
60	
61	**Realizzazione Variante Cavo 132 kV Redipuglia-Schiavetti**

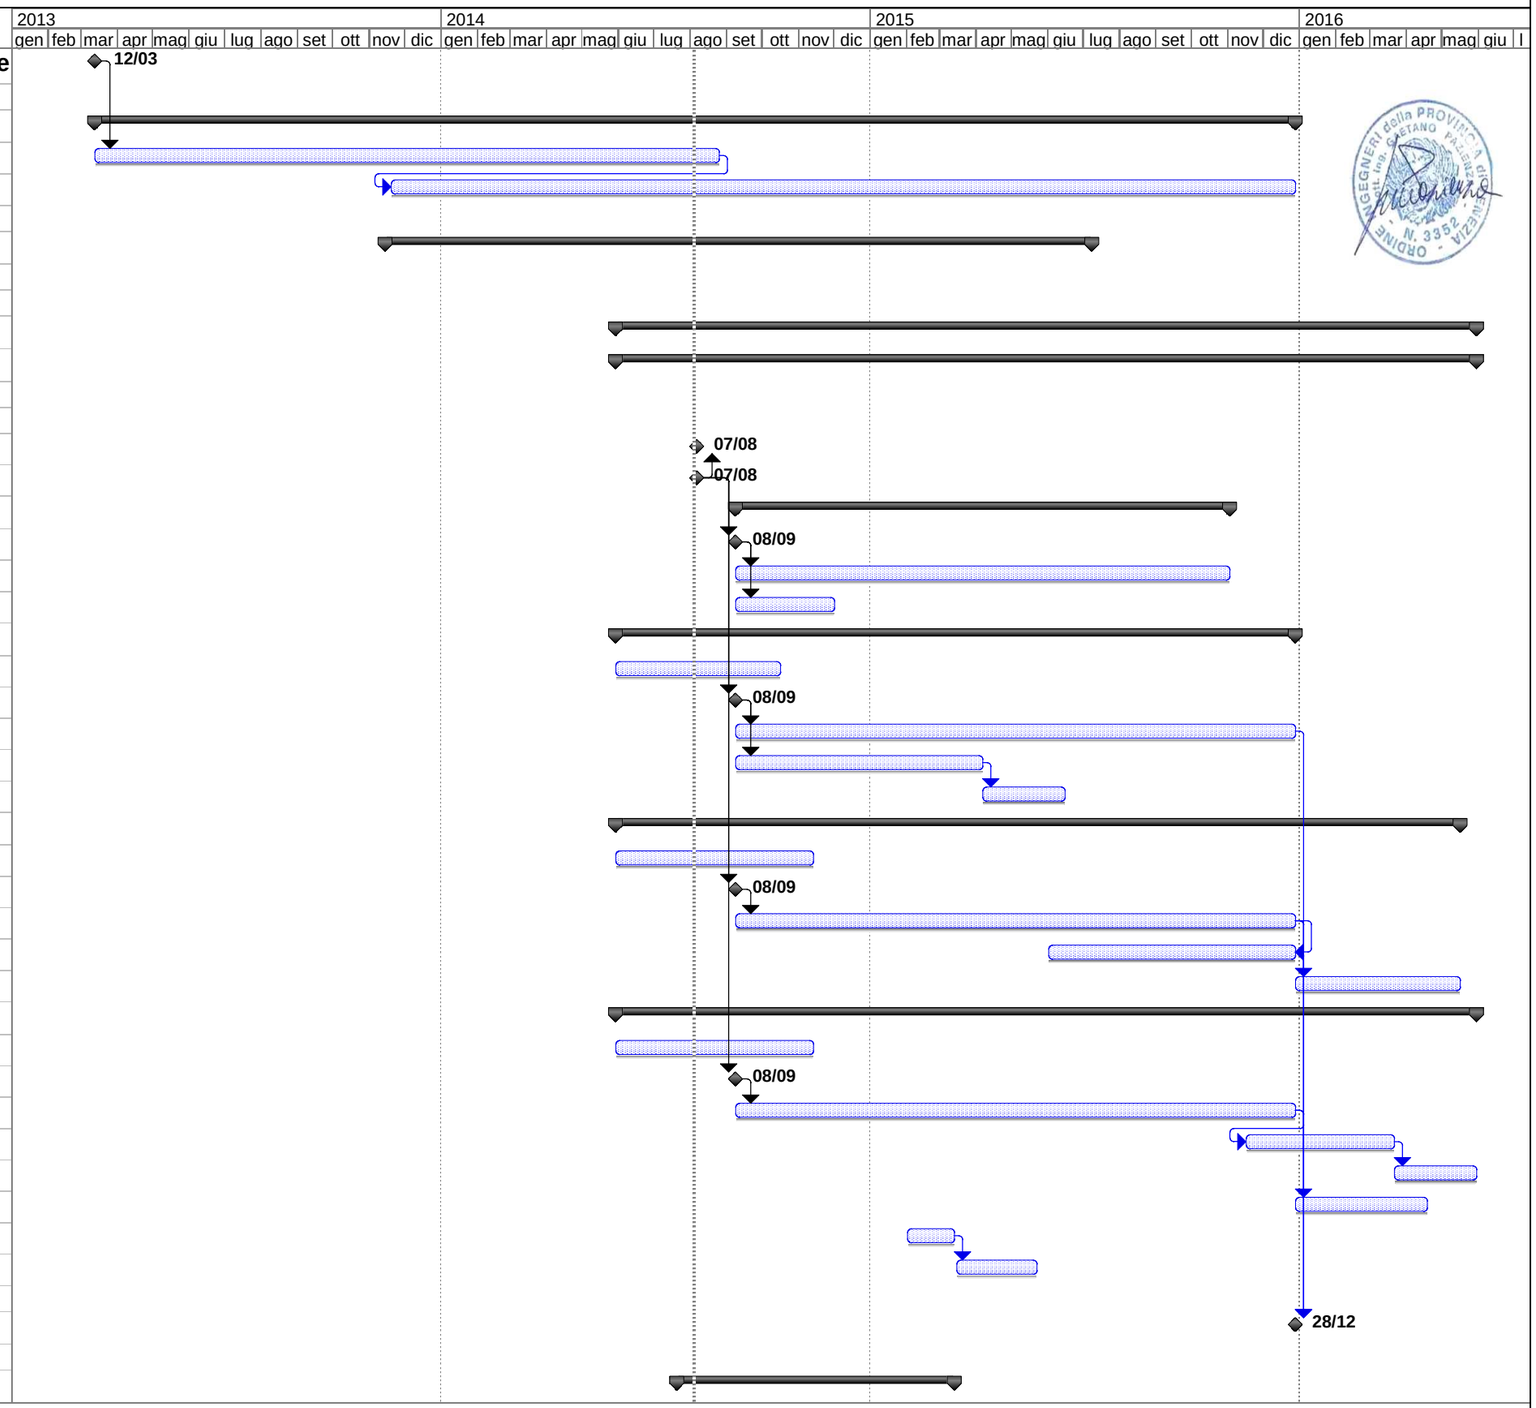

Progetto: Gant_Udine O-Redipuglia
File: EGCR10001CGL00128-00_(Prog-Rea

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno

Note: Il presente doc. è legato alla pianific. delle disalimen. degli impianti e quindi sub. alla garanzia e sicur. della continuità del servizio ellettrico dell'intera RTN.
