ID	Nome attività	Durata
1	**MURO IN TERRA RINFORZATA TR03**	**240 g**
2	scavo	15 g
3	posa di materiale per bonifica piano di posa	30 g
4	posa drenaggi	5 g
5	rinterro	190 g
6		
7	**MURO PREFABBRICATO MU19**	**122 g**
8	scavo fondazione	15 g
9	getto magrone	5 g
10	posa pannelli	20 g
11	armatura fondazioni	15 g
12	getto fondazioni	10 g
13	posa drenaggi	3 g
14	rinterro	60 g

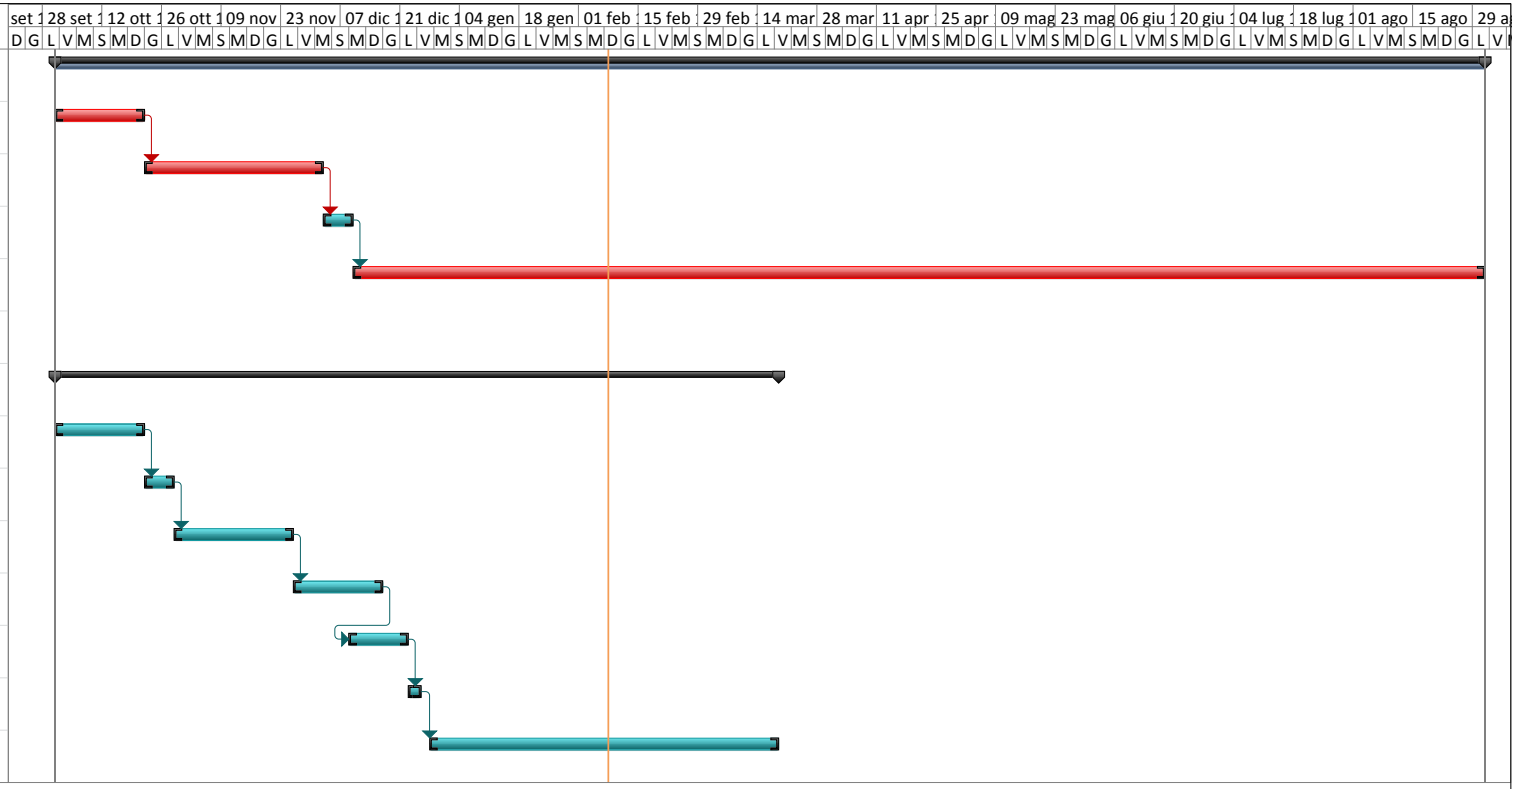

Progetto: 16.02.08 cronoprogram
Data: lun 08/02/16

Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			
