Centrale di Monfalcone - Progetto di trasformazione in CCGT della sezione 4 - Programma degli interventi di adeguamento

Descrizione attività	Mesi
Demolizione serbatoi OCD	
Cantierizzazione	1
Bonifica Interna serbatoio 2	
Scoibentazione serbatoio 2	
Demolizione ferro serbatoio 2	
Demolizioni civili serbatoio 2	
Bonifica Interna serbatoio 3	
Scoibentazione serbatoio 3	
Demolizione ferro serbatoio 3	
Demolizioni civili serbatoio 3	
Costruzione CCGT	
IPC	
Ingegneria di base	9
Ingegneria esecutiva	32
Fabbricazione TG1	23
Trasporto TG1	1
Indagini geognostiche	2
Cantierizzazione	3
Fondazioni Isola Produttiva	13
Edificio TG	9
Fondazioni GVR / camini	11
Altre fondazioni e Piperack	12
Lavori underground	8
Lavori di urbanizzazione	9
Montaggio carroponte ed. TG	2
Montaggio TG 1 + ALT	5
Fabbricazione TG2	25
Trasporto TG2	1
Montaggio TG 2 + ALT	5
Fabbricazione GVR 1	19
Montaggi GVR 1	9
Fabbricazione GVR 2	21
Montaggi GVR 2	9
Fabbricazione Rotore per revamping TV	23
Trasporto rotore TV	1
Fermata Gruppo 4	
Revamping TV e revisione Alternatore	8
Fabbricazione Condensatore	18
Trasporto	1
Demolizione vecchio Condensatore	2
Montaggio nuovo Condensatore	6
Fabbricazione pompe acqua circolazione	20
Trasporto Pompe AC	1
Montaggio Pompe AC	2
Prefabbricazioni e montaggi meccanici	12
Montaggi elettrici	10
Avviamento TG 1	3
Soffiature GVR 1	2
Avviamento TG 2	3
Soffiature GVR 2	2
Avviamento Ciclo Termico	3
Prove piena potenza e collaudi	4
Accettazione provvisoria CCGT	
Fermata Gruppo 3	
Demolizione Caldaie e precipitatori	
Demolizione Caldaia gr. 4	9
Demolizione precipitatori elettrostatici gr. 4	5
Demolizione Caldaia gr. 3	9
Demolizione precipitatori elettrostatici gr. 3	5

L'IPC (Inizio Programma cronologico del CCGT) sarà coincidente o successivo alla data di autorizzazione alla costruzione (Ministero dello Sviluppo Economico)
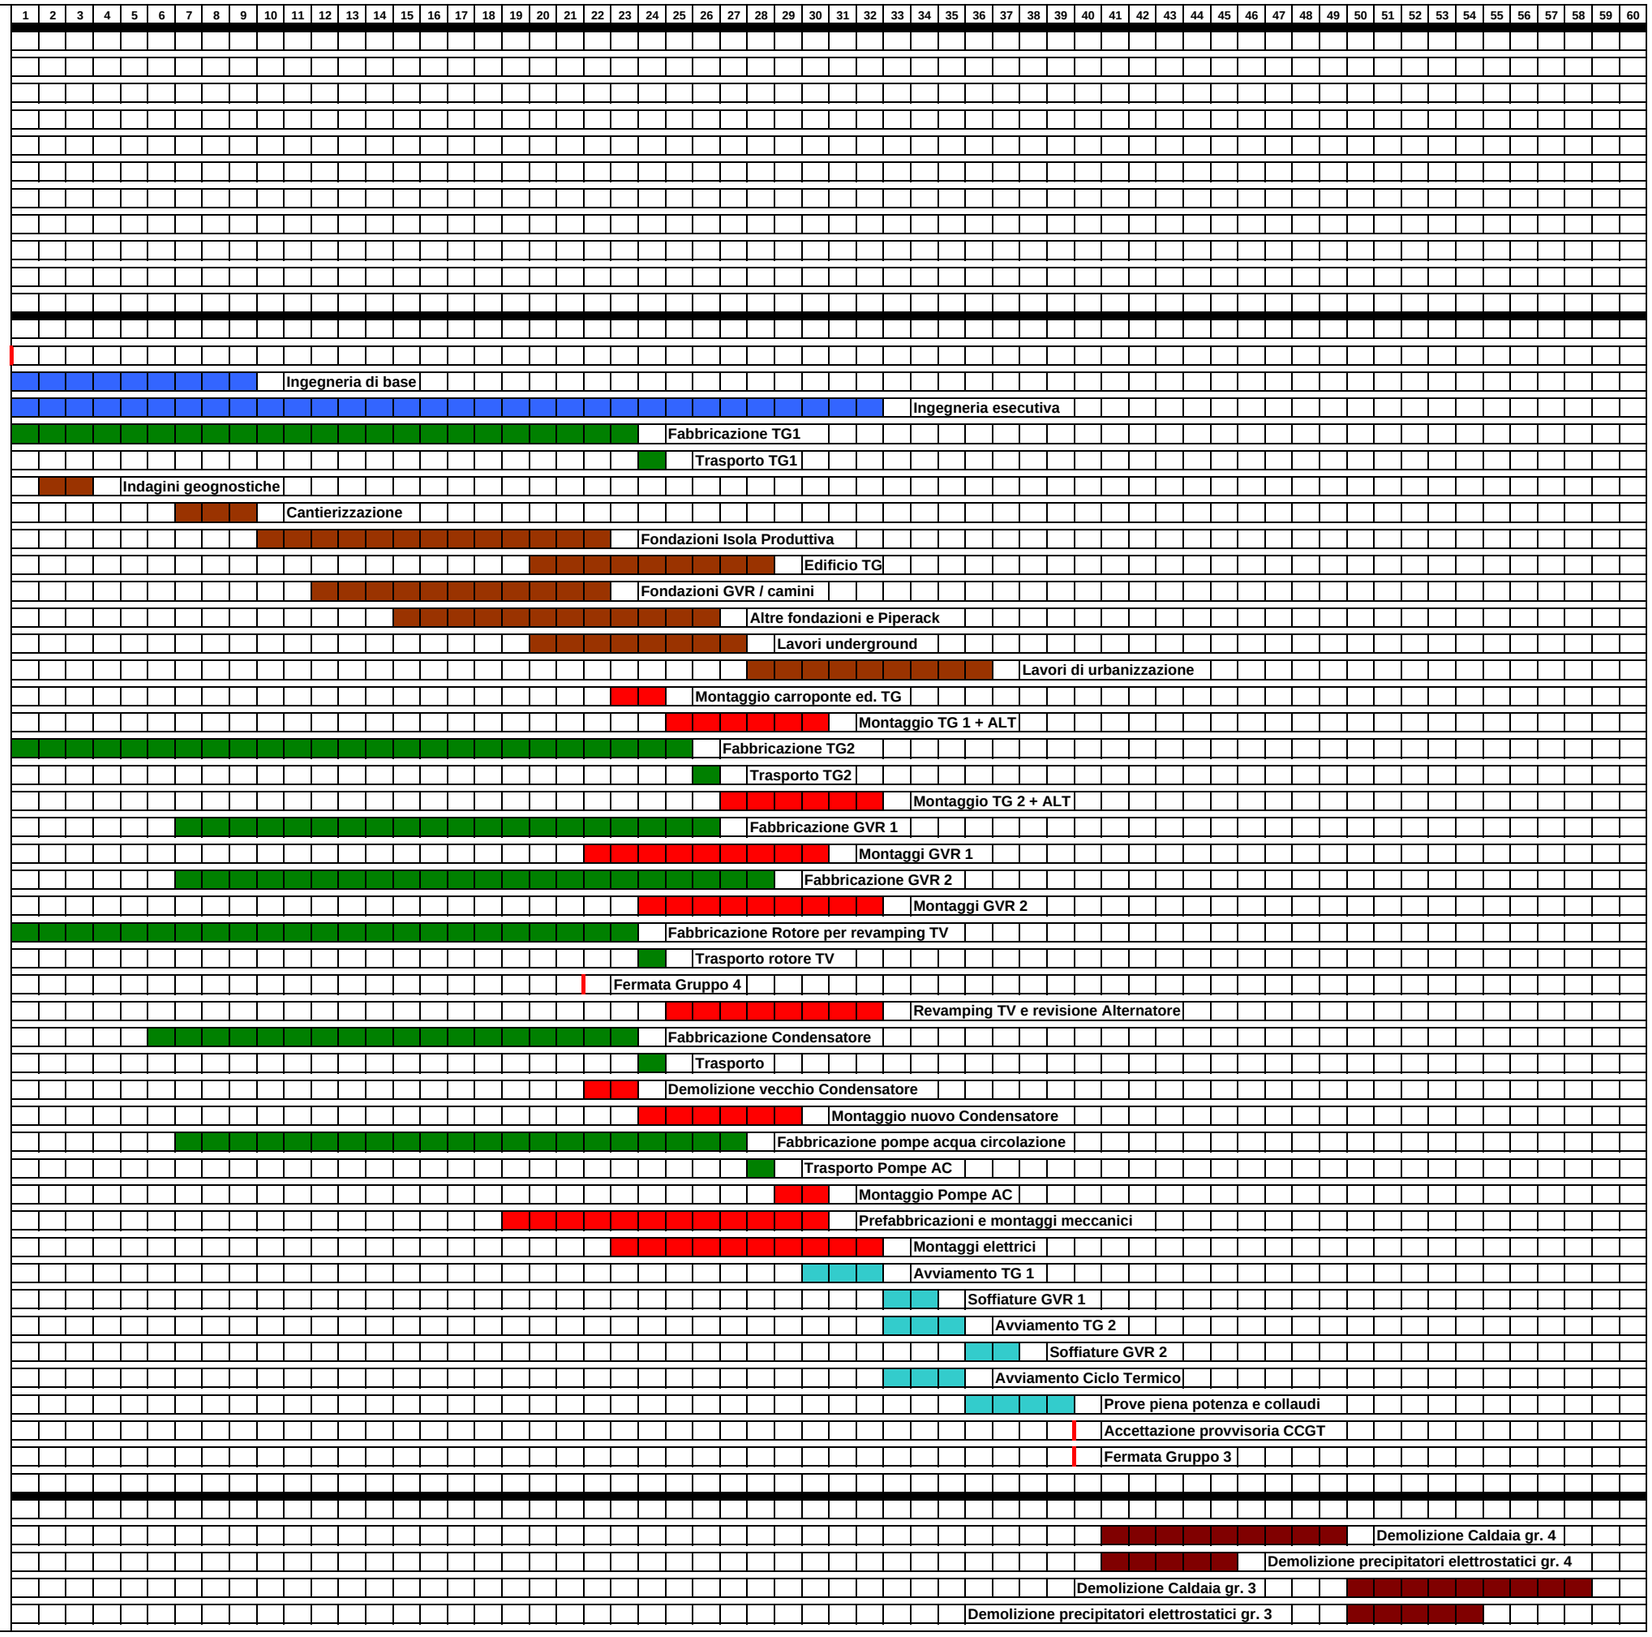
La demolizione dei serbatoi è propedeutica alla costruzione del CCGT.
