REALIZZAZIONE FONDAZIONI E MONTAGGIO BARRIERE DA FUORI SEDE FERROVIARIA, SENZA INTERFERENZE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA, CON SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO IN FASE DI MONTAGGIO.

INTERVENTO TIPO 2
BARRIERE H>4.0m

FASE 0: OPERE PRELIMINARI

LAVORAZIONE DIURNA SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

0.A) SPOSTAMENTO CAVI DALLE CANALETTE AL CAVEDOTTO IN POLIETILENE TAGLIATO LONGITUDINALMENTE

0.B) RIMOZIONE CANALETTE

0.C) BONIFICA BELLICA

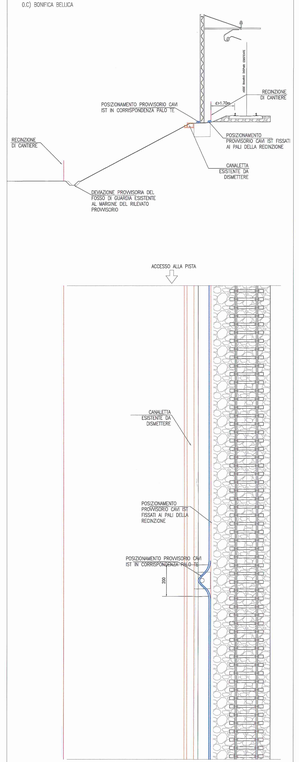

FASE 1: OPERE DI FONDAZIONE PER BARRIERE ANTIRUMORE

LAVORAZIONE DIURNA SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

1.A) SCAVI E FORMAZIONE DEL RILEVATO PROVVISORIO

1.B) TRIVELLAZIONE MEDIOPALI DI SOTTOFONDAZIONE CON MACCHINA DI PICCOLE DIMENSIONI

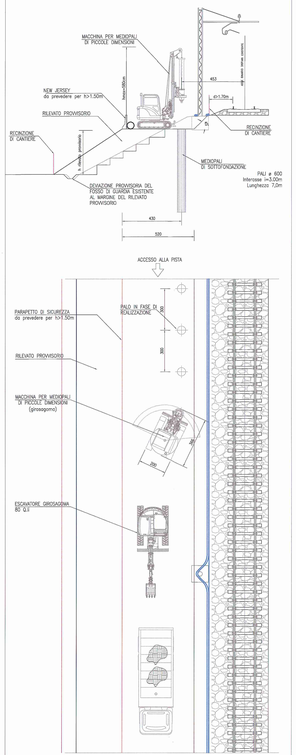

FASE 1: OPERE DI FONDAZIONE PER BARRIERE ANTIRUMORE

LAVORAZIONE DIURNA SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

1.C) POSA GABBIE PALI PER CONCI DI H=ma=5.50m

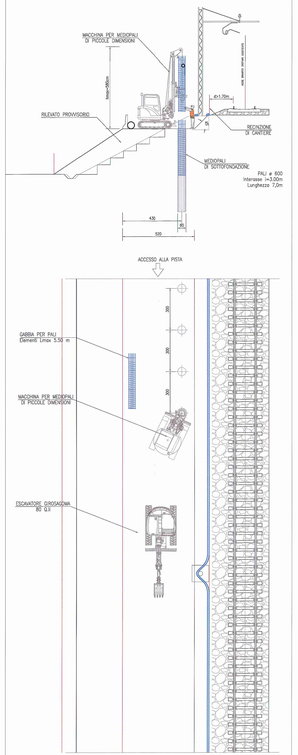

FASE 1: OPERE DI FONDAZIONE PER BARRIERE ANTIRUMORE

LAVORAZIONE DIURNA SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

1.D) GETTO DEL MEDIOPALO

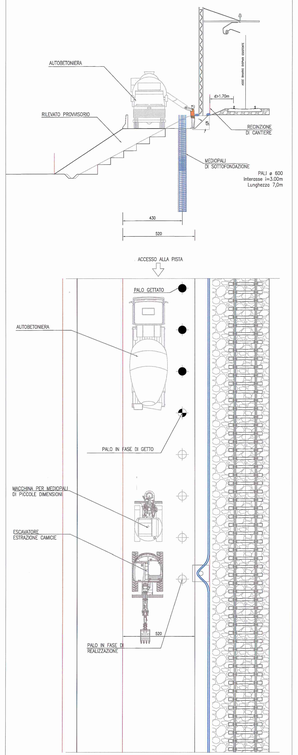

FASE 2: OPERE DI FONDAZIONE PER BARRIERE ANTIRUMORE

LAVORAZIONE DIURNA SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

2.A) REALIZZAZIONE CORDOLO DI FONDAZIONE

2.B) RINTERRO A TERGO DEL CORDOLO

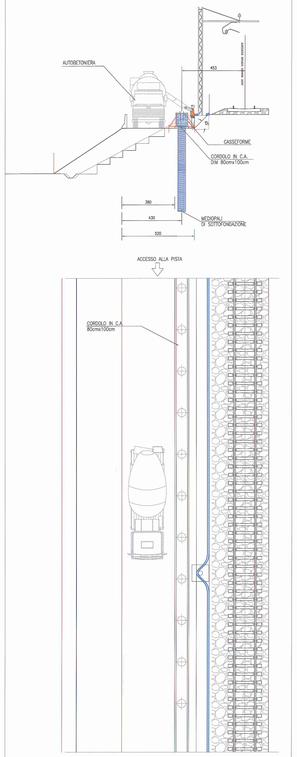

FASE 3: POSA MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE

LAVORAZIONE CON SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO E IN TOLTA TENSIONE

3.A) POSA MONTANTI IN ACCIAIO PER MEZZO DI AUTOCARRO CON GRU DALL'ESTERNO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI

3.B) REALIZZAZIONE BULLONATURE MEDIANTE CESTELLO DI LAVORO AEREO

3.C) POSA IN OPERA DI CANALETTA PORTACAVI

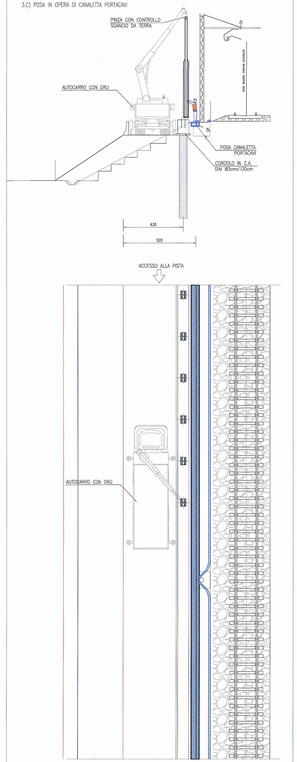

FASE 4: POSA PANNELLI BARRIERA ANTIRUMORE

LAVORAZIONE CON SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO E IN TOLTA TENSIONE

4.A) POSA PANNELLI FONOASSORBENTI PREFABBRICATI IN CLS, CLS E ARGILLA ESPANSA FONOISOLANTE IN VETRO STRATIFICATO / FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI IN ACCIAIO PER MEZZO DI AUTOCARRO CON GRU POSIZIONATA ALL'ESTERNO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI CON AUSILIO DI CESTELLO PER LAVORO AEREO

4.B) OPERE DI COMPLETAMENTO – RIPOSIZIONAMENTO CAVI

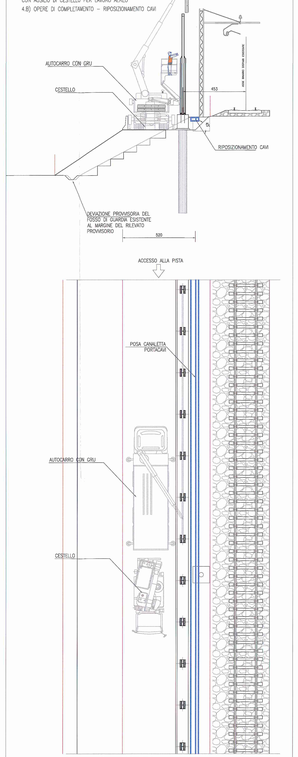

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE – A.T.I. – CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (Capogruppo) – SICURBAU S.R.L.

CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Via Pisacane, 2/3 - 20026 Novate Milanese (MI) Tel. 02/3545.1.1 - Fax 02/3545.1.245 P.IVA e C.F. 00 617 240 156

SICURBAU S.r.l. Via Pisacane, 2/3 - 20026 Novate Milanese (MI) Tel. 02/3545.1.1 - Fax 02/3545.1.245 P.IVA e C.F. 07 617 240 156

PROGETTAZIONE: S.T.E. srl - Italiana Sistemi srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA

Lotto funzionale Treviglio-Brescia

INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA INGRESSO URBANO DELL'INTERCONNESSIONE DI BRESCIA OVEST E NODO DI BRESCIA

CANTIERIZZAZIONE

Modalità di realizzazione delle fondazioni e montaggio delle barriere dall'esterno della sede ferroviaria per mezzo di rilevato provvisorio e per barriere di H>4.0m - INTERVENTO TIPO 2 - Tav.2/4

SCALA: 1:varie

COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV.

IN0G	00	E	ZZ	WZ	CA0000	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione Esecutiva	M. Simone	Set.2018	M. Bonelli	Set.2018	P.M. La Camera	Set.2018	P.M. La Camera

File: IN0G00EZZWZCA0000002A

n. Elab.: 11.12

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CIG: 8156342821

CUP: J41H07000000001
