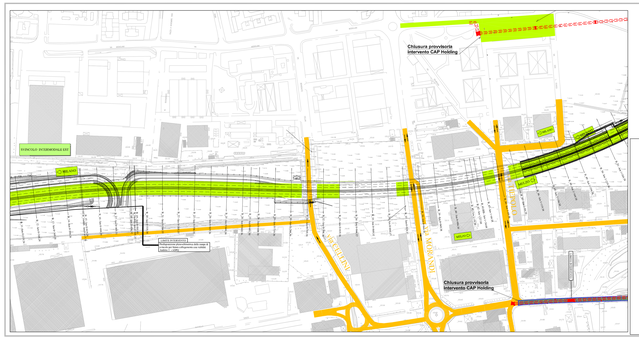

FASE 1 - SOTTOFASE 1A

LAVORI (opere in fase di realizzazione)
Chiusura temporanea di Via Rugacesio e Via Don Sturzo per la realizzazione del collettore CAP Holding.
Realizzazione Collettore Mavi Pipe CAP Holding.
Esecuzione delle tratte del tracciato principale in galleria non interferenti con le viabilità esistenti.

TRAFFICO (viabilità in esercizio nelle fasi di cantiere)
Il traffico è in esercizio sulle viabilità esistente interferita (via Morandi, via Cellini, via Tiepolo).
Vengono mantenuti sugli attuali sedimi gli accessi esistenti alle attività/proprietà esistenti.

VIA CELLINI

VIA MORANDI

VIA TIEPOLO



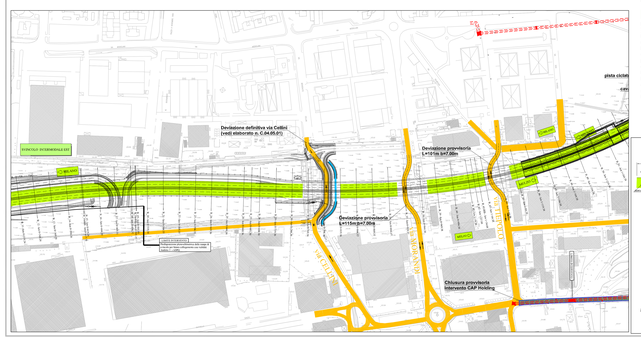

FASE 1 - SOTTOFASE 1B

LAVORI (opere in fase di realizzazione)
Realizzazione Collettore Mavi Pipe CAP Holding.
Esecuzione delle deviazioni stradali provvisorie (via Morandi e Tiepolo) e definitive (via Cellini) posizionate sulle tratte di galleria realizzate.
Esecuzione delle deviazioni provvisorie dei sottoservizi esistenti presenti sotto il sedime delle viabilità interferite (Metroweb cavi fibre ottiche, Telecom cavi interrati, Enel Distribuzione linee elettriche interrate, CAP rete idrica), e definitive (A2A rete gas). Da valutare la possibilità di inserire le deviazioni dalla rete idrica (CAP) e dalle linee elettriche (Enel Distribuzione) all'interno delle travi di copertura della galleria al fine di limitare l'innalzamento del piano viabile interferito.
Esecuzione delle tratte relative al tracciato principale in galleria, a completamento di quanto realizzato nella sottofase precedente.
Esecuzione delle deviazioni definitive dei sottoservizi riportate sul sedime originario della viabilità esistente (Metroweb cavi fibre ottiche, Telecom cavi interrati, Enel Distribuzione linee elettriche interrate, CAP rete idrica) precedentemente posizionate sul tratto di galleria realizzato.
Deviazione definitiva del fosso esistente lungo il lato est della via Cellini.

TRAFFICO (viabilità in esercizio nelle fasi di cantiere)
Il traffico è in esercizio sulle deviazioni provvisorie (via Morandi e Tiepolo) e definitive (via Cellini) realizzate nella presente fase.
Vengono mantenuti sugli attuali sedimi gli accessi esistenti alle attività/proprietà esistenti.

VIA CELLINI

VIA MORANDI

VIA TIEPOLO

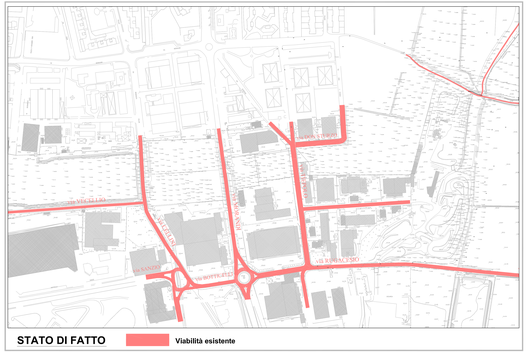

STATO DI FATTO Viabilità esistente

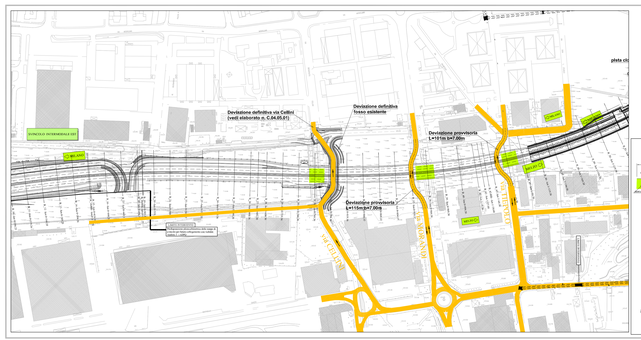

FASE 1 - SOTTOFASE 1C

LAVORI (opere in fase di realizzazione)
Completamento tratti di galleria mancanti.

TRAFFICO (viabilità in esercizio nelle fasi di cantiere)
Il traffico è in esercizio sulle deviazioni provvisorie (via Morandi e Tiepolo) e definitive (via Cellini) realizzate nellaprecedente sottofase.
Vengono mantenuti sugli attuali sedimi gli accessi esistenti alle attività/proprietà esistenti.

VIA CELLINI

VIA MORANDI

VIA TIEPOLO

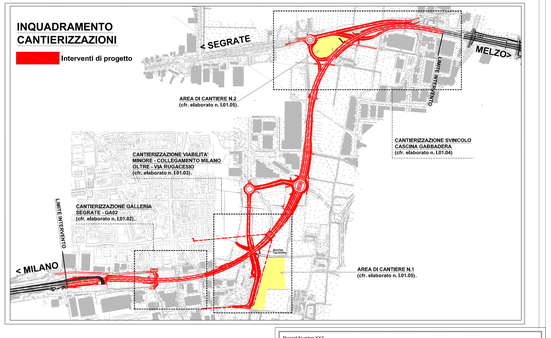

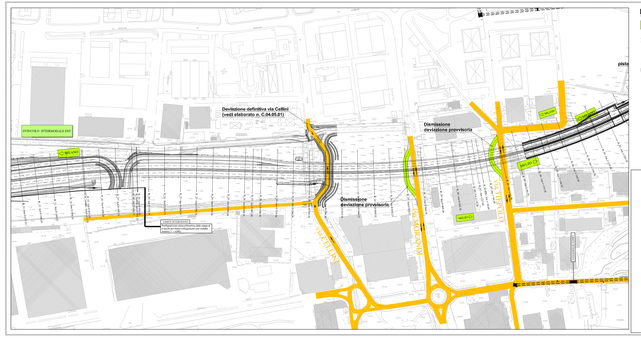

FASE 1 - SOTTOFASE 1D

LAVORI (opere in fase di realizzazione)
Dismissione delle deviazioni provvisorie utilizzate nella fase precedente (via Morandi, via Tiepolo).

TRAFFICO (viabilità in esercizio nelle fasi di cantiere)
Il traffico è in esercizio sulla viabilità esistente interferita (via Tiepolo, via Morandi, via Cellini) ripristinata.
Vengono mantenuti sugli attuali sedimi gli accessi esistenti alle attività/proprietà esistenti.

VIA MORANDI

VIA TIEPOLO

Project Number XXX

Città metropolitana di Milano

Westfield
WESTFIELD MILAN S.p.A.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095)
PRIMO ATTO INTEGRATIVO
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103
"ANTICA DI CASSANO"
1° LOTTO - 2° STRALCIO
TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato: STUDIO DEL PIANO DI CANTIERIZZAZIONE
CANTIERIZZAZIONE
Planimetria fasi costruttive Tav. 1/3

Cod. Elaborato: I.01.02

CODICE WM: WMI-ERR-TB-00-MZ-C-99250

Scala: varie

Redatto	Controllato	Approvato	Data
FCti	VISCHIONI	RINALDI	Maggio 2015

Revisioni	Redatto	Controllato	Approvato	DATA
A	FCti	VISCHIONI	RINALDI	VERIFICA - SETT. 2015
B	LUPPI	VISCHIONI	RINALDI	REV. INT. CAP - LUG. 2015
C	LUPPI	VISCHIONI	RINALDI	OTT. 2015
D				
E				

Progettazione: Consorzio Cemico
Dott. Ing. Marco Vischioni

Visto

Visto

WESTFIELD MILAN S.p.a.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano
