FASE 6

SCALA 1:500

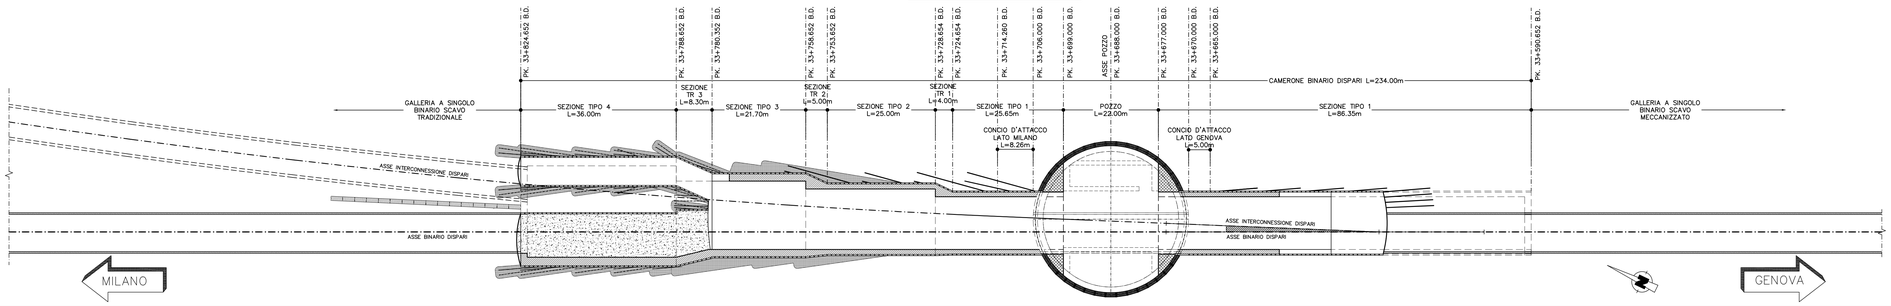

FASE 7

SCALA 1:500

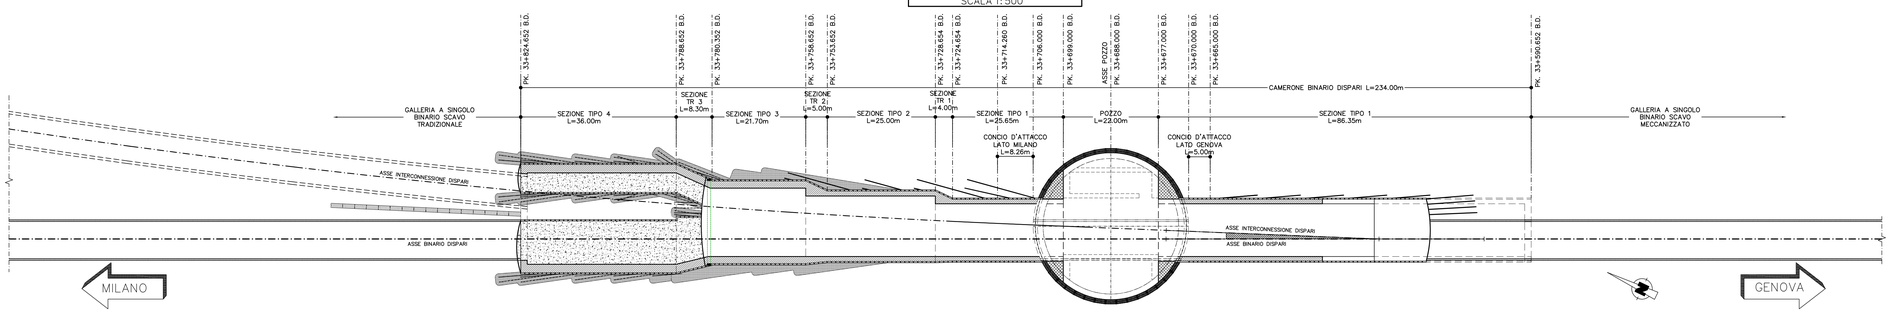

FASE 8

SCALA 1:500

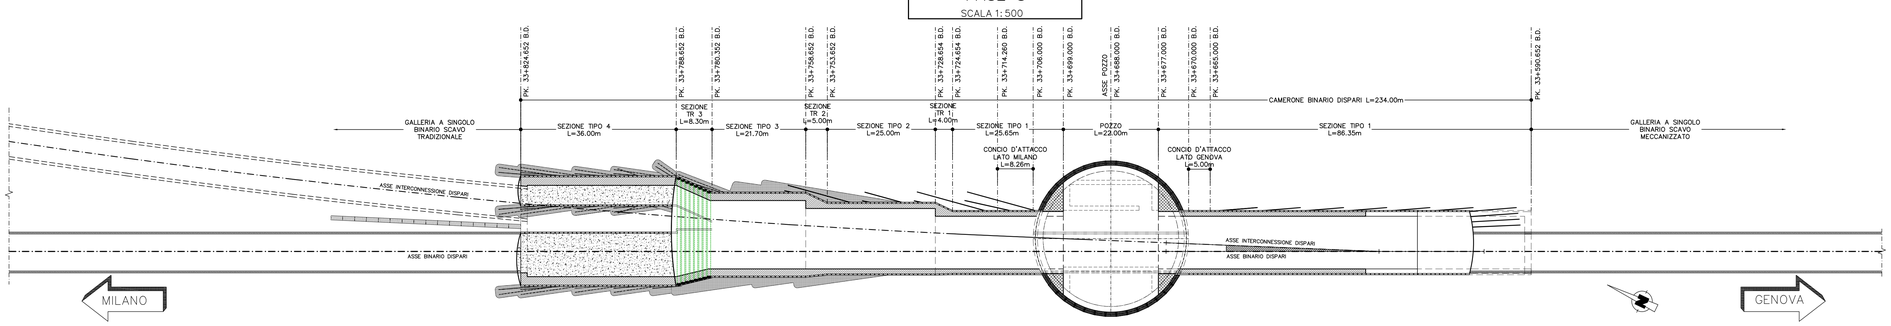

FASE 9

SCALA 1:500

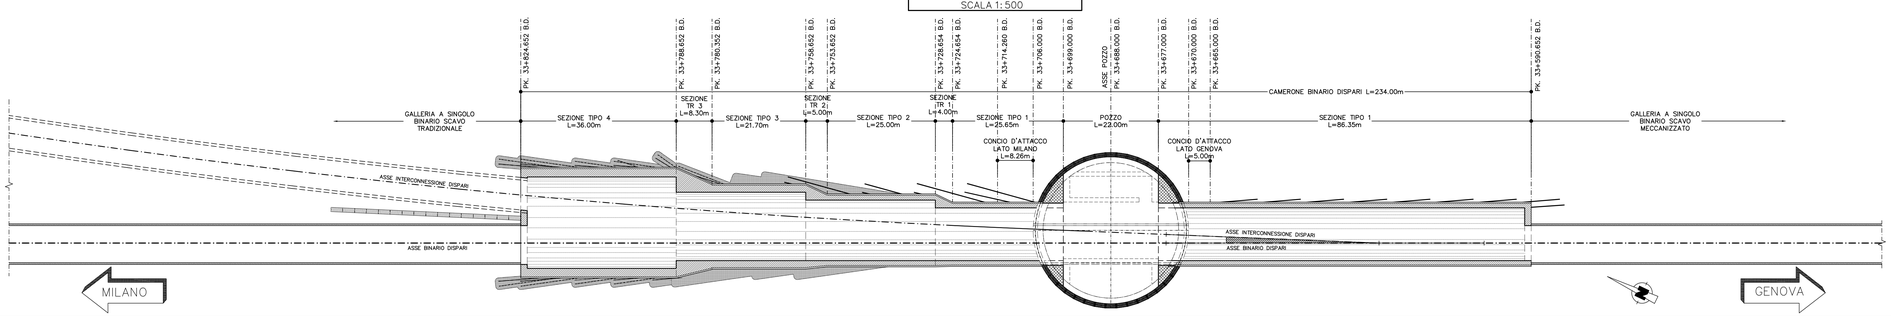

QUADRO "GENERALE" DELLE FASI ESECUTIVE

FASE 6 : AVANZAMENTO PIENA SEZIONE LATO GENOVA E GETTO PIEDRITTI NEI CUNICOLI LATO MILANO

- AVANZAMENTO A PIENA SEZIONE LATO GENOVA MEDIANTE SEZIONE TIPO 1. IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO E DEL FRONTE POTRA' ESSERE PREVISTO IN QUESTA FASE L'AVVICINAMENTO DEI GETTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO
- GETTO DEL PIEDRITTO E RIEMPIMENTO DEL CUNICOLO DEL BINARIO DISPARI MEDIANTE MATERIALE DI SCAVO LATO MILANO.
- SCAVO DELLA SEZIONE DEL CUNICOLO DEL BINARIO INTERCONNESSIONE DISPARI SINO AL TERMINE DELLA SEZIONE TIPO 4

FASE 7 : AVANZAMENTO PIENA SEZIONE LATO GENOVA E SCAVO ALLARGO DI CALOTTA LATO MILANO

- AVANZAMENTO A PIENA SEZIONE LATO GENOVA MEDIANTE SEZIONE TIPO 1. IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO E DEL FRONTE POTRA' ESSERE PREVISTO IN QUESTA FASE L'AVVICINAMENTO DEI GETTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO
- GETTO DEL PIEDRITTO E RIEMPIMENTO DEL CUNICOLO DEL BINARIO INTERCONNESSIONE DISPARI MEDIANTE MATERIALE DI SCAVO LATO MILANO
- ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E AL CONTORNO DELLA CALOTTA DELLA SEZIONE "TR3"
- SCAVO DI ALLARGO DI CALOTTA DELLA SEZIONE TR3 PREVEDNDO IL TAGLIO DELLA CENTINA DI PIEDRITTO E L'IMMEDIATA REALIZZAZIONE DEL CENTINONE DI CALOTTA

FASE 8 : AVANZAMENTO PIENA SEZIONE LATO GENOVA E SCAVO ALLARGO DI CALOTTA LATO MILANO

- AVANZAMENTO A PIENA SEZIONE LATO GENOVA MEDIANTE SEZIONE TIPO 1. IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO E DEL FRONTE POTRA' ESSERE PREVISTO IN QUESTA FASE L'AVVICINAMENTO DEI GETTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO
- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO AL FRONTE E AL CONTORNO DELLA SEZIONE TIPO 4
- SCAVO DI ALLARGO DI CALOTTA DELLA SEZIONE TIPO 4 PREVEDENDO IL TAGLIO DELLA CENTINA DI PIEDRITTO E L'IMMEDIATA REALIZZAZIONE DEL CENTINONE DI CALOTTA. IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO E DEL FRONTE POTRA' ESSERE PREVISTO IN QUESTA FASE L'AVVICINAMENTO DEI GETTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI CALOTTA DELLE SEZIONI DI SCAVO ANTECEDENTI

FASE 9 : COMPLETAMENTO SCAVI E GETTI LATO GENOVA E LATO MILANO

- COMPLETAMENTO SCAVI E GETTI DELLA SEZIONE TIPO 1 LATO GENOVA
- COMPLETAMENTO GETTI DI CALOTTA SEZIONE TIPO 4 LATO MILANO
- ESECUZIONE DEGLI SCAVI DI RIBASSO SEZIONE TIPO TR3 E TIPO 4 LATO MILANO PER CAMPI MAX 24M
- GETTO DELL'ARCO ROVESCIO IN C.A. DELLE SEZIONI TR3 E TIPO 4 LATO MILANO PER CAMPI MAX 12M SINO AL COMPLETAMENTO DELL'OPERA

NOTE

NOTA 1: APPLICAZIONE DEL PRE-SPRITZ AL FRONTE E CONTORNO DURANTE LA FASE DI SCAVO – FUNZIONE E SUA APPLICAZIONE

AL TERMINE DELLO SCAVO E PRIMA DI PORRE IN OPERA GLI INTERVENTI DI PRIMA FASE DOVRA' ESSERE ESEGUITO UN ACCURATO DISCAGGIO DI TUTTE LE PORZIONI INSTABILI E SI DOVRA' PROCEDERE ALLA POSA IN OPERA DELLO SPRITZ BETON DI PROTEZIONE FIBRORINFORZATO SULLE SUPERFICI FRESCHE DI SCAVO (FRONTE E CONTORNO DEL CAVO).
L'APPLICAZIONE DELLO SPRITZ BETON FIBRORINFORZATO DI PROTEZIONE AD OGNI SFONDO E' DEPUTATO A SVOLGERE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL FRONTE E DEL CONTORNO DALL' UMIDITA' DELL' ARIA E DI TRATTENUTA DEL MATERIALE MINUTO (NON HA FUNZIONE STRUTTURALE E QUINDI NON E' DIMENSIONABILE LO SPESSORE).
L'APPLICAZIONE DELLO STRATO DI PRE-SPRITZ E' DA PORSI A CARICO DELL' IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.
IL PRE-SPRITZ, OVE POSSIBILE, POTRA' ESSERE INGLOBATO E FAR PARTE INTEGRANTE DEL PRERIVESTIMENTO PROGETTUALE.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

GNVA - Camerone Intercon. BD Da PK 33+471.63 a PK 33+823.63 - Tratto 0

Fasi esecutive - TAV 2

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing. N. Meistro		1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IG51	04	E	CV	B8	GNVA0X	002	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	COCIV	25/07/2019	COCIV	25/07/2019	A. Mancarella	25/07/2019	Dott. Ing. Nicola Meistro Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6211 R

n. Elab.

Nome File: IG51-04-E-CV-B8-GNVA-0X-002-A00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: 1

DATA: 22.07.15 | RED: EST | NOME FILE: 14.395.307 | FATT. PLOT: 1:1
