FASE 1
SCALA 1:200

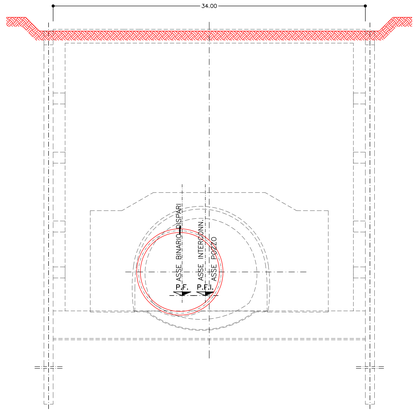

FASE 2
SCALA 1:200

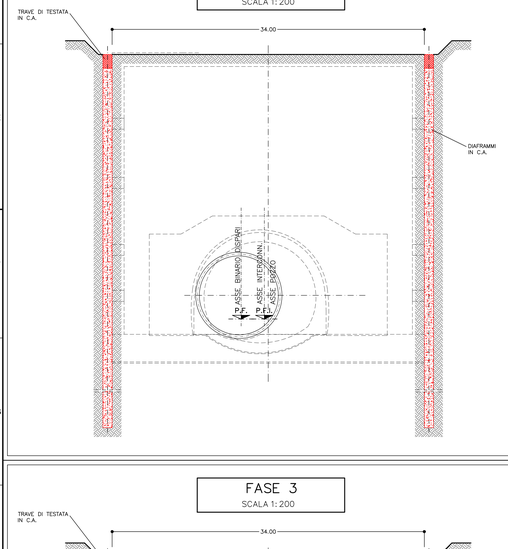

FASE 3
SCALA 1:200

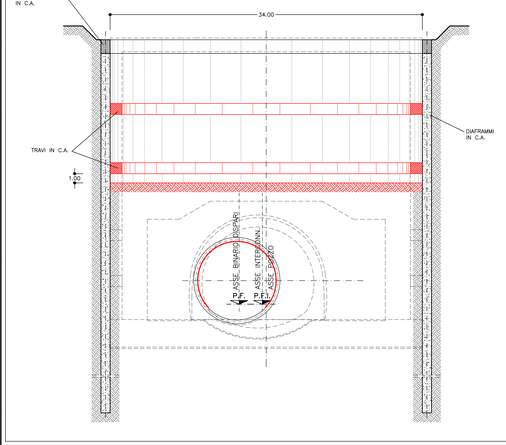

FASE 4
SCALA 1:200

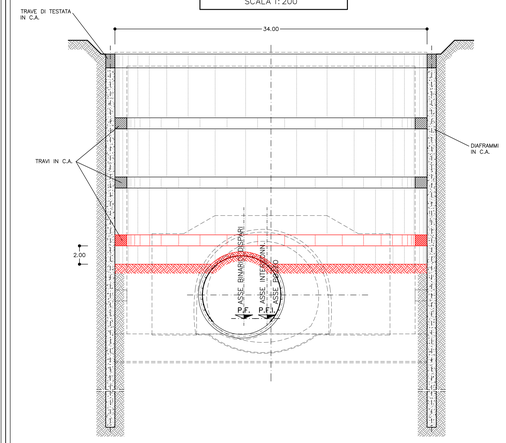

FASE 5
SCALA 1:200

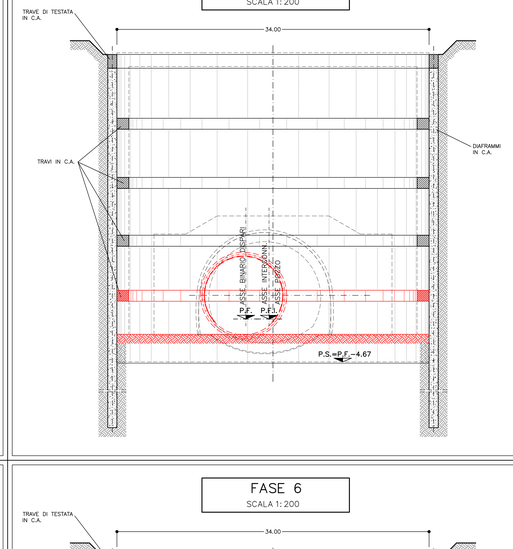

FASE 6
SCALA 1:200

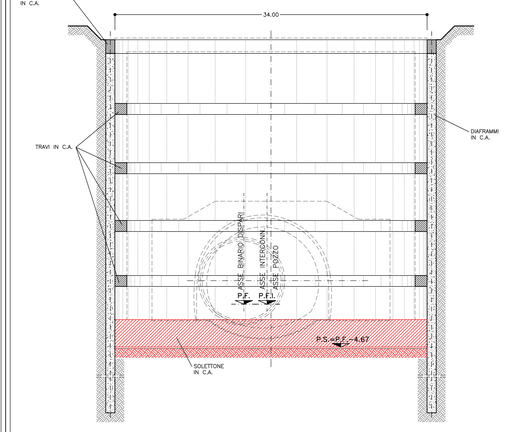

FASE 7
SCALA 1:200

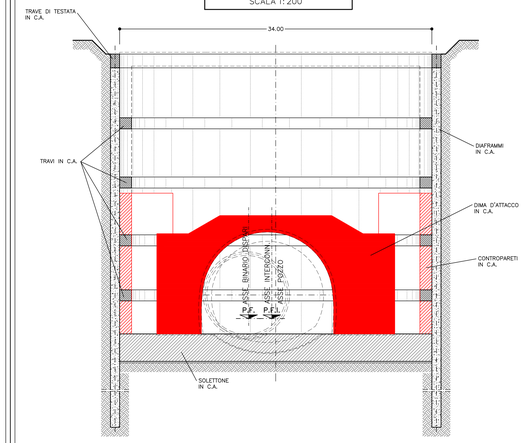

FASE 8
SCALA 1:200

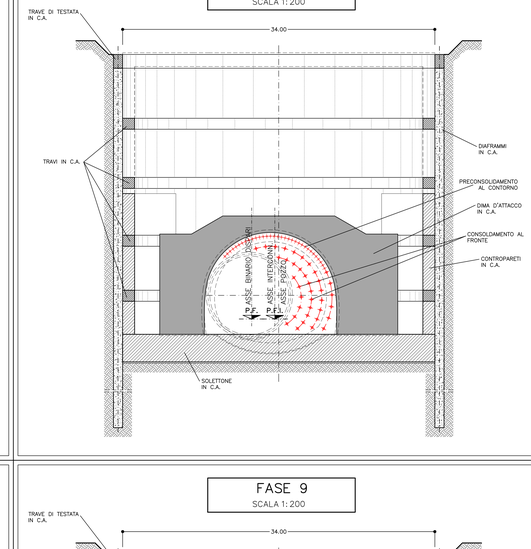

FASE 9
SCALA 1:200

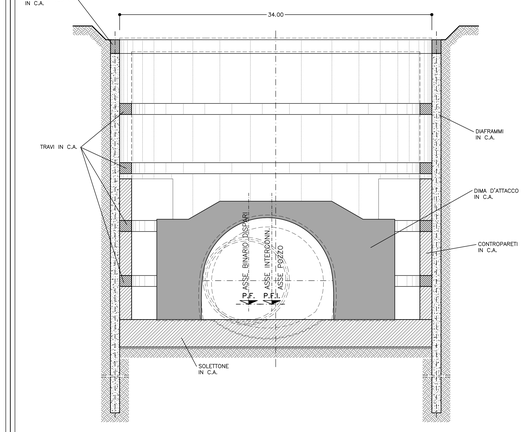

FASE 10
SCALA 1:200

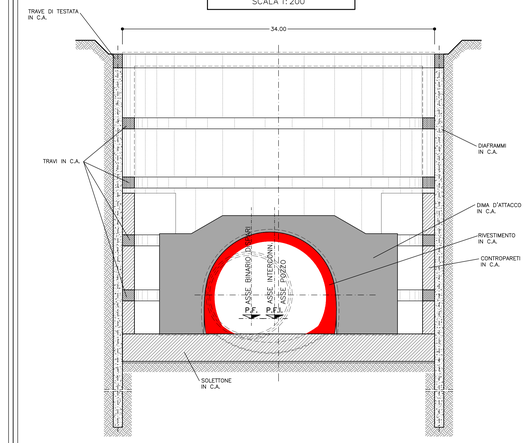

FASE 11
SCALA 1:200

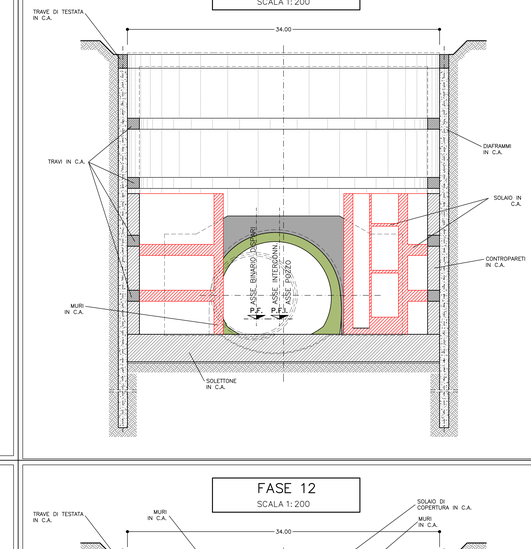

FASE 12
SCALA 1:200

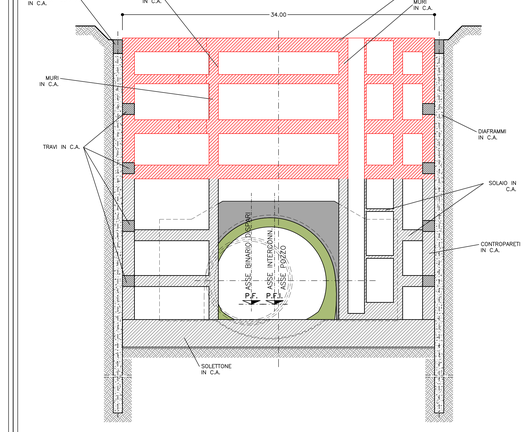

QUADRO GENERALE DELLE FASI ESECUTIVE

FASE 1 :
- ESECUZIONE SCAVO A QUOTA PIANO DI TESTA DIAFRAMMI
- REALIZZAZIONE DIAFRAMMI INTERFERENTI CON IL FUTURO PASSAGGIO DELLA FRESA
- PASSAGGIO FRESA A PIENO

FASE 2 :
- COMPLETAMENTO DIAFRAMMI E RELATIVA TRAVE DI TESTATA

FASE 3 :
- SCAVO DI RIBASSO FINO ALLA QUOTA IDONEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE AD ANELLO IN C.A. N°1
- PROSECUZIONE DELLO SCAVO DI RIBASSO E REALIZZAZIONE DELLA TRAVE AD ANELLO IN C.A. N°2 CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA.
- REALIZZAZIONE BLINDAGGIO CONCI FRESA NELLA ZONA D'INTERFERENZA CON IL POZZO

FASE 4 :
- SCAVO DI RIBASSO FINO ALLA QUOTA IDONEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE AD ANELLO IN C.A. N°3

FASE 5 :
- SCAVO DI RIBASSO FINO ALLA QUOTA INTRADOSSO SOLETTONE DI FONDO
- DEMOLIZIONE CONCI E BLINDAGGIO FRESA
- REALIZZAZIONE DELLA TRAVE AD ANELLO IN C.A. N°4

FASE 6 :
- PROSECUZIONE SCAVO CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO DI SCAVO FINALE.
- REALIZZAZIONE DEL MAGRONE DI PULIZIA
- POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
- REALIZZAZIONE SOLETTONE DI FONDO IN C.A.

FASE 7 :
- ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLA DIMA IN C.A. LATO MILANO
- ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLA DIMA IN C.A. LATO GENOVA
- ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLE CONTROPARETI FINO ALL'INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO

FASE 8 :
- DEMOLIZIONE DELLE TRAVI SOTTO LA DIMA INTERFERENTI CON IL FRONTE DI SCAVO LATO MILANO
- ESECUZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CONCIO D'ATTACCO LATO MILANO
- DEMOLIZIONE DELLE TRAVI SOTTO LA DIMA INTERFERENTI CON IL FRONTE DI SCAVO LATO GENOVA
- ESECUZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CONCIO D'ATTACCO LATO GENOVA

FASE 9 :
- SCAVO A PIENA SEZIONE CONCIO D'ATTACCO (LATO MILANO)

FASE 10 :
- GETTO DEL CONCIO D'ATTACCO (LATO MILANO)
- SCAVO A PIENA SEZIONE CONCIO D'ATTACCO (LATO GENOVA)

FASE 11 :
- GETTO DEL CONCIO D'ATTACCO (LATO GENOVA)
- REALIZZAZIONE DEI SOLAI INTERMEDI ALLE QUOTE STABILITE

FASE 12 :
- COMPLETAMENTO DI CONTROPARETI E SOLETTE SECONDO PRESCRIZIONI DI PROGETTO

NOTA BENE

IN CASO DI ANOMALIE GEOMETRICHE NELLA COMPENETRAZIONE DEI DIAFRAMMI A CAUSA DI ERRORI DI VERTICALITA', POTRANNO ESSERE ANTICIPATI I GETTI DELLE CONTROPARETI IN FASE DI SCAVO

LEGENDA

P.F. = PIANO DEL FERRO LINEA A.V./A.C.
P.F.I. = PIANO DEL FERRO INTERCONNESSIONE
P.S. = PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Cociv – Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

GNVA - Camerone Intercon. BD Da PK 33+471.63 a PK 33+823.63 - Tratto 0

Pozzo di accesso

Fasi esecutive

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv – Ing. N. Maiello		1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 4	E	C V	B 9	G N V A 0 X	0 0 3	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	COCIV	25/07/2019	COCIV	25/07/2019	A. Mancarella	25/07/2019	Dott. Ing. Nicola Maiello Ordine Ingegneri Prov. TO n. 10717R

n. Elab.

Nome File: IG51-04-E-CV-B9-GNVA-04-003-A00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:1

PLOT DATE: 1:4.1:2.1:6
REG. DWG
NOME FILE: B52760.0
PLOT: 111
PLOT STYLE TABLE: FAT
