STATO ATTUALE

FASE 1

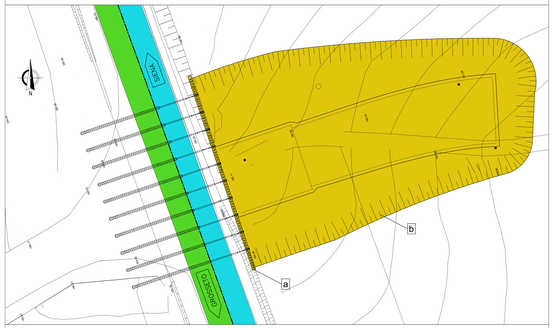

SEZIONE LONGITUDINALE



FASE 2

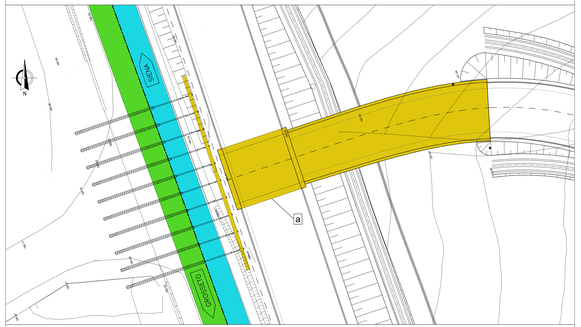

SEZIONE LONGITUDINALE



FASE-1

a) REALIZZAZIONE PARATIA
b) SCAVO FINO A Q.TA INTRADOSSO MAGRONE

FASE-2

a) REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI PRIMA FASE

FASE-3

a) DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA NUOVA CARREGGIATA
b) REALIZZAZIONE PARATIA DI SECONDA FASE
c) SCAVO FINO A Q.TA INTRADOSSO MAGRONE

FASE-4

a) REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI SECONDA FASE

FASE-5

a) OPERA FINITA

LEGENDA

- AREA DI CANTIERE
- CIRCOLAZIONE VEICOLARE DIREZIONE NORD
- CIRCOLAZIONE VEICOLARE DIREZIONE SUD

FASE 3

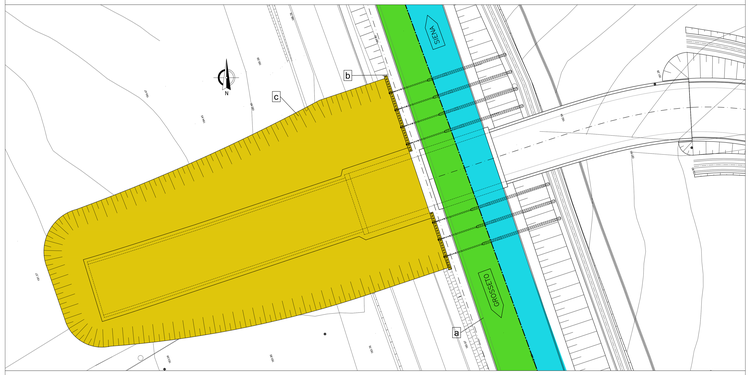

SEZIONE LONGITUDINALE



FASE 4

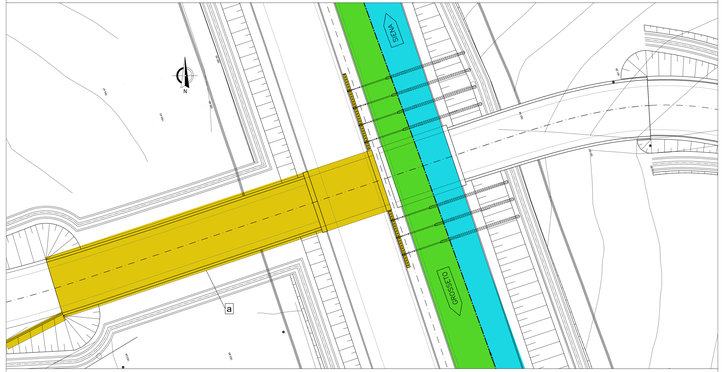

SEZIONE LONGITUDINALE



FASE 5

SEZIONE LONGITUDINALE



KEYPLAN



anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO

ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO ESECUTIVO

COD. FI15

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Luca Rossi
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 615

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Luca Tiziano Durastanti
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Torino n° 4864

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Sergio Campagnin
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL R.U.P.:
Arch. Ing.
Raffaele Franco Carso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 1077

IL CONTRAENTE GENERALE:
SINTAGMA
Dott. Ing. G.Calvanese - Dott. Ing. G.Rossini - Dott. Ing. G.Tiziano - Dott. Ing. G.Ferrara - Dott. Ing. G.Cavallaro - Dott. Ing. G.Cascone - Dott. Ing. G.Carnevale - Dott. Ing. G.Pizzuto - Dott. Ing. G.Ciancarelli - Dott. Ing. G.Pellegrino - Dott. Ing. G.Cipriano - Dott. Ing. G.Pizzuto - Dott. Ing. G.Cocozza - Dott. Ing. G.Rizzo - Dott. Ing. G.Colella - Dott. Ing. G.Carnevale - Dott. Ing. G.Rizzo - Dott. Ing. G.Colonna
