CRONOPROGRAMMA COMPLETAMENTO OPERE
Linea: Bari - Taranto / Tratta: Bari S.Andrea - Bitetto
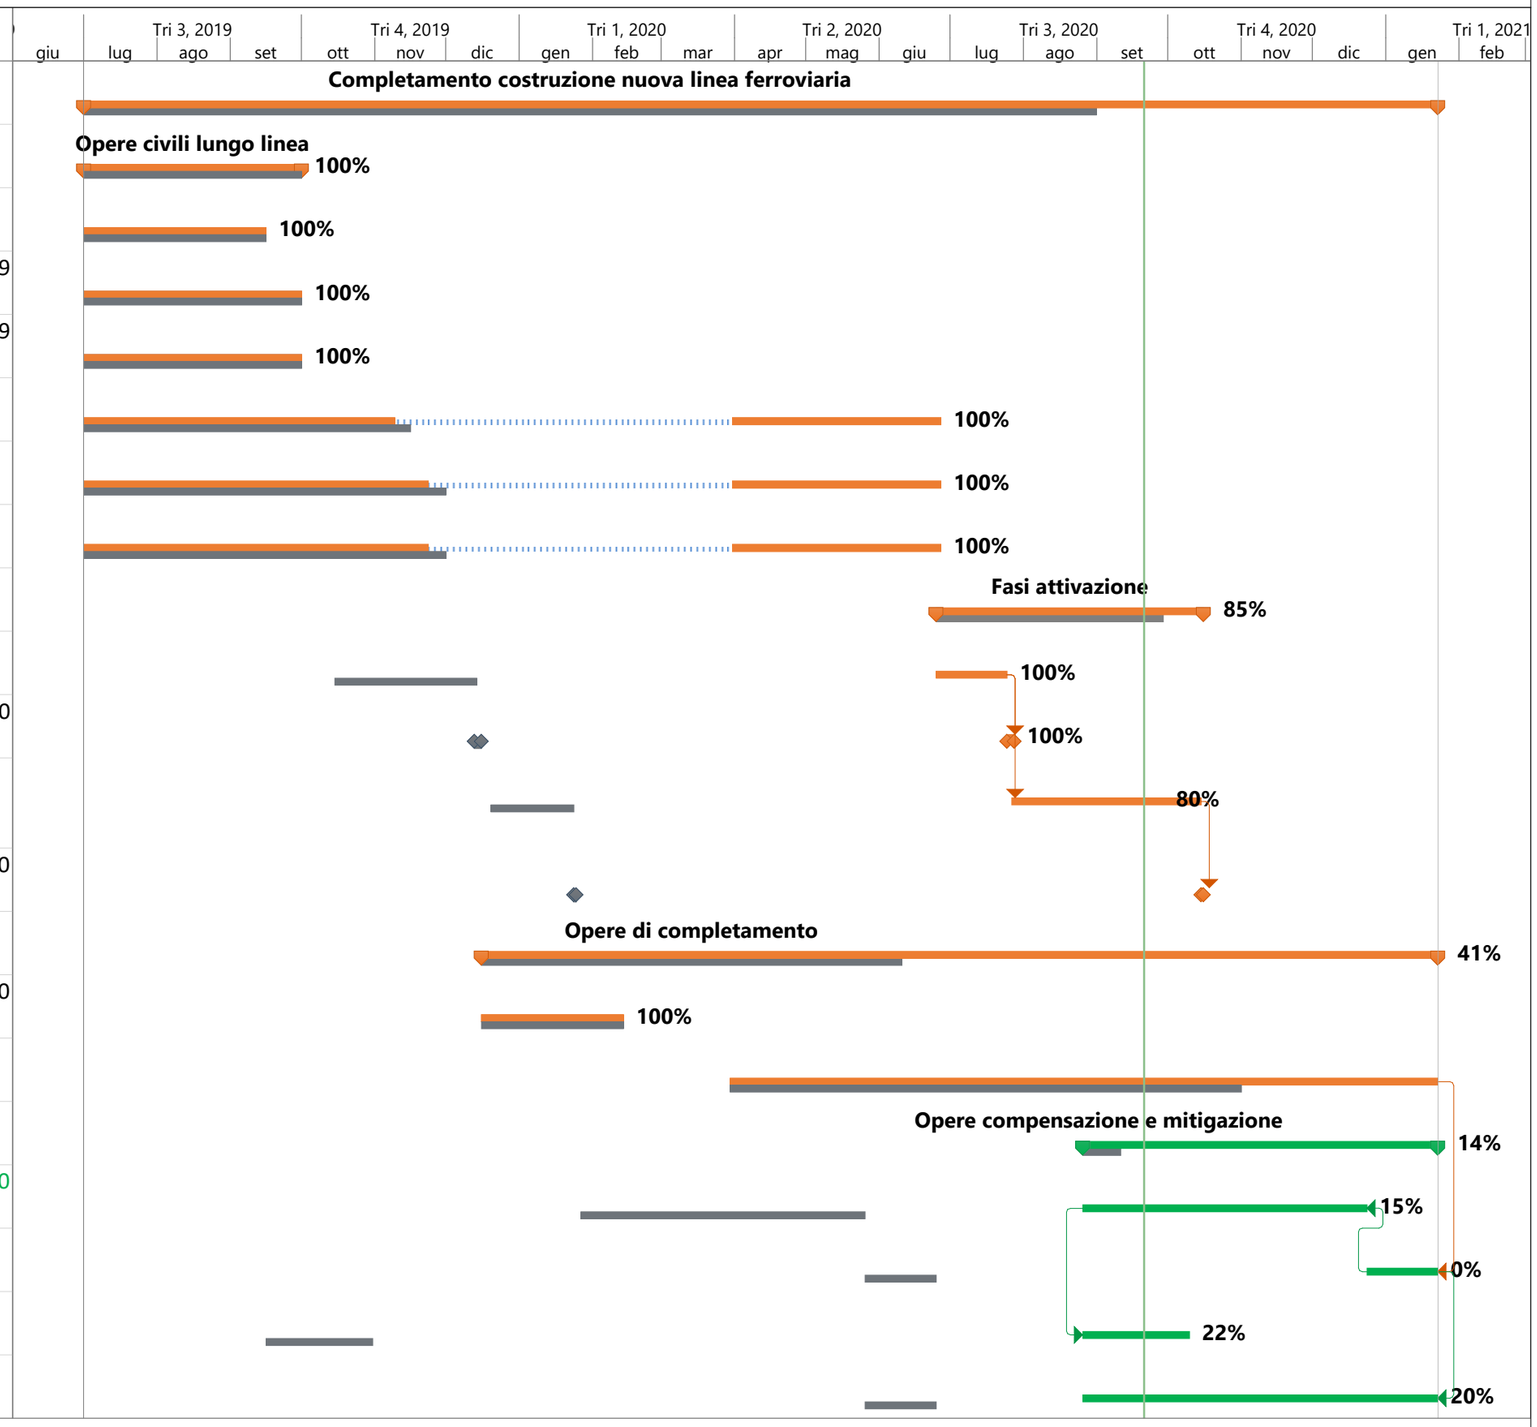
ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	***Completamento costruzione nuova linea ferroviaria***	***572 g***	***lun 01/07/19***	***ven 22/01/21***
2	**Opere civili lungo linea**	**92 g**	**lun 01/07/19**	**lun 30/09/19**
3	Lungo linea	77 g	lun 01/07/19	dom 15/09/19
4	Fermata Villaggio Lavoratori	92 g	lun 01/07/19	lun 30/09/19
5	Fermata Modugno	92 g	lun 01/07/19	lun 30/09/19
6	**Armamento**	**219 g**	**lun 01/07/19**	**ven 26/06/20**
7	**Trazione Elettrica**	**233,35 g**	**lun 01/07/19**	**ven 26/06/20**
8	**Segnalamento e TLC**	**233,35 g**	**lun 01/07/19**	**ven 26/06/20**
9	**Fasi attivazione**	**113 g**	**gio 25/06/20**	**gio 15/10/20**
10	Attività propedeutiche all'attivazione del I e II binario	30 g	gio 25/06/20	ven 24/07/20
11	ATTIVAZIONE (I e II binario)	3 g	sab 25/07/20	lun 27/07/20
12	Attività propedeutiche all'attivazione del III binario (Interruzione III binario; circolazionesu I e II binario)	80 g	lun 27/07/20	mer 14/10/20
13	ATTIVAZIONE (III binario)	1 g	gio 15/10/20	gio 15/10/20
14	**Opere di completamento**	**404 g**	**lun 16/12/19**	**ven 22/01/21**
15	Opere civili fuori linea	60 g	lun 16/12/19	gio 13/02/20
16	Completamento Opere Civili fuori linea	215 g	lun 30/03/20	ven 22/01/21
17	**Opere compensazione e mitigazione**	**150 g**	**mer 26/08/20**	**ven 22/01/21**
18	IA01-IA12 opere di inserimento ambientale	120 g	mer 26/08/20	gio 24/12/20
19	IA13 opere a verde tratte da dismettere	30 g	gio 24/12/20	ven 22/01/21
20	IA14 rinverdimento scarpate	45 g	mer 26/08/20	ven 09/10/20
21	IA15 demolizione linea non attiva	150 g	mer 26/08/20	ven 22/01/21
