ALL.10)

CENTRALE DI TRINO - CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA UNITA' A GAS (TO3)

Il programma cronologico include una prima fase di realizzazione del ciclo aperto (OCGT), a cui segue la costruzione della caldaia a recupero e della turbina a vapore (CCGT).
L'intervallo di tempo compreso tra il ciclo aperto e l'avvio del ciclo combinato è stato assunto pari a 24 mesi.
E' anche inserita una fase iniziale di early works, sfruttandone la sinergia con il consequenziale cantiere di realizzazione nuova unità.
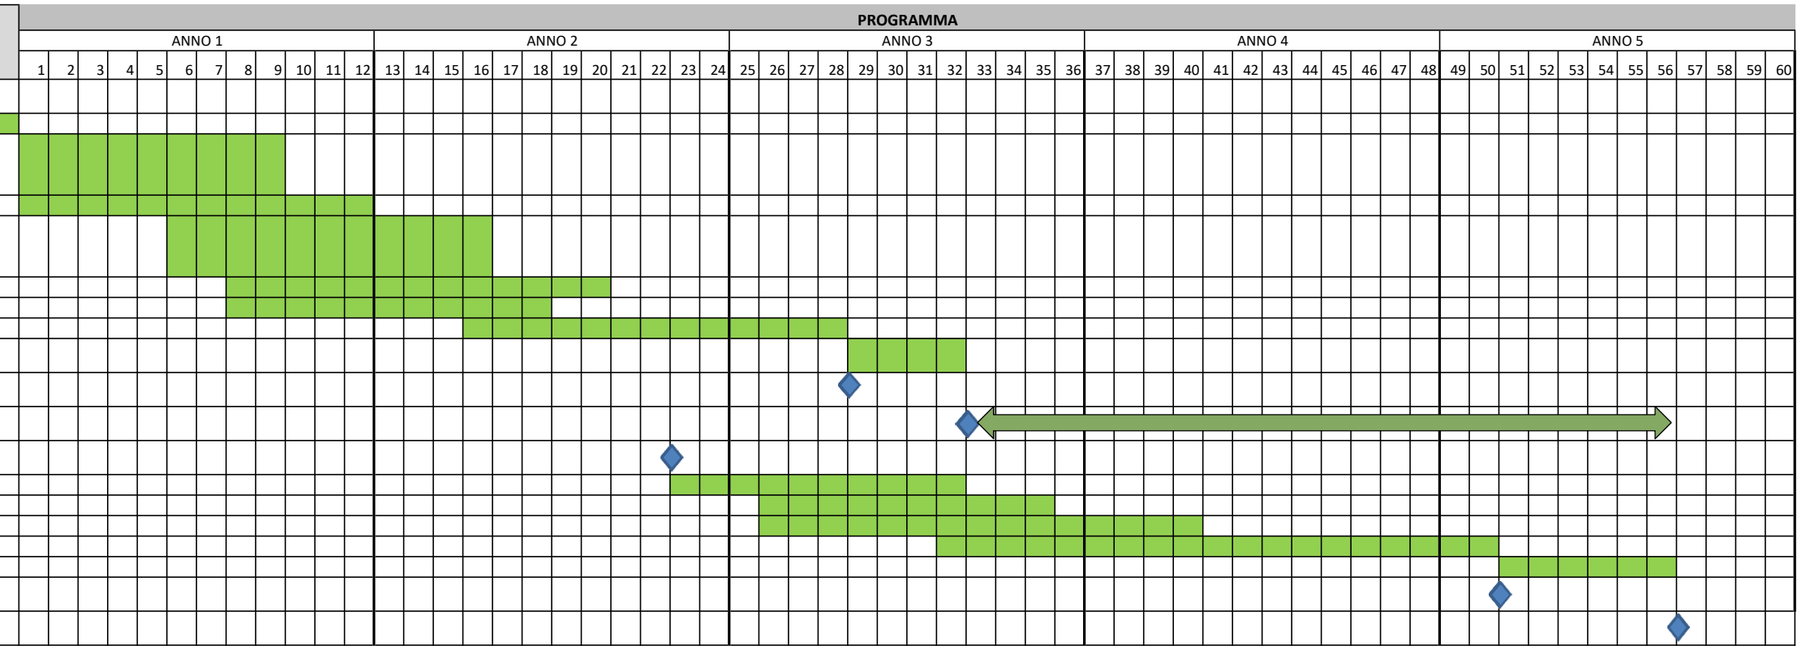
	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE PRELIMINARE GRUPPO OCGT / CCGT	ANNO MESE
1	Rilascio Autorizzazione Unica a Costruire	
2	Aggiudicazione gara Fornitori	≤ 6 mesi
3	Early Works (demolizioni sottofondazioni ove necessario, sistemazione aree, alimentazioni di cantiere, infrastrutture di cantiere, ripristini opere di presa e scarico)	
4	Ingegneria delle Forniture e dei Servizi	
5	Apertura cantiere per costruzione nuova unità, rilocazioni/salvaguardie, demolizioni (ove necessario), scavi e completamento rilevato di terreno	
6	Opere Civili	
7	Resa in Cantiere equipment principali OCGT	
8	Montaggio OCGT	
9	Avviamento / Prove OCGT	
10	Messa in esercizio OCGT	
11	Messa a regime e funzionamento OCGT	
12	Attivazione progetto fase CCGT	
13	Ingegneria delle Forniture e dei Servizi per chiusura CCGT	
14	Opere civili per CCGT	
15	Resa in Cantiere equipment principali CCGT	
16	Montaggio CCGT	
17	Avviamento / Prove CCGT	
18	Messa in esercizio CCGT	
19	Messa a regime CCGT
