ID		Modalità attività	Nome attività	Durata
1			Sblocco Commessa	1 g
2			**Progettazione esecutiva**	**410 g**
3			KOM progetto	14 g
4			Progettazione main components & layout	42 g
5			Progettazione Civile	189 g
6			Progettazione Meccanica	140 g
7			Progettazione elettrica	154 g
8			Sottoscrizione contratti per acquisto componenti	1 g
9			**Procurement**	**174 g**
10			Approvvigionamento componenti strutturali	132 g
11			Approvvigionamento macchine di generazione	132 g
12			Approvvigionamento componenti e sistemi meccanici	132 g
13			Approvvigionamento componenti e sistemi elettrici	174 g
14			attività di monitoraggio ante operam	15 g
15			**Attività di cantiere**	**206 g**
16			Inizio lavori	0 g
17			Lavori preparatori sistemazione sito	10 g
18			Lavori civili	45 g
19			Consegna dei main components	63 g
20			Assemblaggio strutture in acciaio	98 g
21			Montaggi meccanici ed elettrostrumentali	98 g
22			**Commissioning**	**155 g**
23			Collaudi	56 g
24			Prove Terna	55 g
25			Entrata in esercizio	1 g

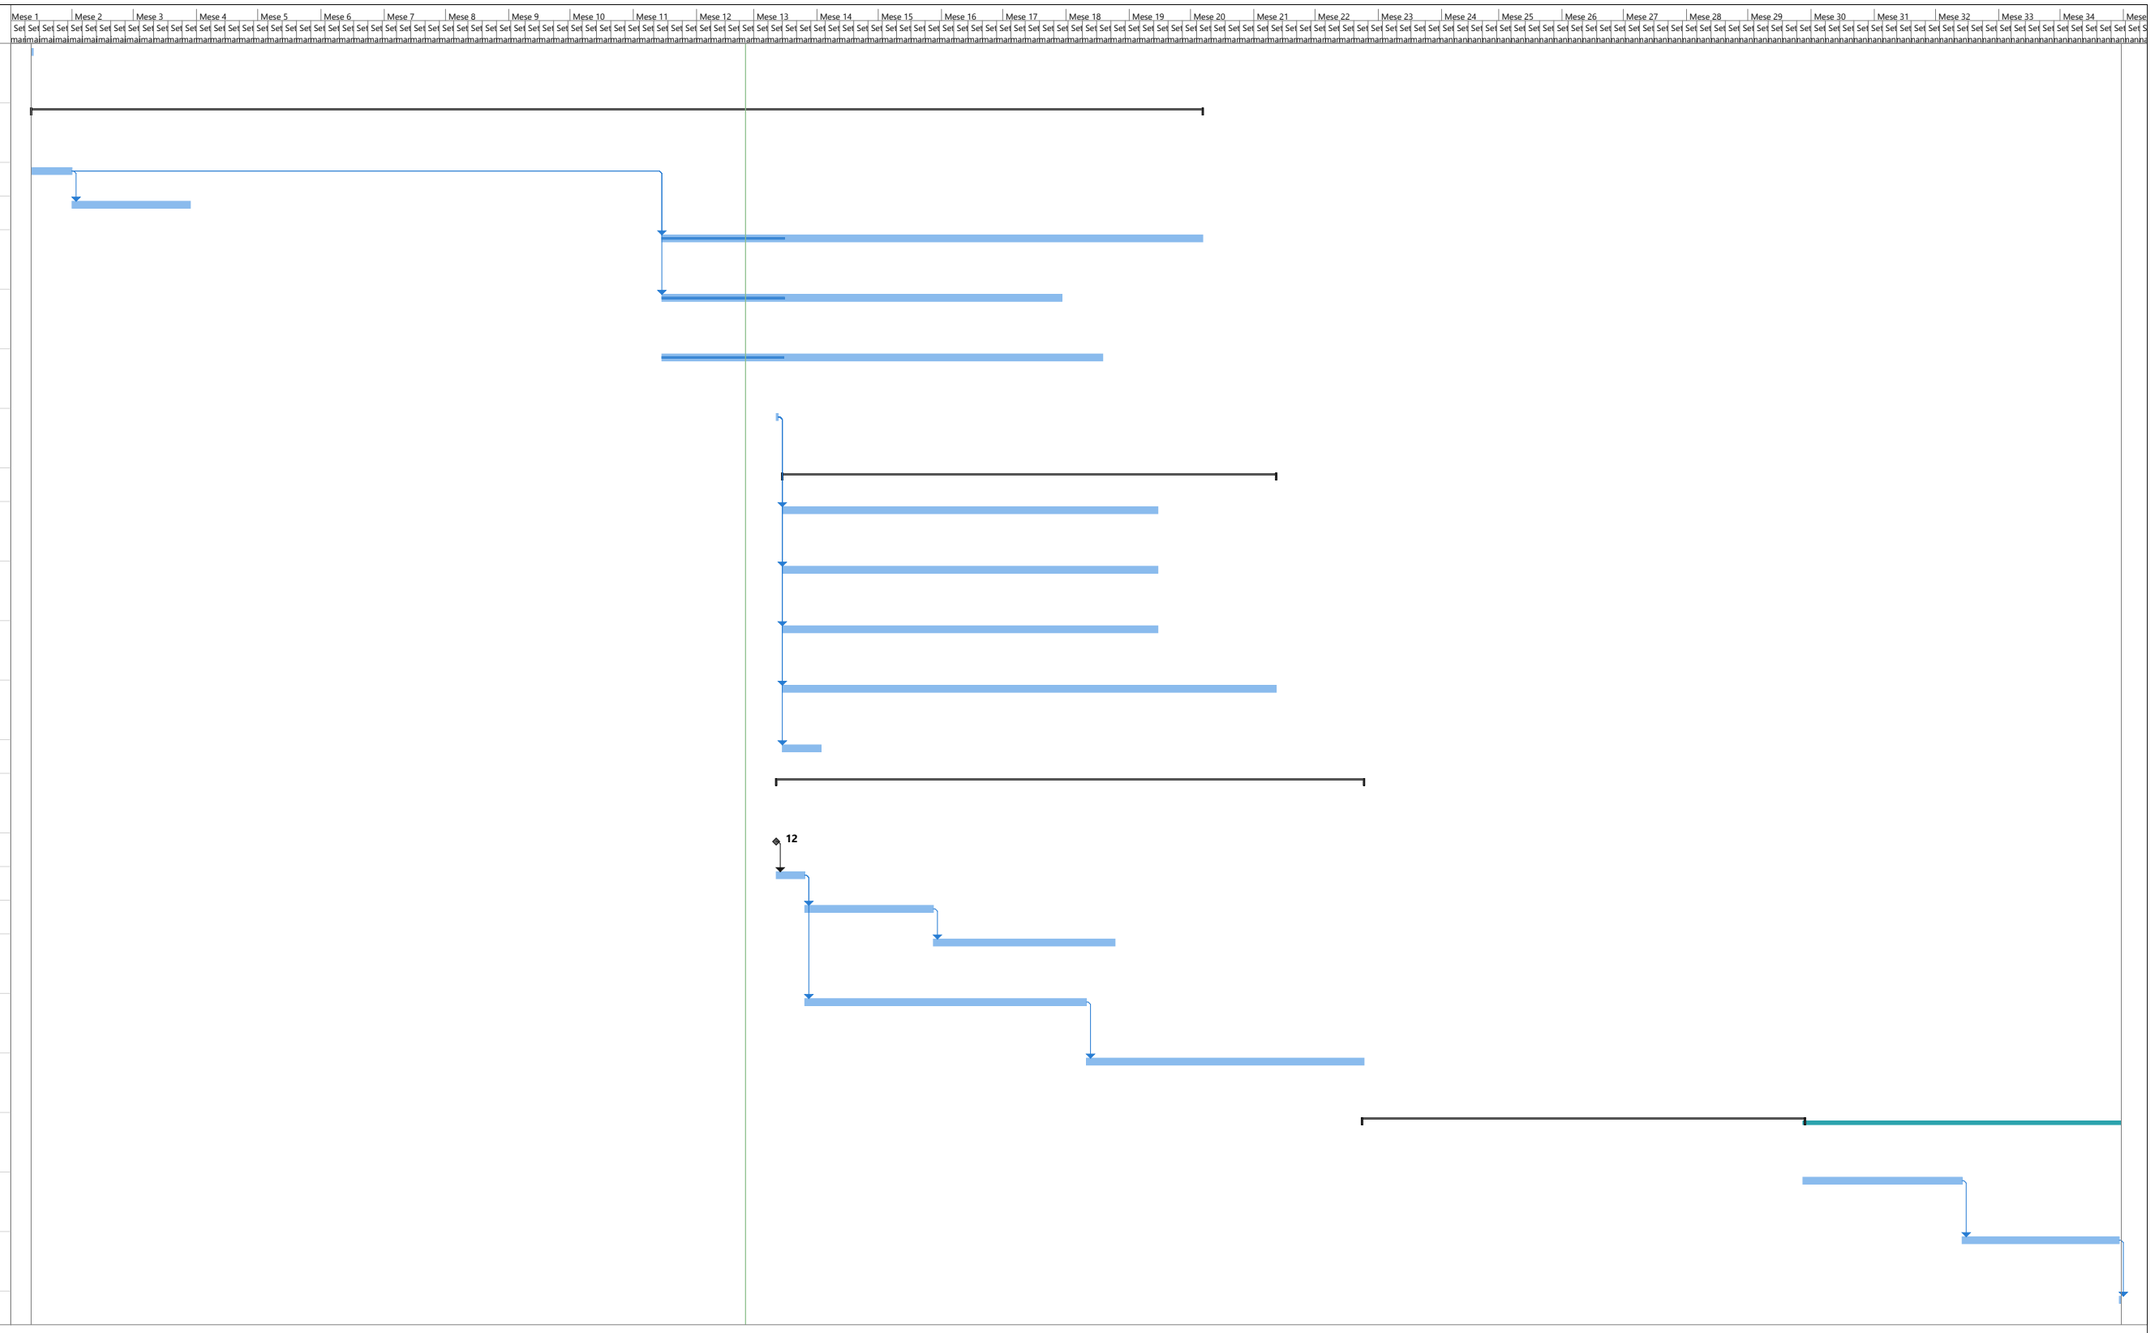

Progetto: Melfi_Cronoprogram
Data: gio 25/02/21

Attività · Divisione · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività inattiva · Cardine inattiva · Riepilogo inattiva · Attività manuale · Solo-durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo-fine · Attività esterne · Cardine esterno · Scadenza · Avanzamento · Avanzamento manuale
