Centrale di San Filippo del Mela

SFP-TPG-000059-02-00

Cronoprogramma piano di dismissione

ID	Nome attività	Durata
1	**Messa in servizio nuovo impianto CCGT**	0 g
2	**Messa in sicurezza impianti**	**326 g**
3	Panconatura opera di presa unità 1-2	44 g
4	Allontanamento residui di processo (gasolio, OCD, ceneri e gesso) unità 1-2 e 5-6	131 g
5	Svuotamento ed allontanamento oli presenti nelle apparecchiature	44 g
6	Svuotamento e bonifica caldaie, apparecchiature e tubazioni	44 g
7	Estrazione ceneri e lavaggio caldaie e precipitatori elettrostatici	88 g
8	Bonifica serbatoi prodotti chimici di processo	64 g
9	**Bonifica e rimozione completa sistema OCD (Area2)**	
10	Bonifica gas free serbatoio gasolio S4 e S20, OCD S5, S18, S19 e relative stazioni di pompaggio	348 g
11	Demolizione serbatoio gasolio S4 e S20, OCD S5, S18, S19 e relative stazioni di pompaggio	370 g
12	**Demolizione apparecchiature relative alle unità 5-6 (Aree 3, 4 e 5)**	
13	Demolizione ciminiera in c.a.	261 g
14	Scoibentazione impianti desolforazione	284 g
15	Demolizione impianti desolforazione (escluso capannone stoccaggio gesso)	411 g
16	Scoibentazione caldaie, denox e precipitatori elettrostatici	499 g
17	Demolizione caldaie, denox e precipitatori elettrostatici	523 g
18	Demolizione edifici servizi ausiliari, compressori aria e stoccaggio ammoniaca	195 g
19	Rimozione serbatoi prodotti chimici di processo	1109 g
20	**Demolizione apparecchiature relative alle unità 1-2 (Aree 6 e 7)**	**1413 g**
21	Demolizione ciminiera in c.a.	195 g
22	Soibentazione impianti desolforazione	262 g
23	Demolizione impianti desolforazione (escluso capannone di stoccaggio gesso)	173 g
24	Scoibentazione caldaie, denox e precipitatori elettrostatici	478 g
25	Demolizione caldaie, denox e precipitatori elettrostatici e servizi ausiliari	413 g
26	Rimozione serbatoi prodotti chimici di processo	870 g
27	Rimozione serbatoio OCD S1 (se non valorizzato)	65 g

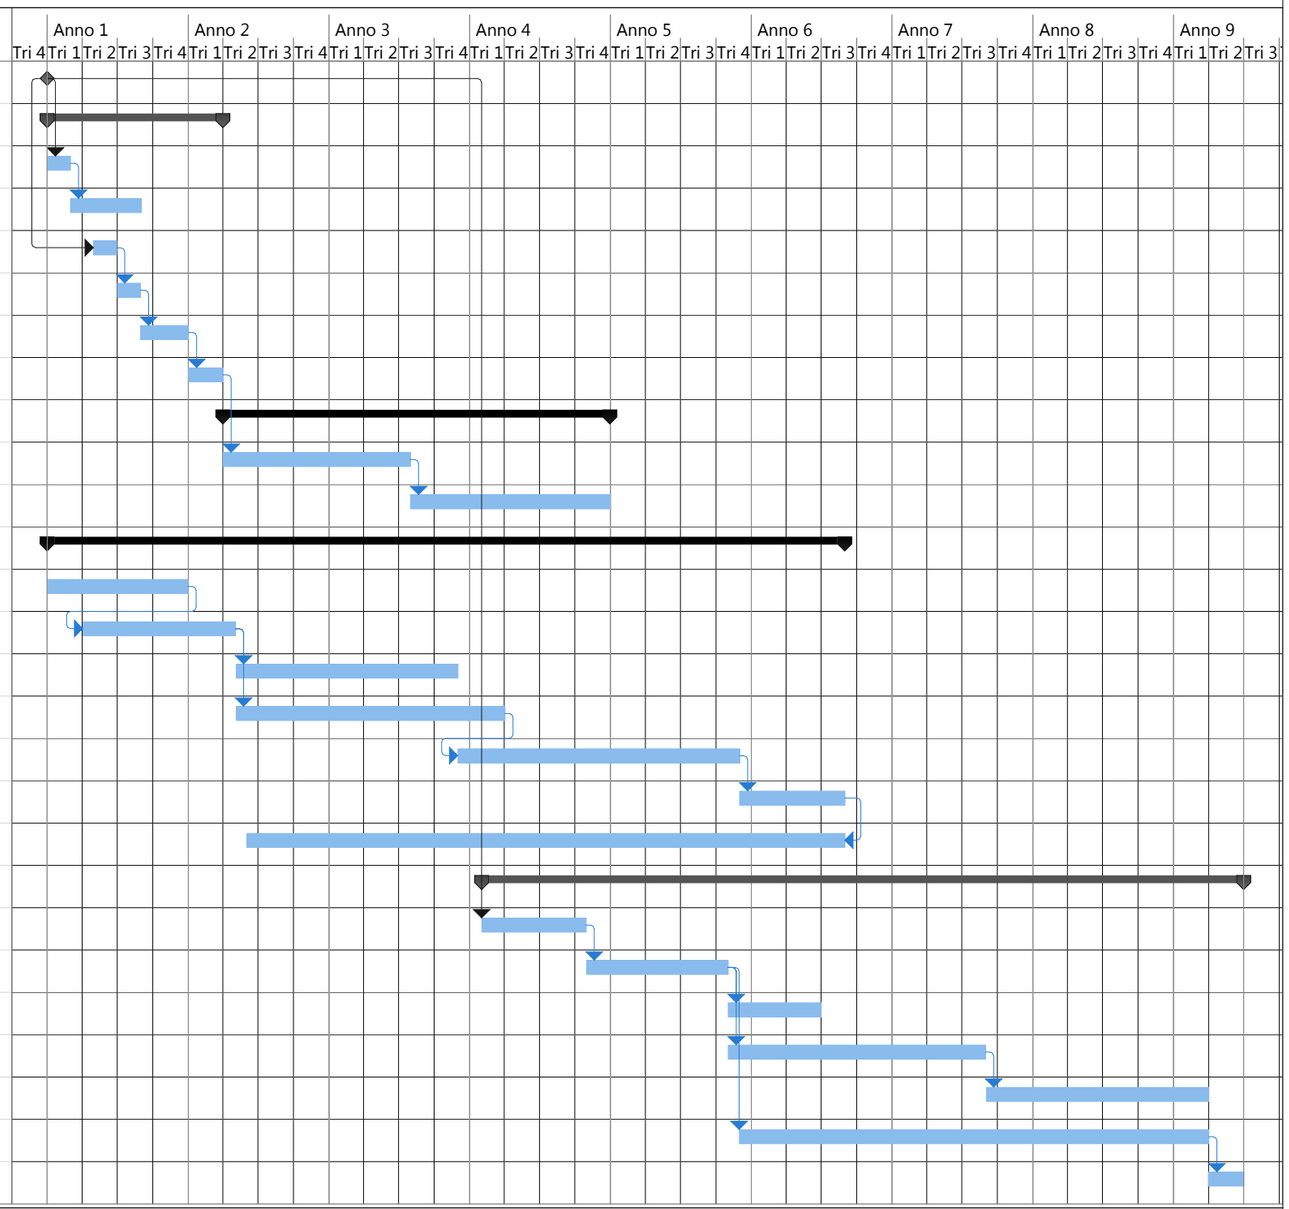

SFP-TPG-000059-CCGT-02-00_Cronoprogramma piano di dismissione

Data: mar 29/06/21

Attività	Attività inattiva	Riporto riepilogo manuale	Cardine esterno
Divisione	Cardine inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Riepilogo inattiva	Solo inizio	Avanzamento
Riepilogo	Attività manuale	Solo-fine	Avanzamento manuale
Riepilogo progetto	Solo-durata	Attività esterne	
