CENTRALE DI BRINDISI SUD
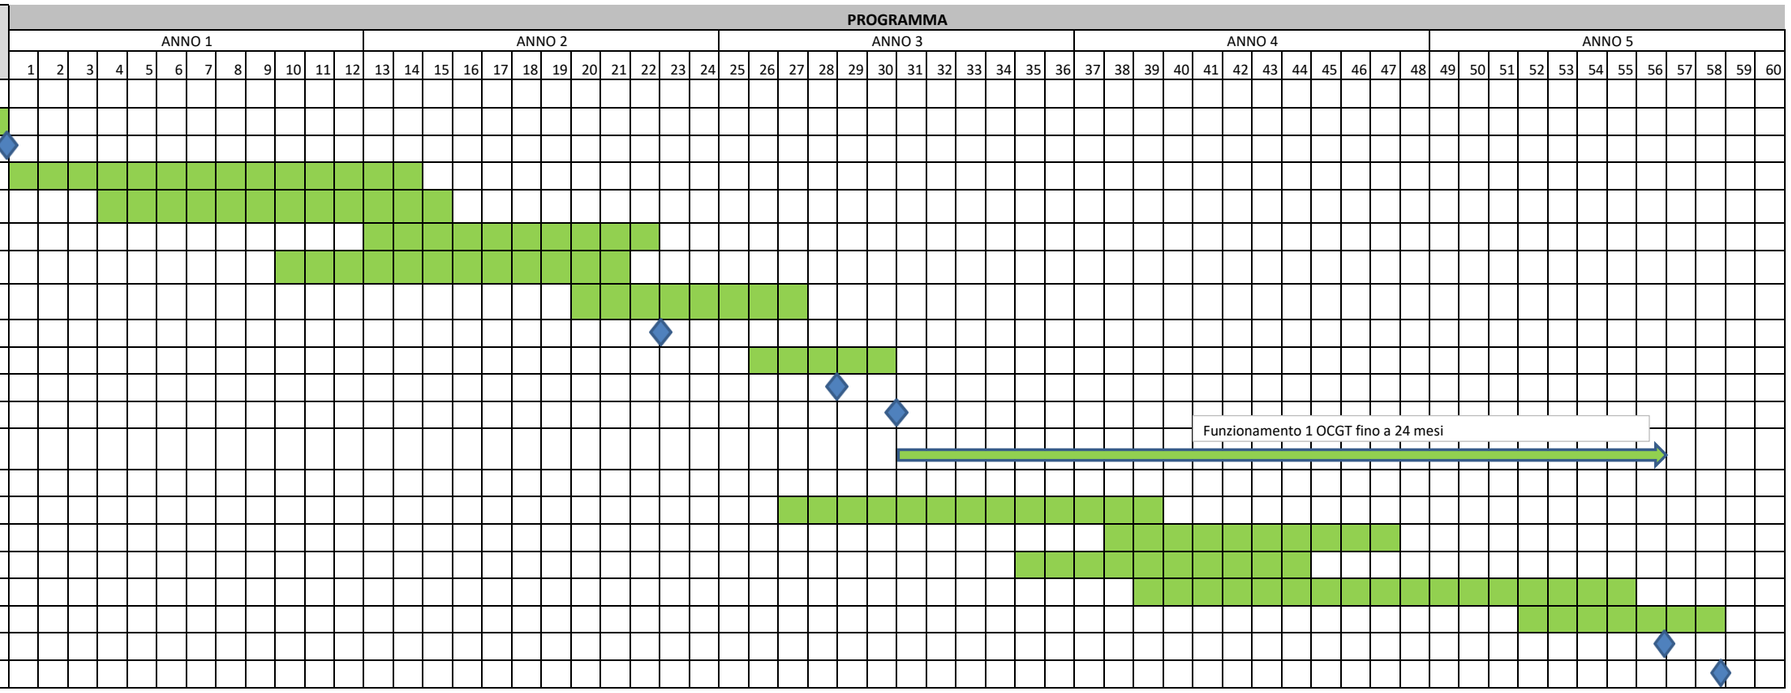
	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE PRELIMINARE GRUPPO OCGT / CCGT 1+1	ANNO MESE
	Rilascio Autorizzazione Unica a Costruire	
1	Aggiudicazione gara	≤ 6 mesi
	Attivazione progetto Fase 1 - TG 1 (OCGT)	
2	Ingegneria delle Forniture e dei Servizi (OCGT)	
3	Apertura cantiere, salvaguardie, demolizioni	
5	Opere Civili	
6	Resa in Cantiere equipment principali TG 1 (OCGT)	
7	Montaggio nuovo TG 1 (OCGT)	
	Dismissione unità a carbone	
8	Avviamento / Prove TG 1 (OCGT)	
10	Messa in esercizio TG 1 (OCGT)	
11	Messa a regime TG 1 (OCGT)	
12	Funzionamento TG 1	
	Attivazione progetto fase 2 (CCGT 1+1)	
	Ingegneria delle Forniture e dei Servizi (per chiusura CCGT)	
	Opere Civili	
	Resa in Cantiere equipment principali CCGT	
	Montaggi CCGT 1+1	
	Avviamento / Prove CCGT 1+1	
	Messa in esercizio CCGT 1+1	
	Messa a regime CCGT 1+1
