Attività	Descrizione	Durata (mesi)	Progressivo (mesi)
INTERVENTI SUL TERRENO	**Caratterizzazione**	**6**	**6**
	allestimento cantiere	6	6
	allestimento area di allocazione temporanea (in area VF - presso i settori 3)	3	6
	Asportacio ne terreni contaminati	**19+49= 14**	**116**
	area AE	10	22
	area MAMMAZZA	3	25
	area VF	36	73
	area ANAS	12	85
	aree DDT e KREBBS	1	86
	area ATESS	13	115
	area MENGA	1	116
	Allestimento impianto di confinamento "on site"	**6+18= 6**	**102**
	cella 1	6	17
	cella 2	6	31
	cella 3	6	37
	cella 4	6	43
	cella 5	6	102
	Confinamento e smaltimento terreni/rifiuti	**8+49 =14**	**116**
	smaltimento "off site" terreni maggiormente contaminati	3	61
	allocazione terreni in impianto "on site" - area AE	10	61
	allocazione terreni in impianto "on site" - area MAMMAZZA	3	61
	allocazione terreni in impianto "on site" - area VF	36	73
	allocazione terreni in impianto "on site" - area ANAS	12	85
	allocazione terreni in impianto "on site" - aree DDT e KREBBS	1	86
	allocazione terreni in impianto "on site" - area ATESS	13	115
	allocazione terreni in impianto "on site" - area MENGA	1	116
	Ripristino stato dei luoghi	**20+58= 17**	**120**
	rinterro / ripristino aree di asportazione	76	117
	chiusura settori di allocazione impianto di confinamento	71	118
	sistemazione finale impianto di confinamento	8+2	120
	Verifiche, collaudi e monitoraggi	**90+ 18**	**120**
	verifiche, collaudi e monitoraggi "in corso d'opera"	82+16	118
	verifiche, collaudi e monitoraggi "post operam"	8+2	120

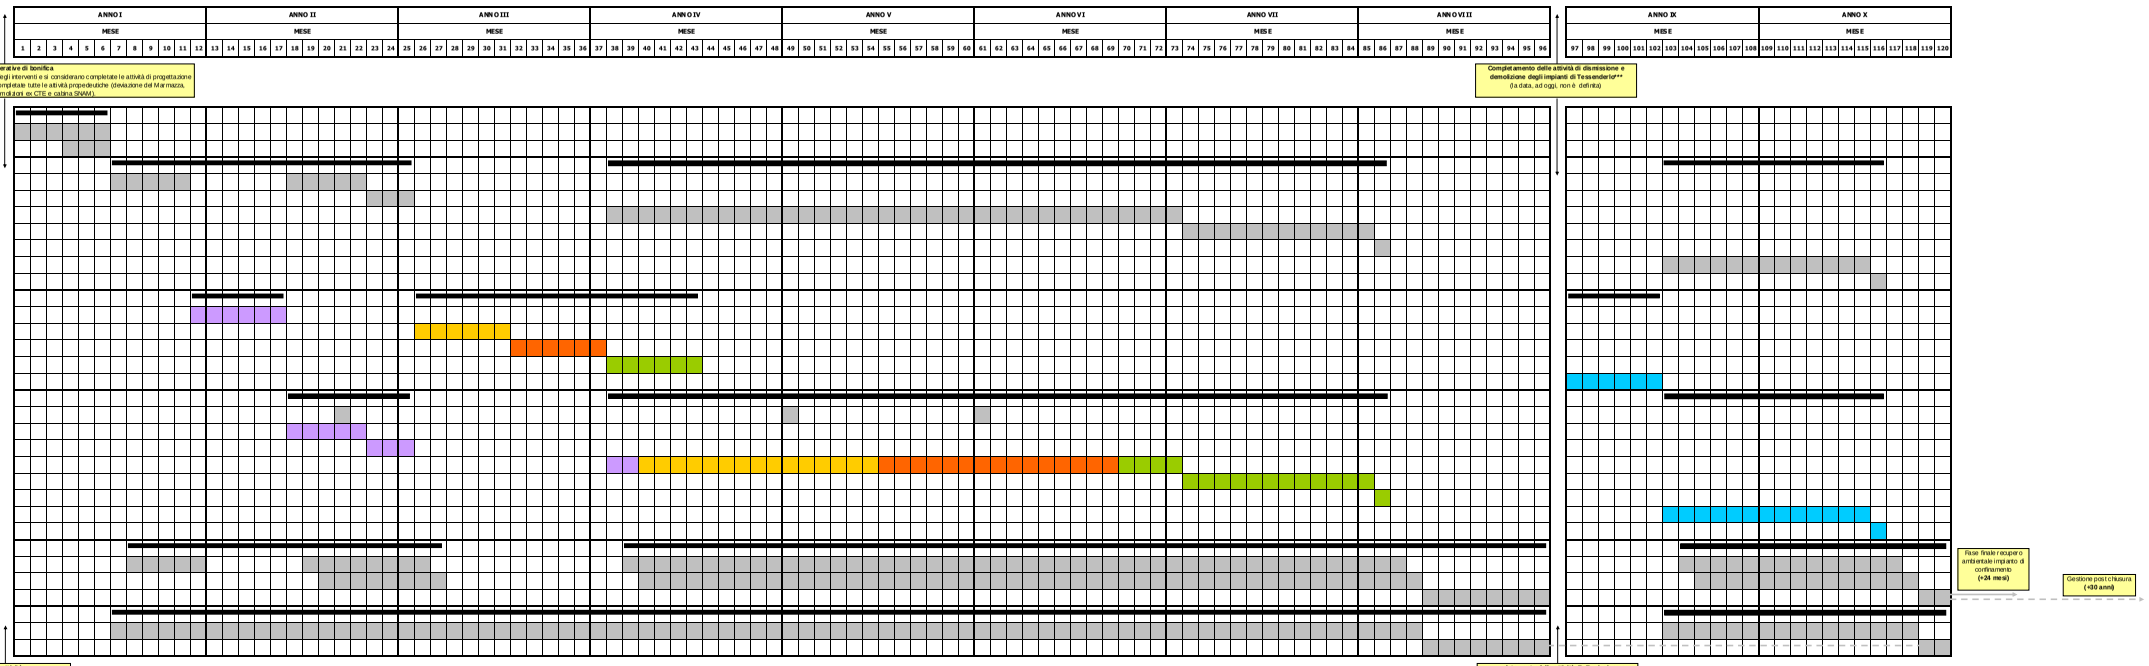

* I tempi sono stimati sulla base delle seguenti potenzialità di lavoro:
- 8 ore lavorative/giorno; 5 giorni lavorativi/settimana; 22 giorni lavorativi/mese
- un flusso di 45 mc/ora, per i materiali "in banco" contenenti asportati e messi a dimora nell'impianto di confinamento "on site"

** Nelle stime non sono stati considerati i tempi per acquisizione delle autorizzazioni e permessi, alla esecuzione degli interventi.
Gli interventi di bonifica dei terreni anche nell'area industriale produttiva del sito denominata ATTs avverranno successivamente

*** alla cessazione delle attività e allo smantellamento degli impianti produttivi ivi esistenti, da realizzare, in linea di principio, a cura di Tessenderlo Italia o dei suoi diretti causa o dei suoi successori, a condizioni da definire

Sequenza di coltivazione dell'impianto di confinamento

settore 1 | settore 2 | settore 3 | settore 4 | settore 5

Syndal S.p.A.
Stabilimento di Pieve Vergonte (VB)

PROGRAMMA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI (DIAGRAMMA DI GANTT)

URS ITALIA S.p.A.
