COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO		PROGETTISTA
SPV srl Via Invorio, 24/A 10146 Torino	Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06 subentrato all'ATI Consorzio Stabile fra le Imprese: SIS Scpa Via Invorio, 24/A 10146 Torino; SACYR S.A.; INC S.p.A.; SIPAL S.p.A.; INFRAESTRUCTURAS S.A. Paseo de la Castellana, 83-85 28046 Madrid	Ingegneria Grandi Opere S.r.l. Via Invorio, 24/A 10146 Torino IGO Srl Via Invorio 24/A 10146 - Torino
RESPONSABILE PROGETTAZIONE	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO Dott. Ing. GEORGIOS KALAMARAS n° 8178 H	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI POTENZA Dott. Ing. TROCCOLI NICOLA N° 836 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO Dott. Ing. TURSO Adriano n° 1400 Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	GEOLOGO	
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO Arch. Roberto BONOMI n. 3101	ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE ALESSIO Carlo - N° 255 -	

N. PROGR. _____
CARTELLA N. _____

PROGETTO DEFINITIVO
(C.U.P. H51B03000050009)

LOTTO 2 - TRATTA "B"
dal Km. 29+300 al Km 38+700

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA
CANTIERIZZAZIONE
PARTE GENERALE
Cronoprogramma

PVDCNGEGE2B000-0020001RA0

SCALA: -

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SIS	20/02/2012	IGO	24/02/2012	SIS	29/02/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL COMMISSARIO:	☐ VALIDAZIONE:
Ing. Giuseppe FASIOL	Ing. Silvano VERNIZZI	PROTOCOLLO : _____ DEL: _____

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
PROGRAMMI LAVORI LOTTO 2B DALLA PK 29+300 ALLA PK 38+700

ID	Nome attività	Giorni Effettivi
1	**ATTIVITA' LOTTO 2B**	1233 g
2	ESPROPRI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	361 g
3	INDAGINI ARCHEOLOGICHE	419 g
4	CANTIERIZZAZIONE	699 g
5	INTERFERENZE SOTTOSERVIZI ED IDRAULICHE	1049 g
6	**RI2B.1.N PK 29+300 / 29+375 - RI2B.1.S PK 29+300 / 29+400**	139 g
7	PIANO DI POSA E RILEVATO CARREGGIATA NORD E SUD	83 g
8	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	83 g
9	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	27 g
10	**TR2B.1.N PK 29+375 / 31+243.77 - TR2B.1.S PK 29+400 / 31+243.77 ; SVINCOLO DI BREGANZE**	671 g
11	SBANCAMENTI CARREGGIATA NORD E SUD	643 g
12	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	419 g
13	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	209 g
14	**MU.2B.001.N - MURO PREF.**	41 g
15	**MU.2B.003.N - MURO PREF. SV. BREGANZE**	41 g
16	**SF.2B.001 - SIFONE ROGGIA SERIOLA-BRUGNOLA - PK 29+525.00**	41 g
17	**MU.2B.002.S - MURO PREF.**	41 g
18	**MU.2B.004.N - MURO PREF. SV. BREGANZE**	20 g
19	**MU.2B.004A.N - MURO PREF. SV. BREGANZE**	20 g
20	**MU.2B.005.N - MURO PREF. SV. BREGANZE**	13 g
21	**MU.2B.006.N - MURO PREF. SV. BREGANZE**	13 g
22	**CA.2B.001 - CAVALCAVIA SVINCOLO BREGANZE - L=39.77m - PK 29+776.87**	160 g
23	FONDAZIONI	48 g
24	ELEVAZIONI	62 g
25	IMPALCATO E FINITURE	62 g
26	**MU.2B.007.S - MURO PREF. SV. BREGANZE**	13 g
27	**MU.2B.009.N - MURO PREF.**	48 g
28	**MU.2B.008.S - MURO PREF. ANDATORE PONTECANALE**	13 g
29	**MU.2B.010.S - MURO PREF. ANDATORE PONTECANALE**	13 g
30	LAVORI PER DEVIAZIONE PROVVISORIA VIA VENEZIA	39 g
31	ESERCIZIO DEVIAZIONE PROVVISORIA	235 g
32	LAVORI PER RIMOZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA VIA VENEZIA	29 g
33	**PC.2B.001 - PONTE CANALE ROGGIA SERIOLA - PK 30+098.67**	174 g
34	FONDAZIONI	48 g
35	ELEVAZIONI	62 g
36	IMPALCATO E FINITURE	76 g
37	**CA.2B.002 - CAVALCAVIA VIA VENEZIA - L=34.68m - PK 30+107.10**	160 g
38	FONDAZIONI	48 g
39	ELEVAZIONI	62 g
40	IMPALCATO E FINITURE	62 g
41	**MU.2B.011.N - MURO PREF.**	27 g
42	**MU.2B.012.S - MURO PREF.**	41 g
43	**CA.2B.003 - CAVALCAVIA STRADA DELLE MILIANE - L=31.41m - PK 30+494.06**	160 g
44	FONDAZIONI	48 g
45	ELEVAZIONI	62 g
46	IMPALCATO E FINITURE	62 g
47	**MU.2B.013.N - MURO PREF.**	42 g
48	**MU.2B.014.N - MURO PREF.**	125 g
49	**SV2B.06 - SVINCOLO DI BREGANZE**	461 g
50	MOVIMENTO TERRA PER CASELLO	419 g
51	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	391 g

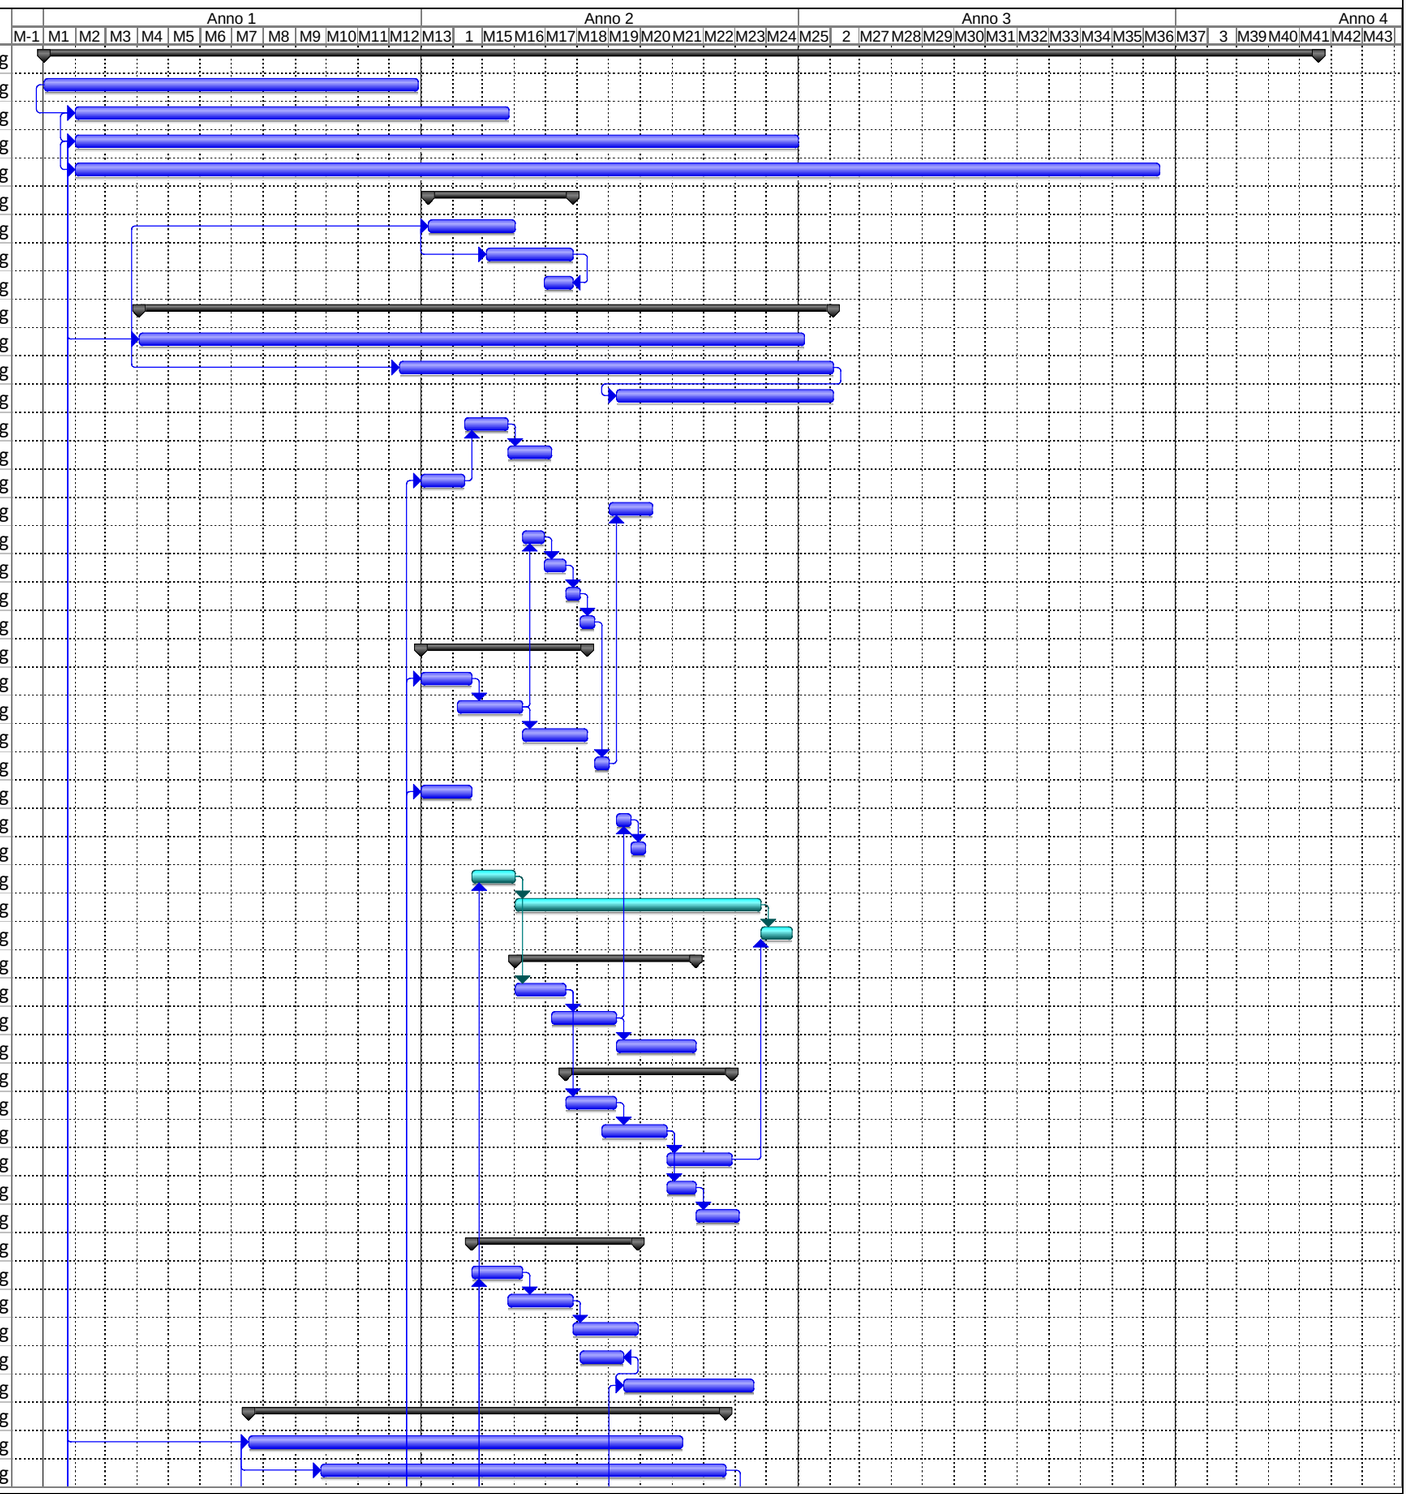

Progetto: LOTTO 2B

Attività | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno | Scadenza
Divisione | Riepilogo | Attività esterne | Avanzamento

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
PROGRAMMI LAVORI LOTTO 2B DALLA PK 29+300 ALLA PK 38+700

ID	Nome attività	Giorni Effettivi
52	REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE CASELLO	83 g
53	**CE2B.06 - CASELLO DI ESAZIONE**	349 g
54	**VS2B06C - ROTATORIA NEL COMUNE DI BREGANZE**	55 g
55	**VS2B.06 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA IND. BREGANZE**	321 g
56	MOVIMENTO TERRA PER VIABILITA' SECONDARIA	307 g
57	SOVRASTRUTTURA STRADALE PER VIABILITA' SECONDARIA	181 g
58	**SO.2B.013 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE - PK 29+111.18**	48 g
59	**SO.2B.013A - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE**	34 g
60	**SI.2B.005 - TUBAZIONE d.400**	27 g
61	**TS.2B.010 - ROGGIA BRUGNOLA**	20 g
62	**TS.2B.011 - ROGGIA SERIOLA**	20 g
63	**TC.2B.006 - ROGGIA SERIOLA**	20 g
64	**SO.2B.014 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE**	27 g
65	**SO.2B.015 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE**	27 g
66	**TC.2B.007 - TUBAZIONE d.500**	13 g
67	**VS2B.06B - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SV. DI BREGANZE**	682 g
68	MOVIMENTO TERRA PER VIABILITA' SECONDARIA	675 g
69	SOVRASTRUTTURA STRADALE PER VIABILITA' SECONDARIA	598 g
70	**SO.2B.016 - SOTTOVIA SCATOLARE STRADA DELLE MILIANE**	29 g
71	**SO.2B.017 - SOTTOVIA SCATOLARE STRADA DELLE MILIANE**	29 g
72	LAVORI PER DEVIAZIONE PROVVISORIA SP111, VIA OLMO E VIA BRAGETTI	39 g
73	ESERCIZIO DEVIAZIONE PROVVISORIA	289 g
74	LAVORI PER RIMOZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA SP111, VIA OLMO E VIA BRAGETTI	18 g
75	**GA.2.13A - GALLERIA ARTIFICIALE "OLMO" - L=80.00m**	279 g
76	SCAVO	69 g
77	SOLETTA DI FONDO, PARETI, SOLETTA DI COPERTURA, RIVESTIMENTI	153 g
78	IMPIANTI	55 g
79	REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	34 g
80	**TR2B.2.N PK 31+347.87 / 31+963.20 - TR2B.2.S PK 31+347.87 / 32+000.00**	713 g
81	**SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIAVON**	41 g
82	MICROTUNNELING PER MANTENIMENTO ACQUE NEL CHIAVON ATTUALE	41 g
83	SBANCAMENTI CARREGGIATA NORD E SUD	391 g
84	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	419 g
85	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	167 g
86	**MU.2B.015.N - MURO PREF.**	34 g
87	**MU.2B.016.S - MURO PREF. + PARATIA**	118 g
88	**MU.2B.017.N - MURO PREF.**	178 g
89	**MU.2B.017A.S - MURO PREF.**	62 g
90	**MU.2B.017B.S - MURO PREF.**	27 g
91	**MU.2B.018.S - MURO PREF.**	27 g
92	**RI2B.2.N PK 31+963.20 / 32+350.00 - RI2B.2.S PK 32+000.00 / 32+350.00**	451 g
93	REALIZZAZIONE NUOVO ALVEO TORRENTE CHIAVON	391 g
94	**PL.2B.001 - PONTICELLO CHIAVON - L=19.00m**	48 g
95	PIANO DI POSA E RILEVATO CARREGGIATA NORD E SUD	343 g
96	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	344 g
97	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	307 g
98	**MU.2B.019.N - MURO PREF.**	41 g
99	**TC.2B.001 - TUBAZIONE d.800 - PK 32+318.30**	236 g
100	**PO.2.06.N - PONTE "TORRENTE CHIAVON" NORD - L=29.26m**	209 g
101	REALIZZAZIONE PIAZZALI E PISTE DI CANTIERE, OPERE PROVVISIPNALI, SCAVI DI FONDAZIONE	20 g
102	FONDAZIONI	48 g

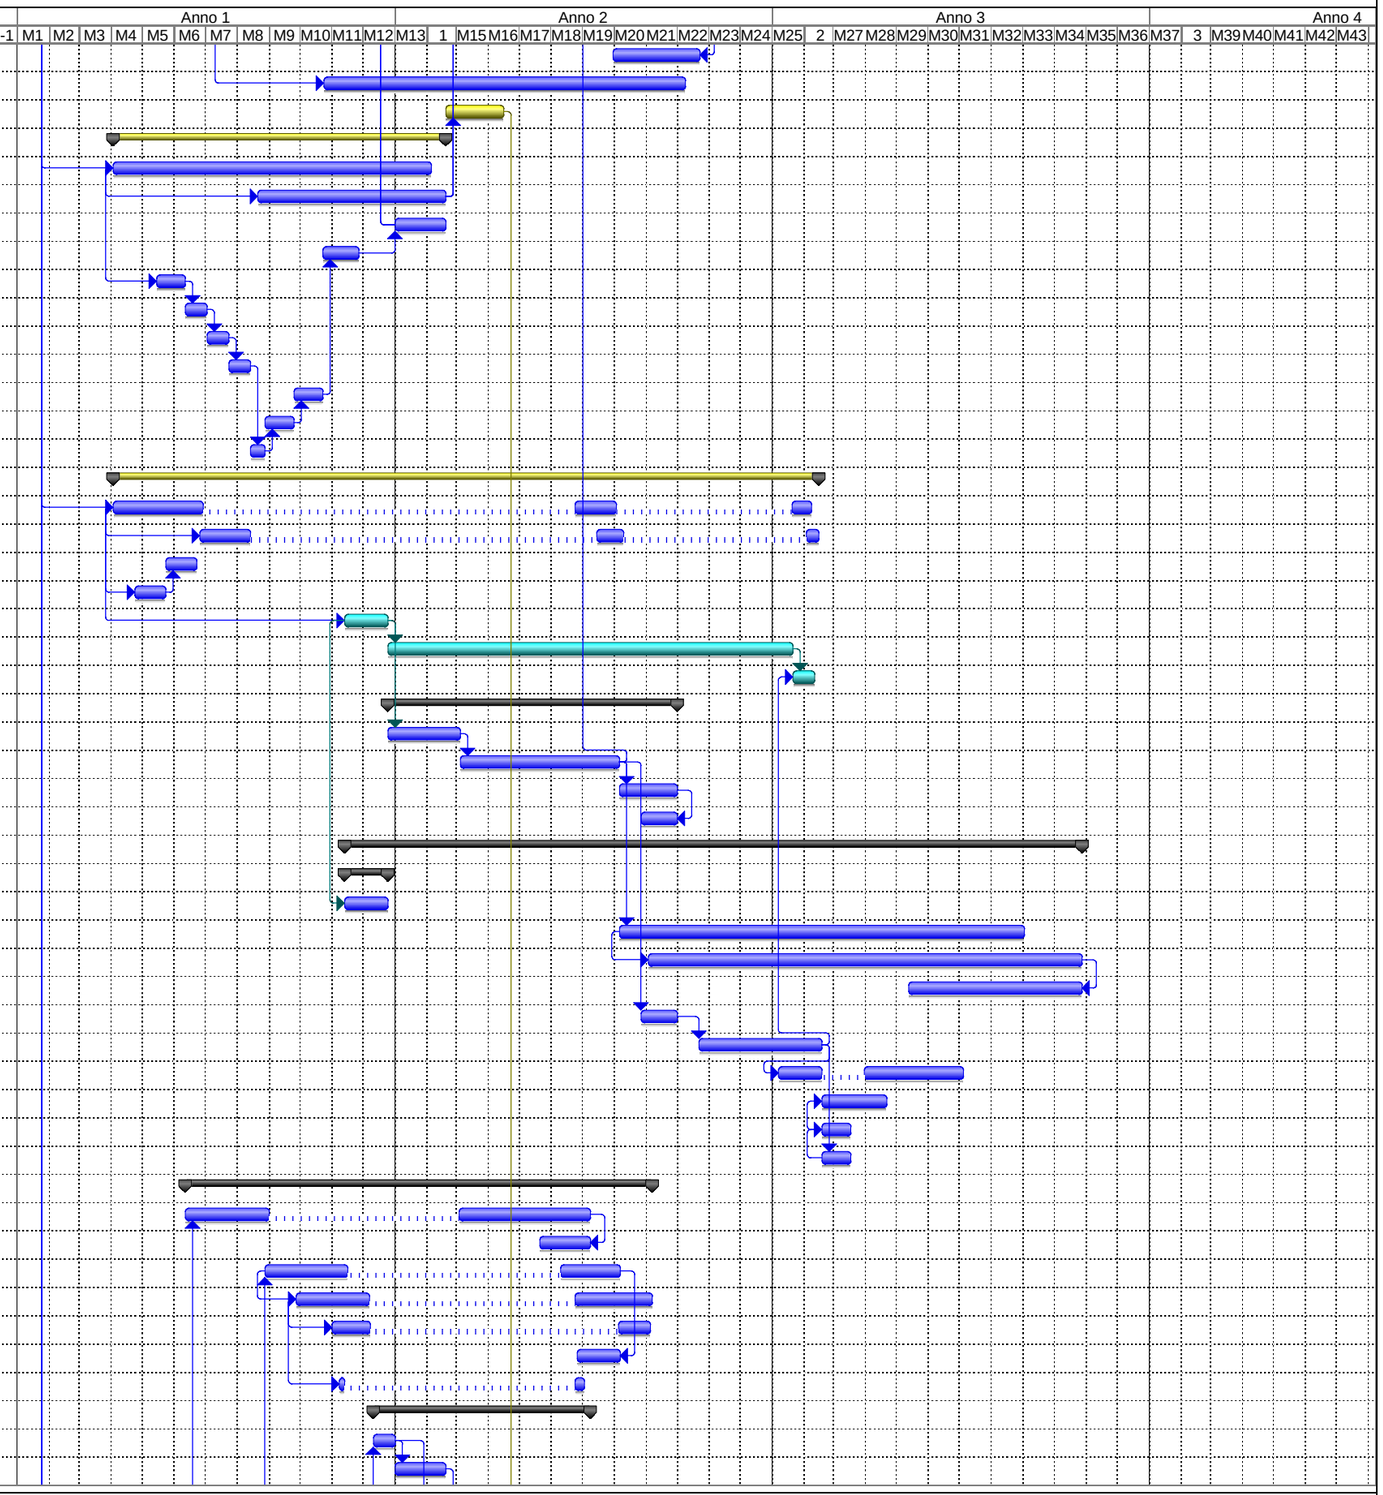

Progetto: LOTTO 2B

Attività | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno | Scadenza
Divisione | Riepilogo | Attività esterne | Avanzamento

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
PROGRAMMI LAVORI LOTTO 2B DALLA PK 29+300 ALLA PK 38+700

ID	Nome attività	Giorni Effettivi
103	ELEVAZIONI	62 g
104	VARO TRAVI IN CAP, MONTAGGIO PREDALLES E GETTO SOLETTA	62 g
105	RILEVATI E OPERE A TERGO DELLE SPALLE, SISTEMAZIONI, OPERE DI FINITURA	27 g
106	**PO.2.06.S - PONTE "TORRENTE CHIAVON" SUD - L=29.26m**	209 g
107	REALIZZAZIONE PIAZZALI E PISTE DI CANTIERE, OPERE PROVVISIPNALI, SCAVI DI FONDAZIONE	20 g
108	FONDAZIONI	48 g
109	ELEVAZIONI	62 g
110	VARO TRAVI IN CAP, MONTAGGIO PREDALLES E GETTO SOLETTA	62 g
111	RILEVATI E OPERE A TERGO DELLE SPALLE, SISTEMAZIONI, OPERE DI FINITURA	27 g
112	**PO.2.07.C - PONTE "TORRENTE CHIAVON" COMPLANARE - L=29.38m**	188 g
113	REALIZZAZIONE PIAZZALI E PISTE DI CANTIERE, OPERE PROVVISIPNALI, SCAVI DI FONDAZIONE	20 g
114	FONDAZIONI	41 g
115	ELEVAZIONI	55 g
116	VARO TRAVI IN CAP, MONTAGGIO PREDALLES E GETTO SOLETTA	55 g
117	RILEVATI E OPERE A TERGO DELLE SPALLE, SISTEMAZIONI, OPERE DI FINITURA	27 g
118	**VS2B07A - ROTATORIA NEL COMUNE DI MASON VICENTINO**	69 g
119	**RI2B.3.N PK 32+375.00 / 33+715.05 - RI2B.3.S PK 32+375.00 / 33+702.63**	589 g
120	LAVORI PER DEVIAZIONE PROVVISORIA VIA S.GAETANO E VIA PAJARON	25 g
121	ESERCIZIO DEVIAZIONE PROVVISORIA	226 g
122	LAVORI PER RIMOZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA VIA S.GAETANO E VIA PAJARON	20 g
123	PIANO DI POSA E RILEVATO CARREGGIATA NORD E SUD	559 g
124	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	559 g
125	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	446 g
126	**SO.2B.001 - SOTTOVIA SCAT. CICLOPEDONALE 3.00x3.00m - PK 32+389.79**	265 g
127	**MU.2B.020.N - MURO PREF.**	111 g
128	**TS.2B.001 - TOMBINO SCATOLARE IDRAULICO 2.00x1.00m - PK 32+650.00**	244 g
129	**MU.2B.021.N - MURO PREF.**	97 g
130	**MU.2B.022.S - MURO PREF.**	55 g
131	**TC.2B.002 - TUBO d.1000 - PK 33+216.16**	165 g
132	**SO.2B.002 - SOTTOVIA SCATOLARE VIA RIALE 8.50x5.50m - PK 33+289.16**	55 g
133	**MU.2B.023.S - MURO PREF.**	55 g
134	**TS.2B.002 - TOMBINO SCATOLARE IDRAULICO TORRENTE RIALE 6.00x3.00m - PK 33+512.95**	161 g
135	**SO.2B.003 - SOTTOVIA SCATOLARE STRADA PODERALE 3.00x3.00m - PK 33+665.79**	246 g
136	**PO.2.08.N - PONTE "TORRENTE LAVERDA" NORD - L=54.00m**	237 g
137	REALIZZAZIONE PIAZZALI E PISTE DI CANTIERE, OPERE PROVVISIPNALI, SCAVI DI FONDAZIONE	20 g
138	FONDAZIONI	55 g
139	ELEVAZIONI	62 g
140	IMPALCATO E FINITURE	83 g
141	RILEVATI E OPERE A TERGO DELLE SPALLE, SISTEMAZIONI, OPERE DI FINITURA	27 g
142	**PO.2.08.S - PONTE "TORRENTE LAVERDA" SUD - L=54.00m**	237 g
143	REALIZZAZIONE PIAZZALI E PISTE DI CANTIERE, OPERE PROVVISIPNALI, SCAVI DI FONDAZIONE	20 g
144	FONDAZIONI	55 g
145	ELEVAZIONI	62 g
146	IMPALCATO E FINITURE	83 g
147	RILEVATI E OPERE A TERGO DELLE SPALLE, SISTEMAZIONI, OPERE DI FINITURA	27 g
148	**PO.2.09.C - PONTE "TORRENTE LAVERDA" COMPLANARE - L=54.89m**	239 g
149	REALIZZAZIONE PIAZZALI E PISTE DI CANTIERE, OPERE PROVVISIPNALI, SCAVI DI FONDAZIONE	20 g
150	FONDAZIONI	48 g
151	ELEVAZIONI	55 g
152	IMPALCATO E FINITURE	69 g
153	RILEVATI E OPERE A TERGO DELLE SPALLE, SISTEMAZIONI, OPERE DI FINITURA	27 g

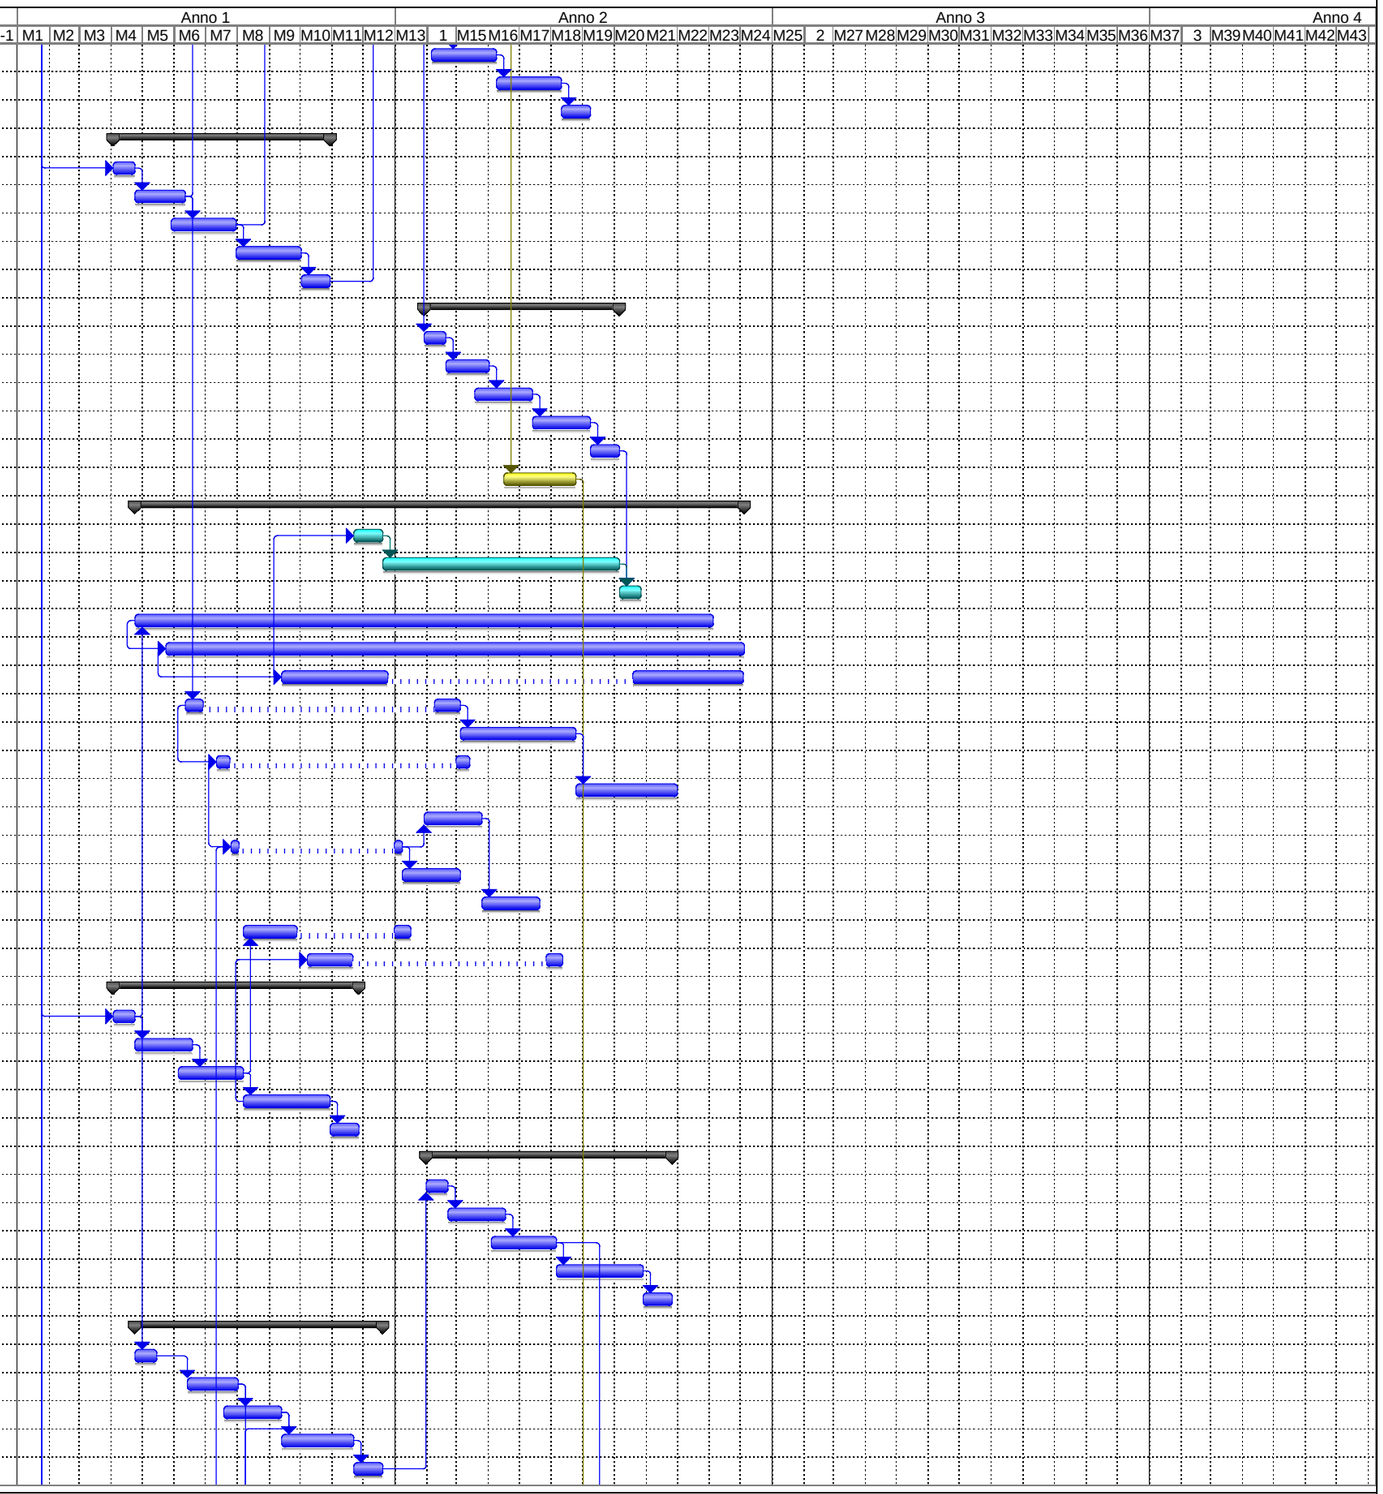

Progetto: LOTTO 2B

Attività | Divisione | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Avanzamento | Scadenza

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
PROGRAMMI LAVORI LOTTO 2B DALLA PK 29+300 ALLA PK 38+700

ID	Nome attività	Giorni Effettivi
154	**VS2B.07 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SV. MASON-PIANEZZE-MAROSTICA**	923 g
155	MOVIMENTO TERRA PER VIABILITA' SECONDARIA	881 g
156	SOVRASTRUTTURA STRADALE PER VIABILITA' SECONDARIA	839 g
157	**TS.2B.012 - TORRENTE RIALE**	27 g
158	**TS.2B.013 - ROGGIA ANGARANA**	27 g
159	**VS2B07B - PISTA CICLABILE NEL COMUNE DI MASON VICENTINO**	97 g
160	**VS2B.08B - COLLEGAMENTO TRA SVINCOLO DI MASON E COMUNE DI MOLVENA**	181 g
161	**RI2B.4.N PK 33+768.96 / 36+384.61 - RI2B.4.S PK 33+756.71 / 36+367.83**	1024 g
162	PIANO DI POSA E RILEVATO CARREGGIATA NORD E SUD	785 g
163	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	788 g
164	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	746 g
165	**SO.2B.004 - SOTTOVIA SCATOLARE - PK 33+800.00**	357 g
166	**TC.2B.003 - TUBO d.1000 - PK 34+000.00**	340 g
167	**MU.2B.024.N - MURO PREF.**	83 g
168	**SO.2B.005 - SOTTOVIA SCATOLARE GASPARONA - PK 34+145.44**	420 g
169	**MU.2B.025.S - MURO PREF.**	111 g
170	**TS.2B.003 - TOMBINO SCATOLARE IDRAULICO ROGGIA ANGARANA 3.00x2.00m - PK 34+400.00**	356 g
171	**SO.2B.006 - SOTTOVIA SCATOLARE VIA ANCONETTA 8.50x5.50m - PK 34+617.95**	392 g
172	**TC.2B.004 - TUBO d.1000 - PK 34+657.98**	348 g
173	**MU.2B.026.N - MURO PREF.**	27 g
174	**MU.2B.027.S - MURO PREF.**	55 g
175	**TS.2B.004 - TOMBINO SCATOLARE IDRAULICO ROGGIA ROSSETTE 3.00x1.50m - PK 35+155.58**	416 g
176	**TS.2B.005 - TOMBINO SCATOLARE IDRAULICO TORRENTE GHEDO-LONGHELLA - PK 35+490.58**	450 g
177	**SO.2B.007 - SOTTOVIA SCATOLARE VIA G.VERDI - PK 35+501.55**	456 g
178	**SO.2B.007A - SOTTOPASSO PEDONALE AREA DI SERVIZIO - PK 35+700.80**	69 g
179	**TS.2B.006 - TOMBINO SCATOLARE TORRENTE RONCAGLIA - PK 35+838.14**	448 g
180	**TC.2B.005 - TUBO CLS d.1000 - PK 35+950.64**	434 g
181	**MU.2B.028.S - MURO PREF.**	139 g
182	**MU.2B.029.N - MURO PREF.**	97 g
183	**SO.2B.008 - SOTTOVIA SCATOLARE CICLOPEDONALE 4.00x3.00m - PK 36+170.77**	435 g
184	**SI.2B.001 - TUBO d.300 - PK 36+387.78**	409 g
185	**AS2B.02 - AREA DI SERVIZIO MASON VICENTINO N/S PK 35+700**	730 g
186	**CM2B.01 - CENTRO DI MANUTENZIONE MASON VIC. PK 35+700**	380 g
187	**CT2B.01 - CENTRO DI STOCCAGGIO SOL. SALINE MASON VIC. PK 35+700**	170 g
188	LAVORI PER DEVIAZIONE PROVVISORIA VIA DELL'ARTIGIANATO	39 g
189	ESERCIZIO DEVIAZIONE PROVVISORIA	305 g
190	LAVORI PER RIMOZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA VIA DELL'ARTIGIANATO	18 g
191	**VI.2.03.N - VIADOTTO MASON PIANEZZE - L=86.00m**	335 g
192	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE SPALLA 1	41 g
193	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE PILA 1	41 g
194	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE PILA 2	41 g
195	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE SPALLA 2	41 g
196	VARO TRAVI IN C.A.P., MONTAGGIO PREDALLES, GETTO SOLETTA	69 g
197	OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO	41 g
198	**VI.2.03.S - VIADOTTO MASON PIANEZZE - L=114.00m**	363 g
199	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE SPALLA 1	41 g
200	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE PILA 1	41 g
201	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE PILA 2	41 g
202	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE PILA 3	41 g
203	SCAVO, OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE E ELEVAZIONE SPALLA 2	41 g
204	VARO TRAVI IN C.A.P., MONTAGGIO PREDALLES, GETTO SOLETTA	97 g

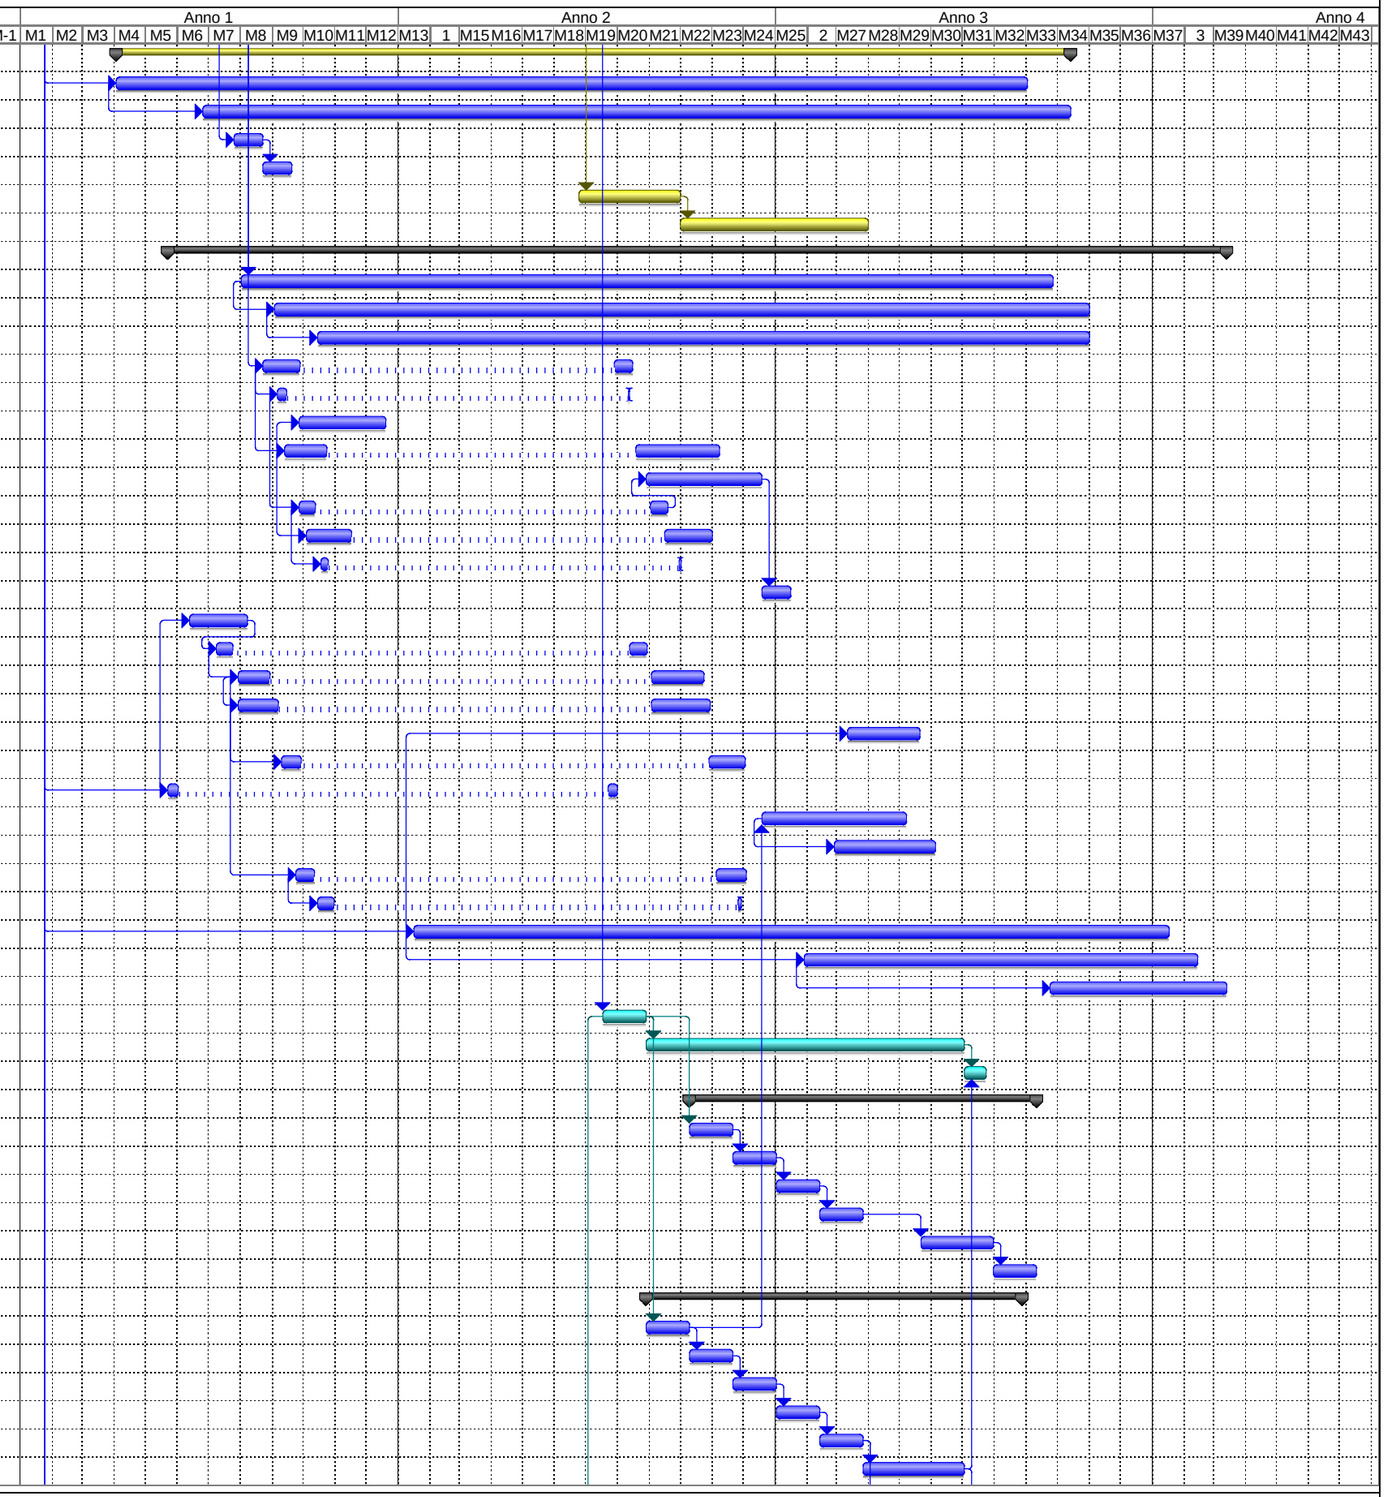

Progetto: LOTTO 2B

Attività | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno | Scadenza
Divisione | Riepilogo | Attività esterne | Avanzamento

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
PROGRAMMI LAVORI LOTTO 2B DALLA PK 29+300 ALLA PK 38+700

ID	Nome attività	Giorni Effettivi
205	OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO	55 g
206	**RI2B.5.N PK 36+471.31 / 37+075.00 - RI2B.5.S PK 36+482.54 / 37+025.00**	722 g
207	PIANO DI POSA E RILEVATO CARREGGIATA NORD E SUD	447 g
208	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	503 g
209	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	419 g
210	**MU.2B.030.S - MURO PREF.**	27 g
211	**MU.2B.031.N - MURO PREF. SV. MASON-PIANEZZE-MAROSTICA**	20 g
212	**TS.2B.007 - TOMBINO SCAT. IDR. TORRENTE PONTERONE-RAMO MATTINA, 5.50x2.00m - PK 36+590.00**	227 g
213	**TS.2B.008 - TOMBINO SCAT. IDR. TORRENTE PONTERONE E VALLE OLDELLE, 5.50x2.00m - PK 36+800.00**	232 g
214	**TS.2B.009 - TOMBINO SCAT. IDR. SCOLO DELLE FOSSE 2.00x1.00m - PK 36+932.69**	212 g
215	**SV2B.07 - SVINCOLO DI MASON-PIANEZZE-MAROSTICA**	483 g
216	MOVIMENTO TERRA PER CASELLO	433 g
217	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	349 g
218	REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE CASELLO	83 g
219	**TF.2B.001 - PASSAGGIO FAUNISTICO**	20 g
220	**CE2B.07 - CASELLO DI ESAZIONE**	349 g
221	**VS2B08C - VIABILITA' VIA PONTE CATTANEO NEL COMUNE DI PIANEZZE**	95 g
222	**VS2B.08D - VIABILITA' VIA DE GASPERI NEL COMUNE DI PIANEZZE**	21 g
223	**TR2B.3.N PK 37+075 / 37+959.79 - TR2B.3.S PK 37+025.00 / 37+959.79**	1038 g
224	SBANCAMENTI CARREGGIATA NORD E SUD	933 g
225	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	478 g
226	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	137 g
227	**SO.2B.009 - SOTTOVIA SCAT. 1 SV. MASON-PIANEZZE-MAROSTICA - PK 37+054.43**	230 g
228	**SO.2B.010 - SOTTOVIA SCAT. 2 SV. MASON-PIANEZZE-MAROSTICA COMPL. - PK 37+211.93**	37 g
229	**SO.2B.011 - SOTTOVIA SCAT. 3 SV. MASON-PIANEZZE-MAROSTICA COMPL. - PK 37+252.45**	44 g
230	**MU.2B.032.S - MURO PREF.**	27 g
231	**SI.2B.002 - TUBO d.450 - PK 37+548.86**	296 g
232	**MU.2B.033.N - PARATIA**	34 g
233	**MU.2B.034.S - MURO PREF.**	41 g
234	**GA.2.14 - GALLERIA ARTIFICIALE "MAROSTICA OVEST" - L=626.40m**	650 g
235	LAVORI PER STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELL'INDUSTRIA E CORSO DELLA CERAMICA	53 g
236	LAVORI PER 1°DEVIAZIONE PROVVISORIA SP111 E VIA DE LL'INDUSTRIA	53 g
237	ESERCIZIO DEVIAZIONI PROVVISORIE	408 g
238	**1°TRATTO**	167 g
239	SCAVO, CORREE, DIAFRAMMI	62 g
240	SCAVO,SETTO CENTRALE, COPERTURA E SOLETTONE DI FONDO, RIVESTIMENTI E MURETTE	104 g
241	LAVORI PER 2°DEVIAZIONE PROVVISORIA SP111 E VIA DE LL'INDUSTRIA	53 g
242	**2°TRATTO**	195 g
243	SCAVO, CORREE, DIAFRAMMI	76 g
244	SCAVO,SETTO CENTRALE, COPERTURA E SOLETTONE DI FONDO, RIVESTIMENTI E MURETTE	118 g
245	**3°TRATTO**	531 g
246	SCAVO, CORREE, DIAFRAMMI	160 g
247	SCAVO,SETTO CENTRALE, COPERTURA E SOLETTONE DI FONDO, RIVESTIMENTI E MURETTE	391 g
248	IMPIANTI	167 g
249	SOVRASTRUTTURA STRADALE CANNA NORD E SUD E FINITURE	97 g
250	RIPRISTINO VIABILITA' DEFINITIVA SP111 E VIA DELL'INDUSTRIA	41 g
251	**SI.2B.003 - ROGGIA MAROSTICANA - PK 38+343.77**	20 g
252	**SO.2B.012 - SOTTOVIA SCAT. CICLOPEDONALE 4.00x2.50m COMPLANARE - PK 38+554.12**	34 g
253	**SI.2B.004 - ROGGIA SAN TORRESINO - PK 38+567.63**	9 g
254	**TR2B.4.N PK 38+598.40 / 38+700.00 - TR2B.4.S PK 38+598.40 / 38+700.00**	279 g
255	SBANCAMENTI CARREGGIATA NORD E SUD	83 g

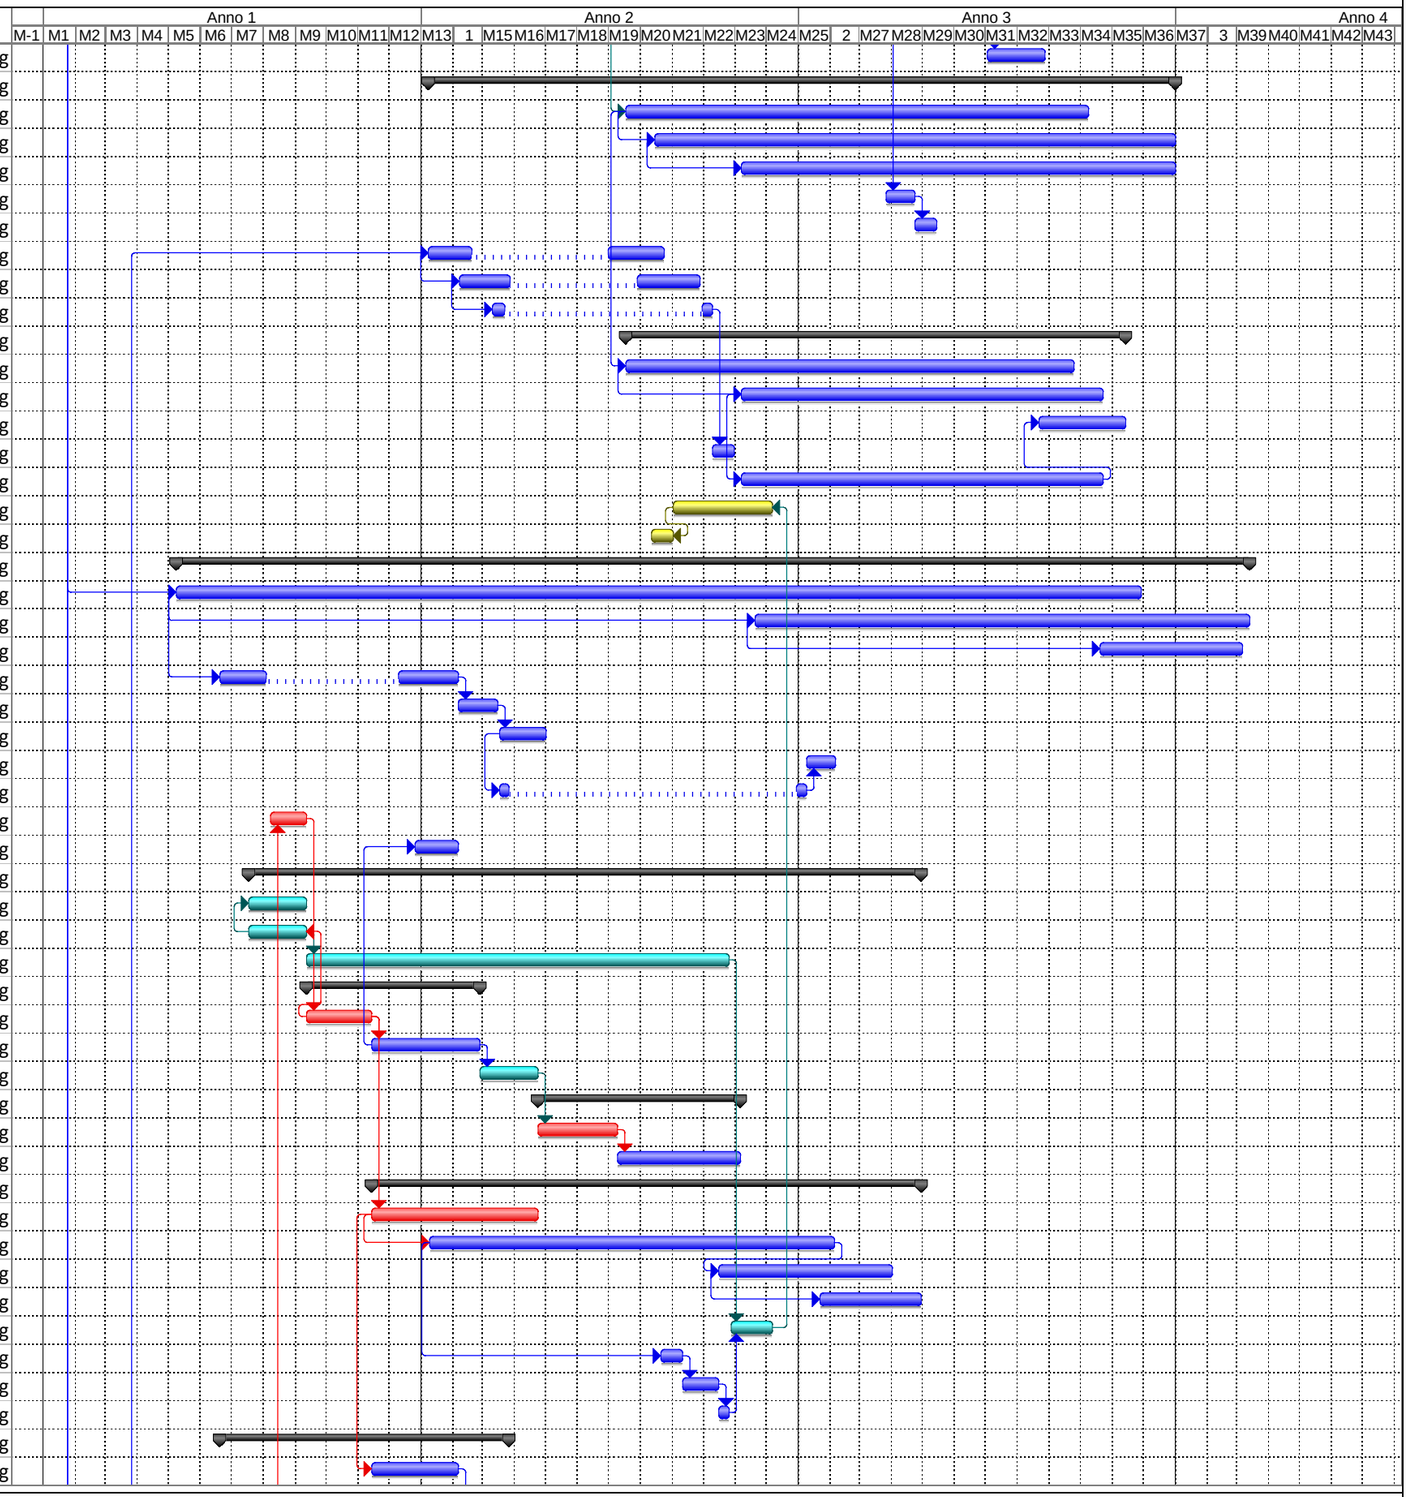

Progetto: LOTTO 2B

Attività | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno | Scadenza
Divisione | Riepilogo | Attività esterne | Avanzamento

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
PROGRAMMI LAVORI LOTTO 2B DALLA PK 29+300 ALLA PK 38+700

ID	Nome attività	Giorni Effettivi
256	IDRAULICA, OPERE A VERDE, BARRIERE DI SIC. E FONOASSORBENTI	27 g
257	SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD E SUD	20 g
258	**MU.2B.035.N - PARATIA**	48 g
259	**VS2B.08 - VIABILITA' DI CONTINUITA' GASPARONA E COLLEGAMENTO SV. MASON-PIANEZZE-MAROSTICA**	979 g
260	MOVIMENTO TERRA PER VIABILITA' SECONDARIA	944 g
261	SOVRASTRUTTURA STRADALE PER VIABILITA' SECONDARIA	937 g
262	**IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI**	1007 g
263	**IMPIANTI TECNOLOGICI IN ITINERE**	1007 g
264	**SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE**	1007 g

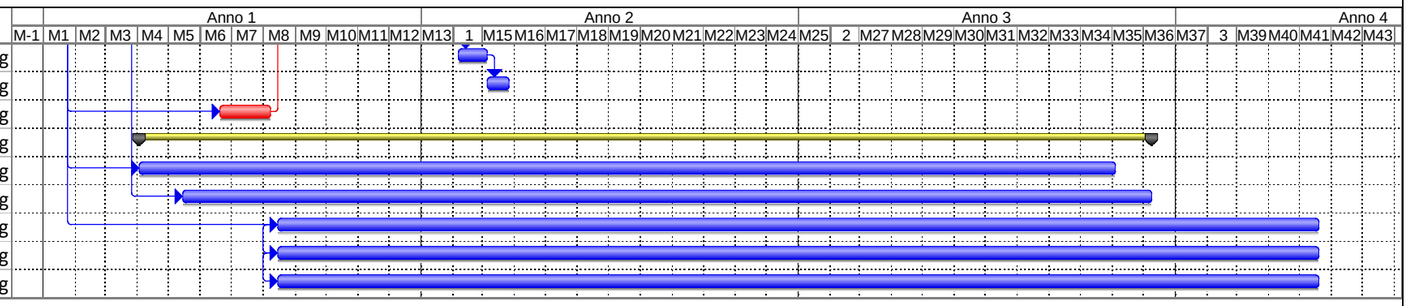

Progetto: LOTTO 2B

Attività | Divisione | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Avanzamento | Scadenza
