PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE – BYPASS SUD – FASE 5 DI 6 – SCALA 1:200

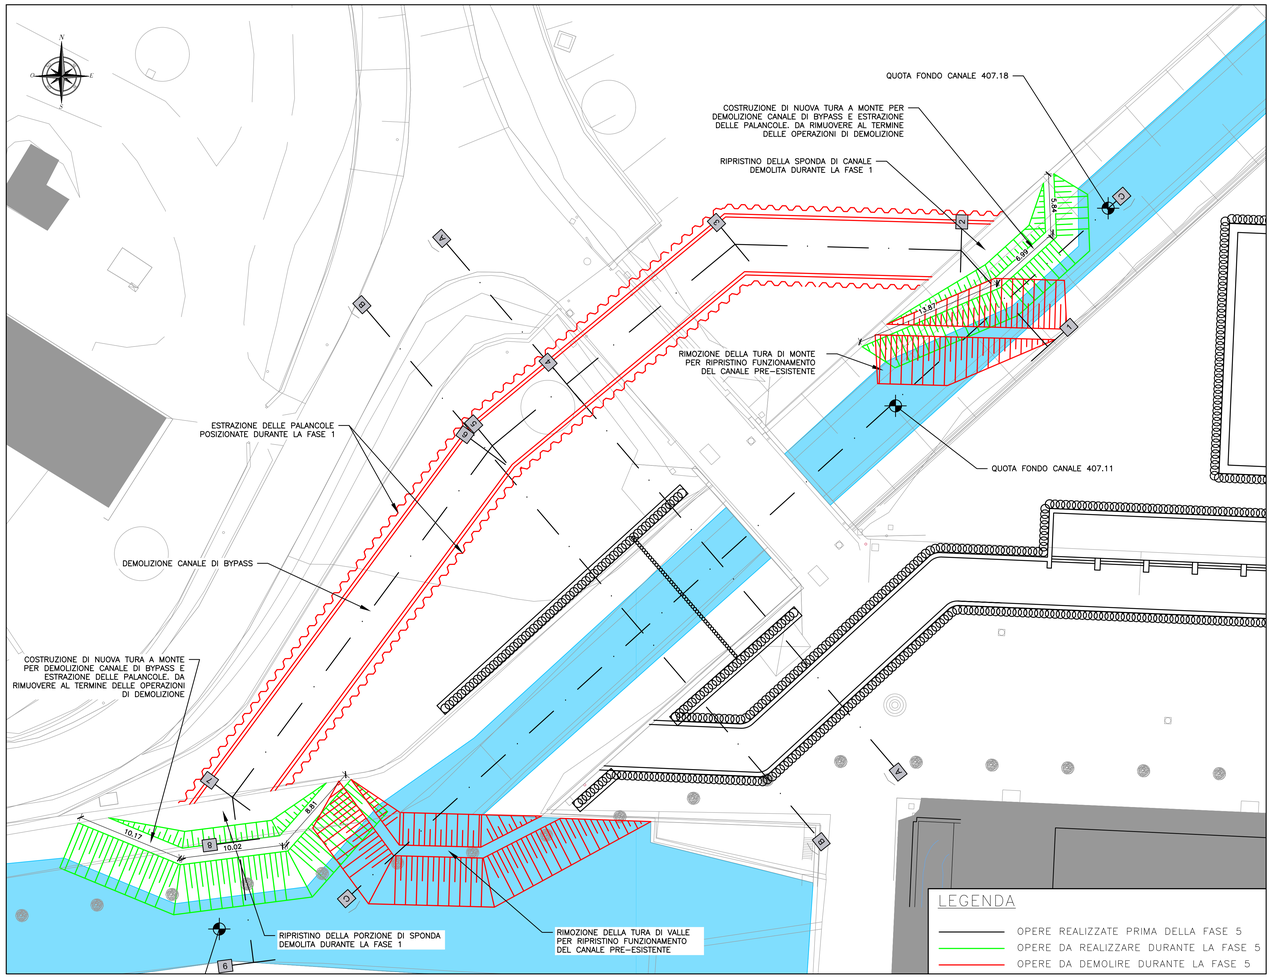

SEZIONE TRASVERSALE A–A – BYPASS SUD – FASE 5 DI 6 – SCALA 1:200

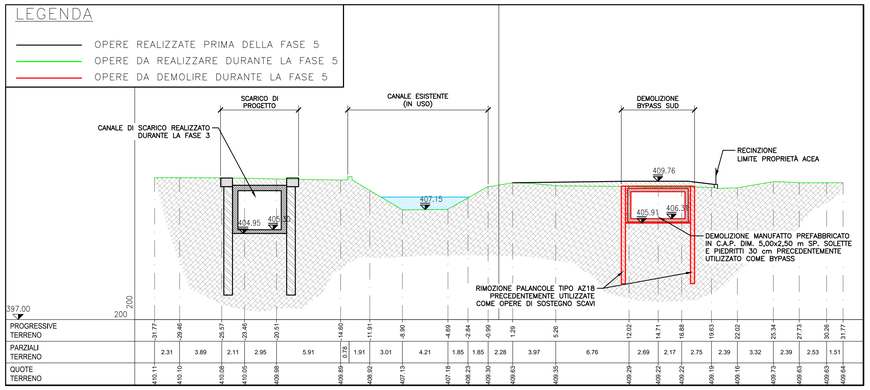

SEZIONE TRASVERSALE C–C – BYPASS SUD – FASE 5 DI 6 – SCALA 1:200

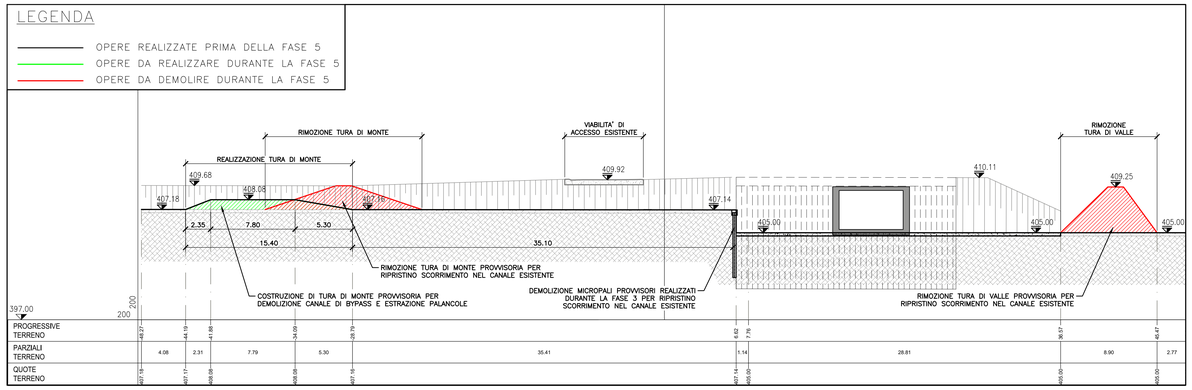

PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE – BYPASS SUD – FASE 6 DI 6 – SCALA 1:200

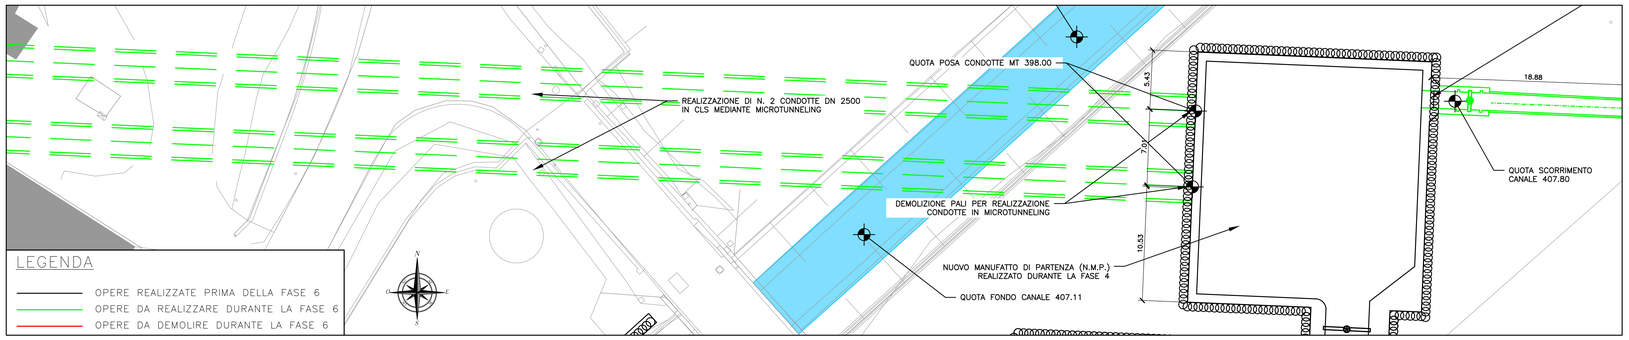

PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE – BYPASS SUD – FASE 6 DI 6 – SCALA 1:200

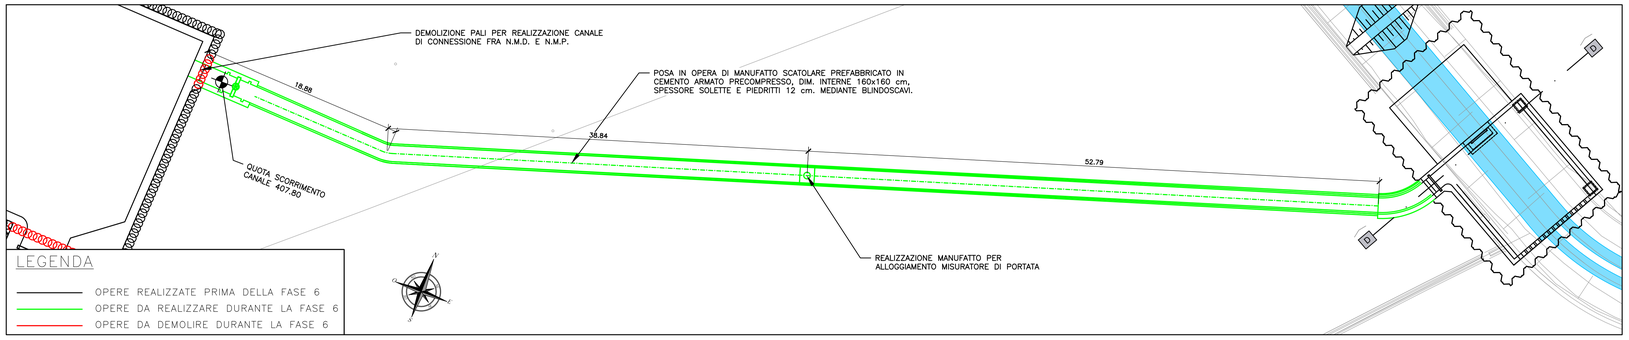

QUADRO D'UNIONE

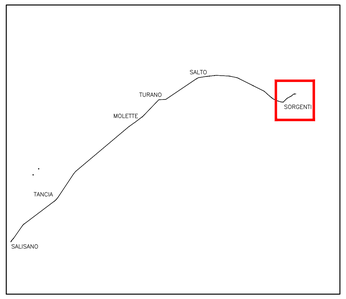

FASE 5 – BYPASS SUD
DISMISSIONE CANALE DI BYPASS

1. RIMOZIONE TURE DI MONTE E VALLE REALIZZATE DURANTE LA FASE 2.
2. REALIZZAZIONE DI NUOVE TURE PROVVISORIE IN POSIZIONI ANALOGHE A QUANTO GIA' REALIZZATO DURANTE LA FASE 1. IL CANALE VIENE QUINDI DEVIATO NEL SUO PERCORSO ORIGINALE
3. DEMOLIZIONE DEL CANALE DI BYPASS E RITOMBAMENTO
4. RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL CANALE IN CORRISPONDENZA DEI DUE IMBOCCHI DEL BYPASS APPENA DEMOLITI.
5. RIMOZIONE DELLE TURE PRECEDENTEMENTE REALIZZATE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ORIGINALI DEL CANALE.

FASE 6 – BYPASS SUD
REALIZZAZIONE CANALE DI CONNESSIONE E MICROTUNNELING

1. DEMOLIZIONE PALI CSP PER CONNESSIONE AL CANALE PREFABBRICATO PROVENIENTE DAL NMD
2. REALIZZAZIONE CANALE DI CONNESSIONE TRA NMP E NMD DA COORDINARE CON LA FASE 3.3 DI REALIZZAZIONE DEL BYPASS NORD
3. REALIZZAZIONE CONDOTTE IN MICROTUNNELING

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA

SUB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO

ACEA ATO 2 SPA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. PhD Alessio Delle Site

SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Avv. Vittorio Gennari
Sig.ra Claudia Iacobelli
Ing. Barnaba Paglia

CONSULENTE
Ing. Biagio Eramo

ELABORATO
A194PD SOR D207 0

COD. ATO2 APE10116

DATA OTTOBRE 2022 | SCALA VARIE

Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma
'Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera',
L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

AGG. N.	DATA	NOTE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA
dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano

CUP G33E17000400006

PROGETTO DEFINITIVO

TEAM DI PROGETTAZIONE

CAPO PROGETTO
Ing. Angelo Marchetti

IDRAULICA
Ing. Eugenio Benedini

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
Geol. Stefano Tosti

GEOTECNICA E STRUTTURE
Ing. Angelo Marchetti

ASPETTI AMBIENTALI
Ing. Antonella Litrenta(qualurst)

ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO
Geom. Stefano Franciosi

ATTIVITA' PATRIMONIALI
Geom. Fabio Pampel

Hanno collaborato:
Ing. Geol. Eliseo Paolini
Ing. Viviana Angelino
Ing. Matteo Batticelli
Ing. PhD Chiara Petrelli
Paes. Fabiola Gennaro
Ing. Roberto Biagi
Ing. Claudio Lonasso
Geol. PhD Paolo Caporossi
Geol. Simone Febo
Geol. Yousef Abu Sabha
Geol. Filippo Ansie
Ing. Francesca Gizzi
Geom. Mirco Firinu
Geom. Mariano Troisi
Geom. Valerio Di Carlo
Geom. Fabio Frezza
Geom. Irene Criolesi
Geom. Messito Roberto Zappalà
Geom. Veronica Ceccarelli

NUOVE OPERE DI DERIVAZIONE

INTERVENTI PRESSO LE SORGENTI – PLANIMETRIA E SEZIONI INTERVENTI PER REALIZZAZIONE BYPASS SUD – FASI 5+6 DI 6
