ID	Nome attività	Durata
0	**IPOTESI CRONOPROGRAMMA LAVORI A FINIRE TERMINAL FUSINA**	**535 g**
1	**1 WBE 3.1 - PIAZZALI E SOTTOSERVIZI - 1^FASE**	**80 g**
2	1.1 rete acque meteoriche - 1^FASE	60 g
3	1.2 rete antincendio - 1^FASE	30 g
4	1.3 rete illuminazione - 1^FASE	30 g
5	**2 WBE 3.1 - PIAZZALI E SOTTOSERVIZI - 2^FASE**	**80 g**
6	2.1 rete acque meteoriche - 2^FASE	60 g
7	2.2 rete antincendio - 2^FASE	30 g
8	2.3 rete illuminazione - 2^FASE	30 g
9	**3 WBE 3.1 - PIAZZALI E SOTTOSERVIZI - 3^FASE**	**80 g**
10	3.1 rete acque meteoriche - 3^FASE	60 g
11	3.2 rete antincendio - 3^FASE	30 g
12	3.3 rete illuminazione - 3^FASE	30 g
13	**4 WBE 1 - PIAZZALI - 1^FASE**	**75 g**
14	4.1 sottofondo piazzali - 1^FASE	50 g
15	4.2 ASFALTATURA - 1^FASE COMPLETATA	25 g
16	**5 WBE 1 - PIAZZALI - 2^FASE**	**75 g**
17	5.1 sottofondo piazzali - 2^FASE	50 g
18	5.2 ASFALTATURA - 2^FASE COMPLETATA	25 g
19	**6 WBE 1 - PIAZZALI - 3^FASE**	**75 g**
20	6.1 sottofondo piazzali - 3^FASE	50 g
21	6.2 ASFALTATURA - 3^FASE COMPLETATA	25 g
22	**7 WBE 3.2 - IMPIANTI PIAZZALE - 1^FASE**	**90 g**
23	7.1 illuminazione - 1^FASE	60 g
24	7.2 energia - 1^FASE	40 g
25	7.3 telecomunicazioni-videosorveglianza - 1^FASE	40 g
26	**8 WBE 3.2 - IMPIANTI PIAZZALE - 2^FASE**	**90 g**
27	8.1 illuminazione - 2^FASE	60 g
28	8.2 energia - 2^FASE	40 g
29	8.3 telecomunicazioni-videosorveglianza - 2^FASE	40 g
30	**9 WBE 3.2 - IMPIANTI PIAZZALE - 3^FASE**	**90 g**
31	9.1 illuminazione - 3^FASE	60 g
32	9.2 energia - 3^FASE	40 g
33	9.3 telecomunicazioni-videosorveglianza - 3^FASE	40 g

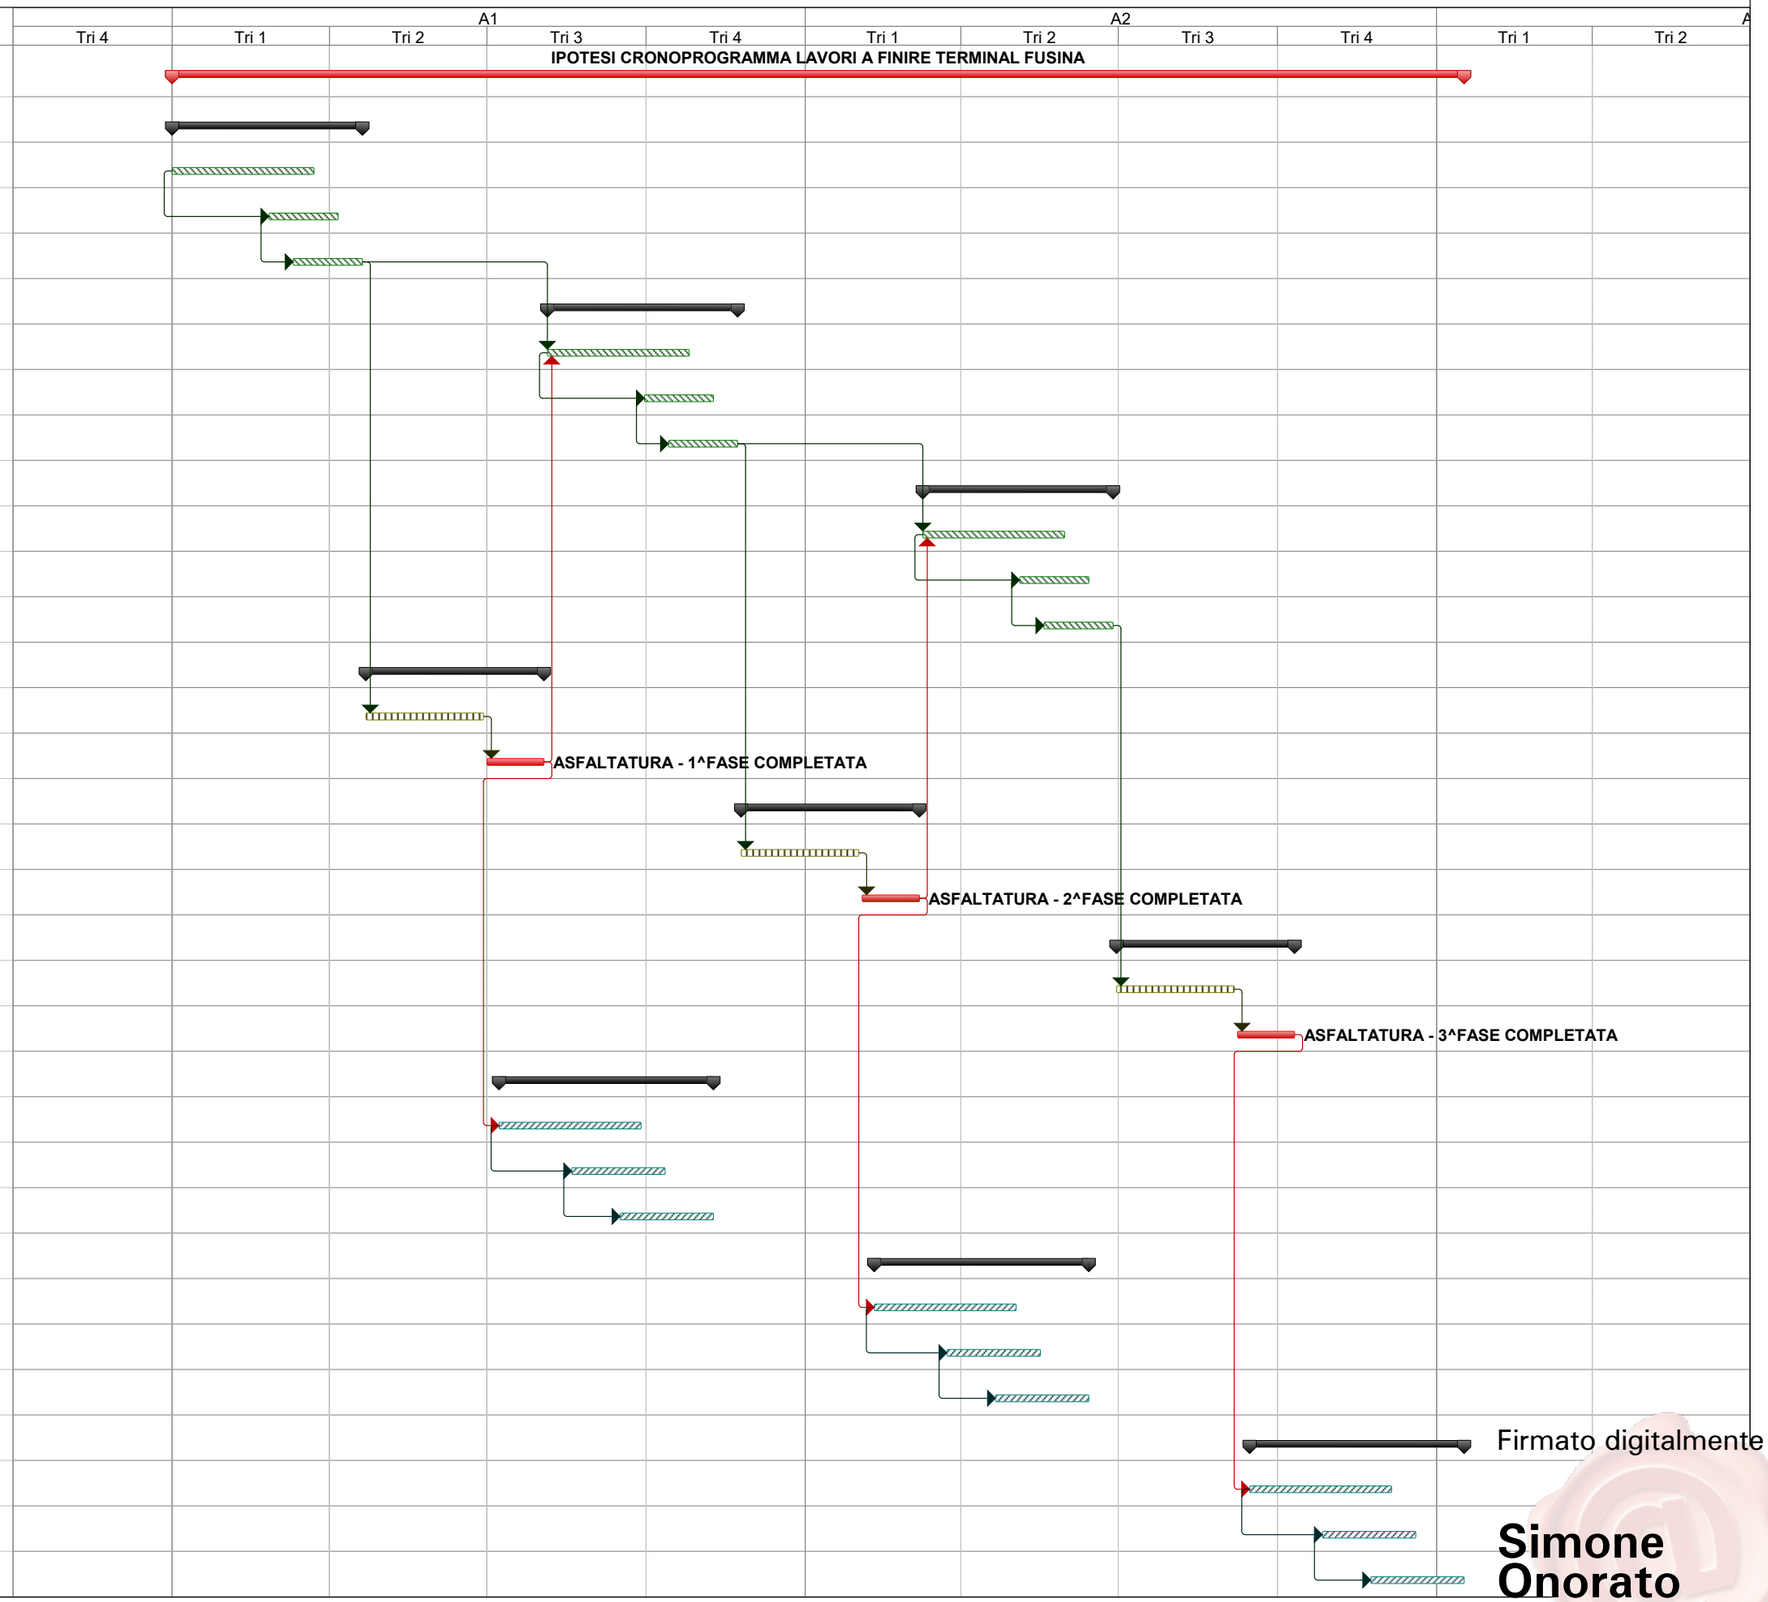

Firmato digitalmente da
Simone Onorato
