RS06REL0018A0

VCC Energia Licata Srl

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMUNE DI LICATA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
COMUNE DI BUTERA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 93,5 MW

"AGRABONA"

REL.14

CRONOPROGRAMMA

Committente:
VCC Energia Licata Srl
Via Oreste Ranelletti, 281 - 67043 - Celano (AQ)
P.IVA e C.F.: 02114010669

VCC Energia Licata srl
Il Rappresentante Legale

PROGETTO DEFINITIVO

Data: 10/11/2021

Rev. 01

PROGETTO REDATTO DA: VCC Trapani Srl

Il progettista:
Ing. Giuseppe Morgante

1.PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'artt.23-24-25 D.Lgs. 152/2006.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, costituito da 17 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 5,50 MW, per una potenza complessiva pari a 93,50 MW.
Il soggetto proponente sarà in grado di realizzare l'intero impianto nei tempi previsti nel cronoprogramma che segue. Il tempo previsto sarà sufficiente in quanto l'intera organizzazione dei lavori è strutturata su un gruppo di lavoro che opererà nella realizzazione di due cluster di aerogeneratori per volta, l'intero impianto ne comprende quattro in totale.
Altro elemento che contribuirà fortemente al contenimento dei tempi di realizzazione è l'inserimento nelle aree di cantiere di adeguati impianti mobili per la produzione del calcestruzzo, necessario per i plinti di fondazione, i quali saranno alimentati dagli stessi inerti provenienti dagli scavi delle fondazioni e dei cavidotti previa frantumazione e vagliatura degli stessi mediante impianti mobili su cingoli che produrranno gli aggregati per la produzione del calcestruzzo e la sabbia per la copertura di tutti i cavi interrati.
L'organizzazione dei lavori ha previsto di usare le aree da adibire a deposito provvisorio delle pale e delle torri eoliche per il meno possibile in quanto verranno impiegate le stesse piazzole destinate ad ospitare le gru per il montaggio degli aerogeneratori.
Per il rispetto dei tempi del presente cronoprogramma anche il montaggio degli aerogeneratori avverrà con l'impiego di un numero adeguato di gru prevedendo il montaggio degli stessi in due unità a settimana che tengono conto dei fermi per inadeguatezza delle condizioni atmosferiche (in particolare la velocità del vento non compatibile con i montaggi).

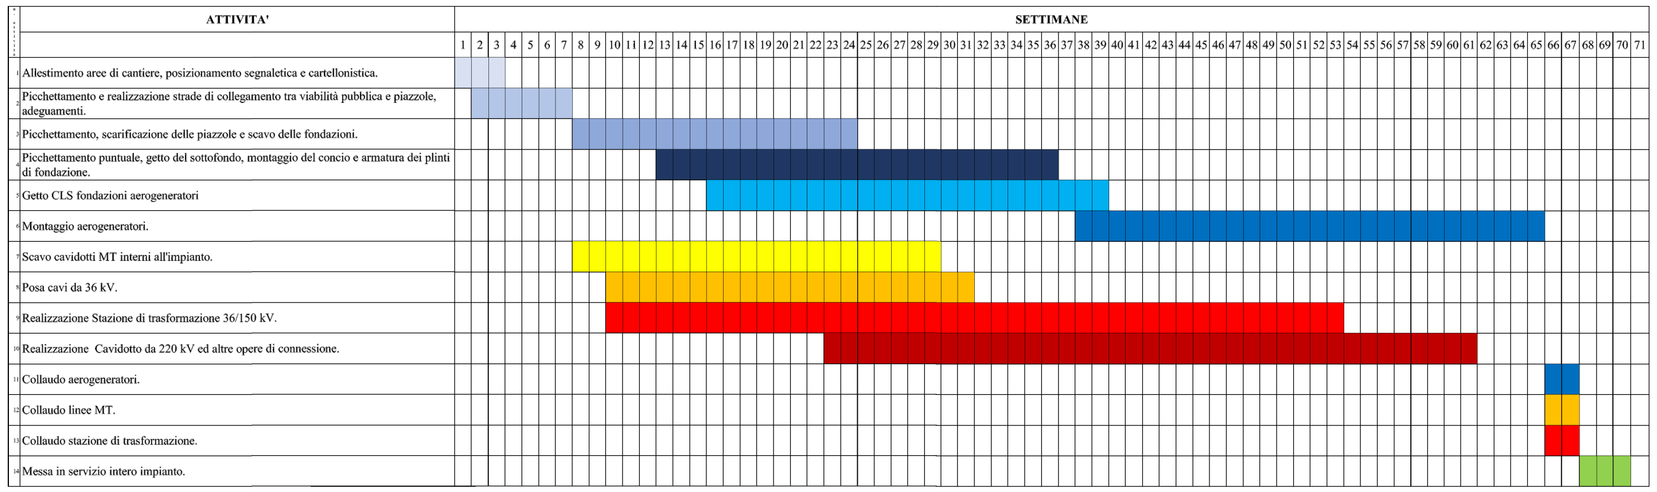

Firmato digitalmente da:
MORGANTE GIUSEPPE
Firmato il 30/06/2022 15:33
Seriale Certificato: 144285
Valido dal 11/02/2021 al 11/02/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:
VILLA CLAUDIA
Firmato il 01/07/2022 09:20
Seriale Certificato: 790118
Valido dal 04/10/2021 al 04/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
