QUADRO D'UNIONE

LEGENDA

- VIABILITA' SECONDARIA ESISTENTE DA ADEGUARE
- PISTE DI CANTIERE DI NUOVA REALIZZAZIONE DA DISMETTERE AL TERMINE DEI LAVORI
- ACCESSO ALLE AREE DI INTERVENTO TRAMITE NUOVE PISTE DI CANTIERE DA REALIZZARE LUNGO LA VIABILITA' ESISTENTE (Piste di cantiere all'interno dei limiti di esproprio/occupazione temporanea)
- ASSE DI PERCORRENZA TRAFFICO VEICOLARE
- ASSE SENSO UNICO ALTERNATO
- LAVORI IN CORSO

FASE 0

Attivita' propedeutiche
- Acquisizione delle aree
- BOE Superficiale e profonda
- Risoluzione interferenze manufatti interferenti
- Bse superficiale e profonda
- Risoluzione interferenze sottoservizi a cura Enti Proprietari

Cantierizzazione
- Allestimento cantiere
- Predisposizione piste di cantiere

FASE 1.0

SEDE STRADALE ASSE PRINCIPALE, SVINCOLI, VIABILITA' SECONDARIE E OPERE MINORI

Svincolo "Firenzuola" e sede fino al km 0+115.00
- Movimenti terra

Sede dal km 0+288.26 al km 0+658.09
- Movimenti terra
- Realizzazione attraversamenti faunistici e tombini

Sede dal km 0+907.83 al km 1+243.26
- Movimenti terra

Deviazione Viabilità secondaria Asse "D" - Crocemarroggia al km 1+715.02
- Movimenti terra

Deviazione Viabilità Asse "E" - SS.418 al km 2+217.64
- Movimenti terra

Deviazione Viabilità secondaria Asse "F" - Strada poderale al km 3+433.48
- Movimenti terra

Deviazione Viabilità Asse "G" - Strada vicinale al km 3+509.31
- Movimenti terra

Deviazione Viabilità secondaria Asse "H" - Strada poderale al km 3+542.89
- Movimenti terra

OPERE D'ARTE PRINCIPALI

Galleria artificiale "La Romanella" - da km 0+115.05 a km 0+288.26 - L=173 m

Realizzazione gallería
- Paratie di pali provvisionali
- Scavi con esecuzione progressiva dei puntoni
- Realizzazione struttura galleria

Galleria artificiale "Colle del Vento" - da km 0+658.09 a km 0+907.83 - L=225 m

Realizzazione gallería
- Paratie di pali provvisionali
- Scavi con esecuzione progressiva dei puntoni
- Realizzazione struttura galleria

Viadotto "Marroggia 1" da km 1+243.26 a km 2+176.77 – L=990m
- Sistemazione spondale Torrente Marroggia
- Scavi di fondazione e Pali di fondazione
- Pile e spalle

Viadotto "Molino vecchio" da km 2+904.74 a km 3+654.05 - L=750m
- Sistemazione spondale Fosso Sant'Antonio
- Scavi di fondazione e Pali di fondazione
- Pile e spalle

OPERE D'ARTE MINORI

Cavalcavia cimitero al km 1+107.46

- Paratie di Pali
- Elevazione spalle
- Varo impalcato
- Getto soletta

TRAFFICO VEICOLARE
- Svincolo "Firenzuola - Ramo Nord" senso unico alternato su sede esistente
- Da Km 0 a 1+900 doppio senso di marcia su sede esistente
- Da Km 1+900 a 2+300 senso unico alternato su sede esistente
- Da Km 2+300 a fine totto doppio senso di marcia su sede esistente

SEZIONE N°47
PROGRESSIVA 2280.0
SCALA 1:200

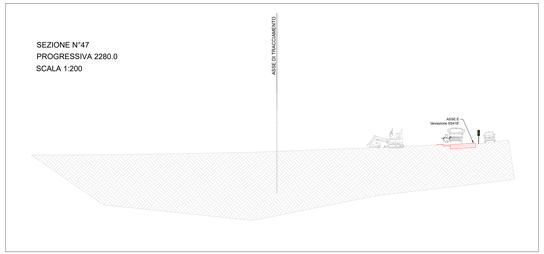

SEZIONE N°59
PROGRESSIVA 2575
SCALA 1:200

SEZIONE N°73
PROGRESSIVA 2900.80
SCALA 1:200



SEZIONE N°100
PROGRESSIVA 4200
SCALA 1:200



SEZIONE N°107
PROGRESSIVA 4370.36
SCALA 1:200



anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
TRATTO SPOLETO - ACQUASPARTA
1° stralcio: Madonna di Baiano-Firenzuola

PROGETTO ESECUTIVO — COD. PG143

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE MANDATARIA
Dott. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A331	sintagma
IL PROGETTISTA Dott. Ing. Federico Scandurra Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n°1684	Dott.Ing. N.Granieri Dott.Ing. F.Scandurra Dott.Ing. V.Lattuca Dott.Ing. A.Graziosi Dott.Ing. F.Cavallini Dott.Ing. E.Zampaglione Dott.Ing. L.Grande Dott.Ing. G.Grande Dott.Ing. F.Grande Dott.Ing. L.Zenti Dott.Ing. F.Pani Dott.Ing. Alessandro Ferrara
IL GEOLOGO Dott. Geologo Luca Longaretti Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°128	GEOLOGIA E GEOTECNICA
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Dott. Ing. Filippo Pambianco Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1273	ICARIA Dott.Ing. C.Carlenzoli Dott.Ing. A.Cipiccia Dott.Ing. C.Cipiccia Dott.Ing. C.Loffreno Dott.Ing. L.Saverdino
IL Responsabile di Progetto Arch. Pianificatore Marco Chiocci	Dott.Ing. A.Bellantoni Dott.Ing. C.Cipiccia Dott.Ing. L.Zenti Dott.Ing. F.Pani Dott.Ing. E.Zagaroli
IL Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Micheli Alessandro Micheli	

PROTOCOLLO	DATA

17.CANTIERI E FASI ESECUTIVE
17.01 ELABORATI GENERALI

Fasi di lavoro dell'opera - Tav. 2/8

CODICE PROGETTO				NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO		T00CA00CANPP03.dgn		
DTPG1143	E	23	CODICE ELAB.	T00CA00CANPP03	B	1:2000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Rev. a seguito ott. ANAS	Set 2023	F.Marchetti	V.Pellicciari	A.Granieri
A	Emissione	Apr 2023	F.Marchetti	V.Pellicciari	A.Granieri
