COMUNE DI SIRACUSA

TITOLO PROGETTO:

RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'APPRODO TURISTICO "MARINA DI SIRACUSA" SVILUPPATO SULLA BASE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO PRESENTATO E DISCUSSO IN CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 15.02.2021

Firmato digitalmente da:

PAOLO CALAFIORE

COMMITTENTE

S.P.E.R.O. s.r.l.
Via Elorina 29 - 96100 Siracusa - Italy

PROGETTISTA GENERALE

TEAMNETWORK s.r.l. - Engineering & Management
Via Luigi Spagna 50/L-M, 96100 Siracusa - Italy

TEAMNETWORK TEAM ENGINEERING AND MANAGEMENT

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Scala	Formato
FILE	

PROGETTISTA

Progettista architettonico:
Arch. Mario Rizza
Progettista strutture ed impianti:
Ing. Paolo Calafiore
Geologia e Ambiente:
Dott. G. Bellomo
Dott. G. Anselmo

NUMERO DOCUMENTO

IMM12-08	MdS	PD	REL	PL	96	R0	
JOB N.	COD. 1	COD. 2	COD. 3	COD. 4	COD. 5	REV. n.	

N. REV	DATA	DESCRIZIONE	DRW.	CHK.	APP.

ID	Nome attività	Durata
1	**ESECUZIONE LAVORI**	**1080 g**
2	**CANTIERIZZAZIONE**	30 g
3	**OPERE A MARE**	**825 g**
4	**DRAGAGGIO**	300 g
5	**COLMATA**	**210 g**
6	Demolizioni e salpamenti	30 g
7	Rilevato per palificata	60 g
8	Palificata	120 g
9	Jet grouting	90 g
10	Cassoncini antiriflettenti	150 g
11	Cunicolo servizi	90 g
12	Rinterro	60 g
13	**MOLO FORANEO**	**150 g**
14	Palificata	120 g
15	Graticcio di collegamento	120 g
16	Impalcato	120 g
17	**PENNELLO**	**60 g**
18	Nucleo	30 g
19	Mantellata in massi	50 g
20	**RIPASCIMENTO**	**120 g**
21	Rimozione strato coticale	30 g
22	Posa geotessuto	30 g
23	Posa geosacchi	30 g
24	Ricostituzione arenile	30 g
25	**Ponti di collegamento stradale**	**240 g**
26	Accesso principale	90 g
27	Collegamento area cantieri	60 g
28	Ponte pedonale	90 g
29	**OPERE A TERRA**	**900 g**
30	**EDIFICI SD5-SD6**	**225 g**
31	Fondazioni	120 g
32	Struttura in elevazione	120 g
33	Murature	90 g
34	Rivestimenti e finiture	120 g
35	Impianti	90 g
36	**EDIFICIO SD7**	**195 g**
37	Fondazioni	60 g
38	Struttura in elevazione	60 g
39	Murature	60 g
40	Rivestimenti e finiture	90 g
41	Impianti	90 g
42	**EDIFICI SD1-SD2-SD3-SD4**	**270 g**
43	Fondazioni	120 g
44	Struttura in elevazione	120 g
45	Murature	120 g
46	Rivestimenti e finiture	150 g
47	Impianti	120 g
48	**EDIFICI CT1-CT2-CT3**	**135 g**
49	Fondazioni	60 g
50	Struttura in elevazione	60 g
51	Murature	60 g
52	Rivestimentie finiture	60 g
53	Impianti	60 g
54	**EDIFICIO SD8**	**180 g**
55	Fondazioni	30 g
56	Struttura in elevazione	60 g
57	Murature	60 g
58	Rivestimenti e finiture	60 g
59	Impianti	60 g
60	**EDIFICI SERVIZI**	**150 g**
61	Fondazioni	60 g
62	Struttura in elevazione	60 g
63	Murature	60 g
64	Rivestimenti e finiture	30 g
65	Impianti	60 g
66	**PARCHEGGIO IPOGEO**	**240 g**
67	Fondazioni	90 g
68	Struttura in elevazione	120 g
69	Murature	90 g
70	Rivestimenti e finiture	90 g
71	Impianti	120 g
72	**VIABILITA'**	**765 g**
73	Rilevato strada accesso	30 g
74	Strade e parcheggi a raso	75 g
75	**PIAZZALI E AREE ESTERNE**	**210 g**
76	Sottoservizi	60 g
77	Aree a verde	60 g
78	Pavimentazioni	120 g
79	Recinzioni	30 g
80	Arredo urbano e segnaletica	30 g
81	**IMPIANTI E SERVIZI A RETE**	**180 g**
82	Drenaggio e fognatura	90 g
83	Centrale idrica e antincendio	90 g
84	Illuminazione stradale ed esterni	90 g
85	**ARREDO POTUALE**	**225 g**
86	Pontili e ancoraggi	90 g
87	Colonnine servizi	60 g
88	Bitte e parabordi	60 g
89	Fanale	15 g

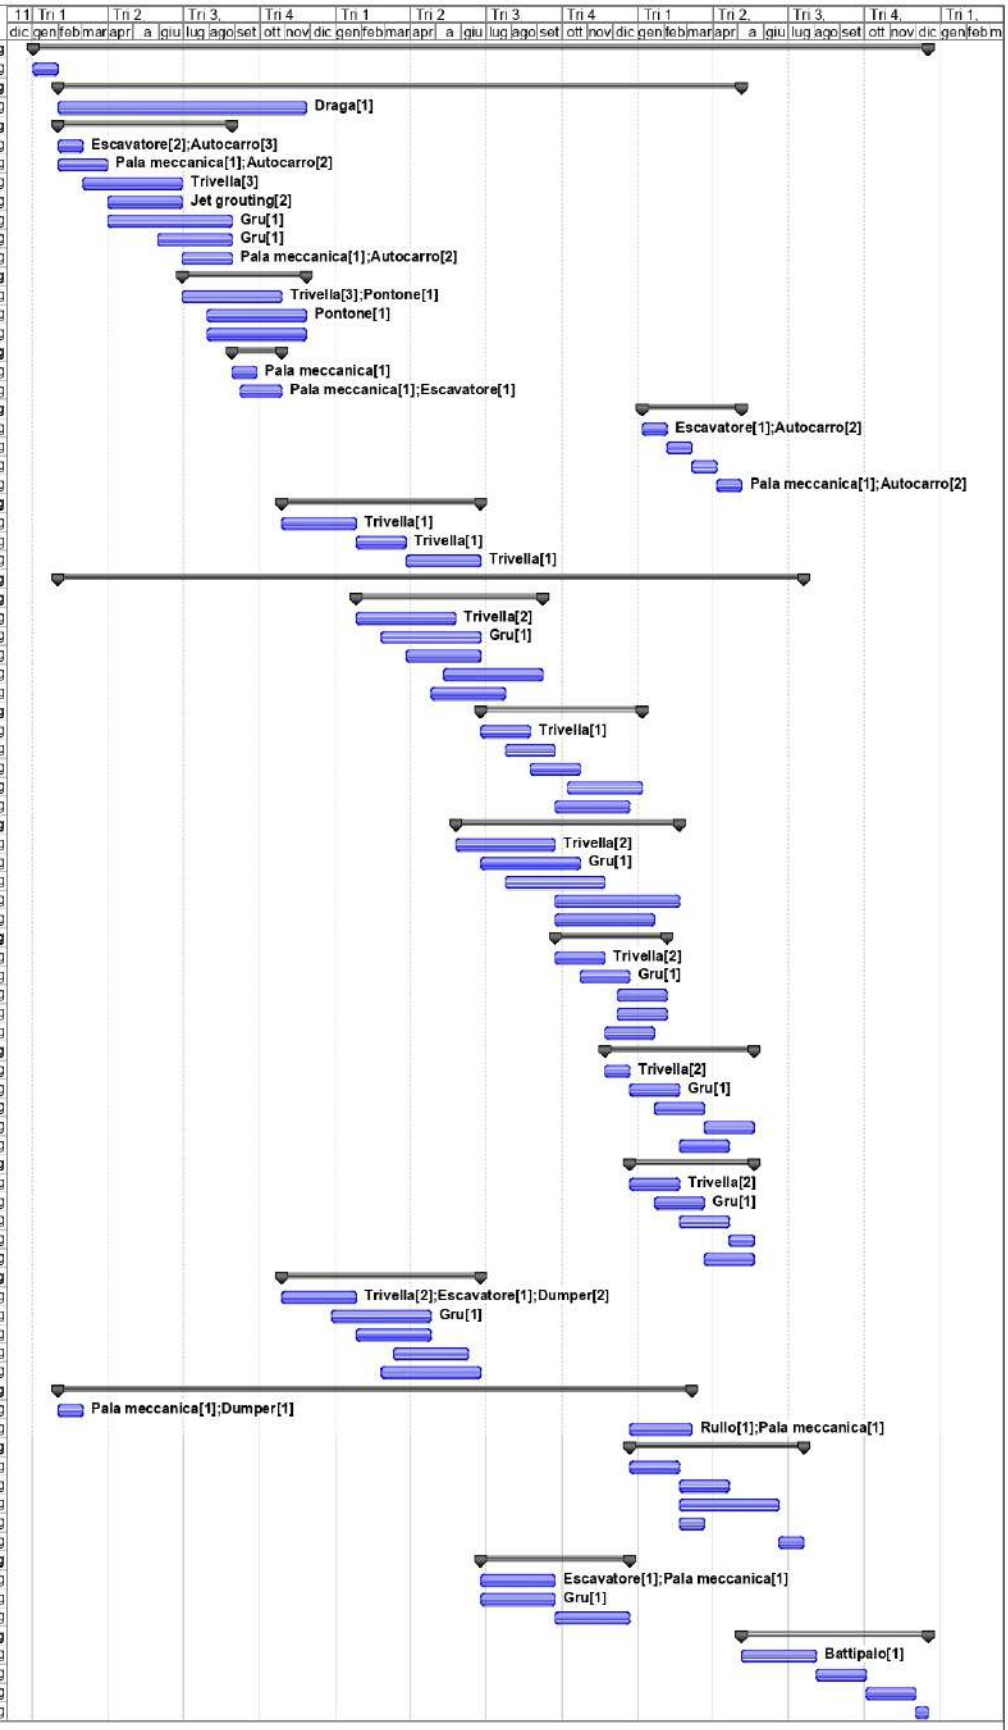

Attività		Cardine		Attività esterna	
Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	
