IMPIANTO IDROELETTRICO DI BUDRIESSE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Nome attività	Durata
1	INIZIO ATTIVITA' DI CANTIERE	0 g
2	Approntamento cantiere in sponda destra	15 g
3	Approntamento cantiere in sponda sinistra	10 g
4	**Spalla sinistra**	**83 g**
5	Realizzazione tura e accessi	10 g
6	Infissione palancole	10 g
7	Preparazione del piano di fondazione	4 g
8	Realizzazione del taglione di monte	10 g
9	Realizzazione dei pali a valle	5 g
10	Profilatura scavo, magrone e posa ferro	4 g
11	Getto della fondazione di calcestruzzo	10 g
12	Armatura pile	5 g
13	Getto muri in elevazione delle pile	3 g
14	Realizzazione delle scogliere	5 g
15	Rimozione tura	2 g
16	**Prima campata**	**166 g**
17	Approntamento tura per la prima campata	10 g
18	Preparazione del piano di fondazione	5 g
19	Realizzazione del taglione di monte	15 g
20	Realizzazione dei pali a valle	5 g
21	Profilatura scavo, magrone e posa ferro	3 g
22	Posa tubi aria e aggiandi per le ventole	2 g
23	Getto della fondazione di calcestruzzo	2 g
24	Armatura pile	5 g
25	Getto muri in elevazione delle pile	1 g
26	Posa scudi laterali e parti da inghisare	4 g
27	Getto parti da inghisare	3 g
28	Posa della parte mobile	20 g
29	Getti di inghisaggio di seconda fase	3 g
30	Scogliere di protezione a valle e a monte	2 g
31	Collegamenti idraulici, elettrici	8 g
32	Prove	3 g
33	INTERRUZIONI PER PIENA	45 g
34	**Seconda campata**	**191 g**
35	Posa tubi per guado	10 g
36	Approntamento tura per la seconda campata	10 g
37	Preparazione del piano di fondazione	5 g
38	Realizzazione del taglione di monte	15 g
39	Realizzazione dei pali a valle	5 g
40	Profilatura scavo, magrone e posa ferro	3 g
41	Posa tubi aria e aggiandi per le ventole	2 g
42	Getto della fondazione di calcestruzzo	2 g
43	Armatura pile	5 g
44	Getto muri in elevazione delle pile	1 g
45	Posa scudi laterali e parti da inghisare	4 g
46	Getto parti da inghisare	3 g
47	Posa della parte mobile	20 g
48	Getti di inghisaggio di seconda fase	3 g
49	Scogliere di protezione a valle e a monte	2 g
50	Collegamenti idraulici, elettrici	8 g
51	Prove	3 g
52	INTERRUZIONI PER PIENA	45 g
53	**Terza campata**	**191 g**
54	Posa tubi per guado	10 g
55	Approntamento tura per la terza campata	10 g
56	Preparazione del piano di fondazione	5 g
57	Realizzazione del taglione di monte	15 g
58	Realizzazione dei pali a valle	5 g
59	Profilatura scavo, magrone e posa ferro	3 g
60	Posa tubi aria e aggiandi per le ventole	2 g
61	Getto della fondazione di calcestruzzo	2 g
62	Armatura pile	5 g
63	Getto muri in elevazione delle pile	1 g
64	Posa scudi laterali e parti da inghisare	4 g
65	Getto parti da inghisare	3 g
66	Posa della parte mobile	20 g
67	Getti di inghisaggio di seconda fase	3 g
68	Scogliere di protezione a valle e a monte	2 g
69	Collegamenti idraulici, elettrici	8 g
70	Prove	3 g
71	**CENTRALE, ADDUZIONE E SCARICO**	**802 g**
72	Scavo fino alla quota 32.50	10 g
73	Preparazione cordoli per i diaframmi	15 g
74	Realizzazione dei diaframmi	40 g
75	Realizzazione del tappo di fondo jet-grouting	30 g
76	Scavo all'interno dei diaframmi	20 g
77	Getti di fondazione delle centrale	20 g
78	Posa dei diffusori delle turbine	10 g
79	Getto di inghisaggio dei diffusori	15 g
80	Getti in elevazione	60 g
81	Getti solette	20 g
82	Posa torretta d'accesso	5 g
83	Impermeabilizzazioni	10 g
84	Rinterri	2 g
85	Intonaci	10 g
86	Tinteggiature	5 g
87	Pavimenti	4 g
88	Serramenti	5 g
89	Parapetti	3 g
90	Sistema d'aerazione	5 g
91	Montaggio carroponte	5 g
92	Montaggio gruppi idroelettrici	40 g
93	Quadri, collegamenti elettrici e oleodinamici	60 g
94	Scavo dei canali di carico e delle opere di presa	10 g
95	Getti di fondazione canali	10 g
96	Elevazioni canali	15 g
97	Soletta canali	15 g
98	Getti di fondazione opere di presa	10 g
99	Getti elevazione opere di presa	5 g
100	Solette opere di presa	5 g
101	Rinterri canali	2 g
102	Montaggio organi idraulici	45 g
103	Scavi canale di scarico	5 g
104	Fondazioni canale di scarico	5 g
105	Elevazioni canale di scarico	5 g
106	Scogliere canale di scarico	4 g
107	Opere accessorie e finiture	5 g
108	Formazione strade e piazzali	3 g
109	**Realizzazione scala pesci e scarico di fondo**	**54 g**
110	Getti delle strutture di fondazione	20 g
111	Getti delle strutture in elevazione	25 g
112	Rimozione palancole	3 g
113	Formazione scogliere di monte	3 g
114	Formazione scogliere di valle	3 g
115	Rimozione tura nel fiume	10 g
116	Rimozione tura davanti alla presa	5 g
117	Rimozione tura davanti al canale di restituzione	6 g
118	**Collegamento con rete elettrica**	**47 g**
119	Realizzazione del cavidotto	30 g
120	Montaggio cabina prefabbricata	2 g
121	Montaggio parte elettrica	5 g
122	Collegamenti elettrici	10 g
123	**SISTEMAZIONI AMBIENTALI**	**22 g**
124	Stesura terreno da coltivo	5 g
125	Piantumazioni	5 g
126	Semina	2 g
127	Rimozione cantieri e ripristino aree	10 g
128	**Fine lavori civili e idraulici**	**0 g**
129	**Messa in servizio**	**40 g**
130	Prove in bianco fino al primo parallelo	20 g
131	Inizio esercizio provvisorio	10 g
132	Collaudi	10 g
133	Esercizio definitivo	0 g

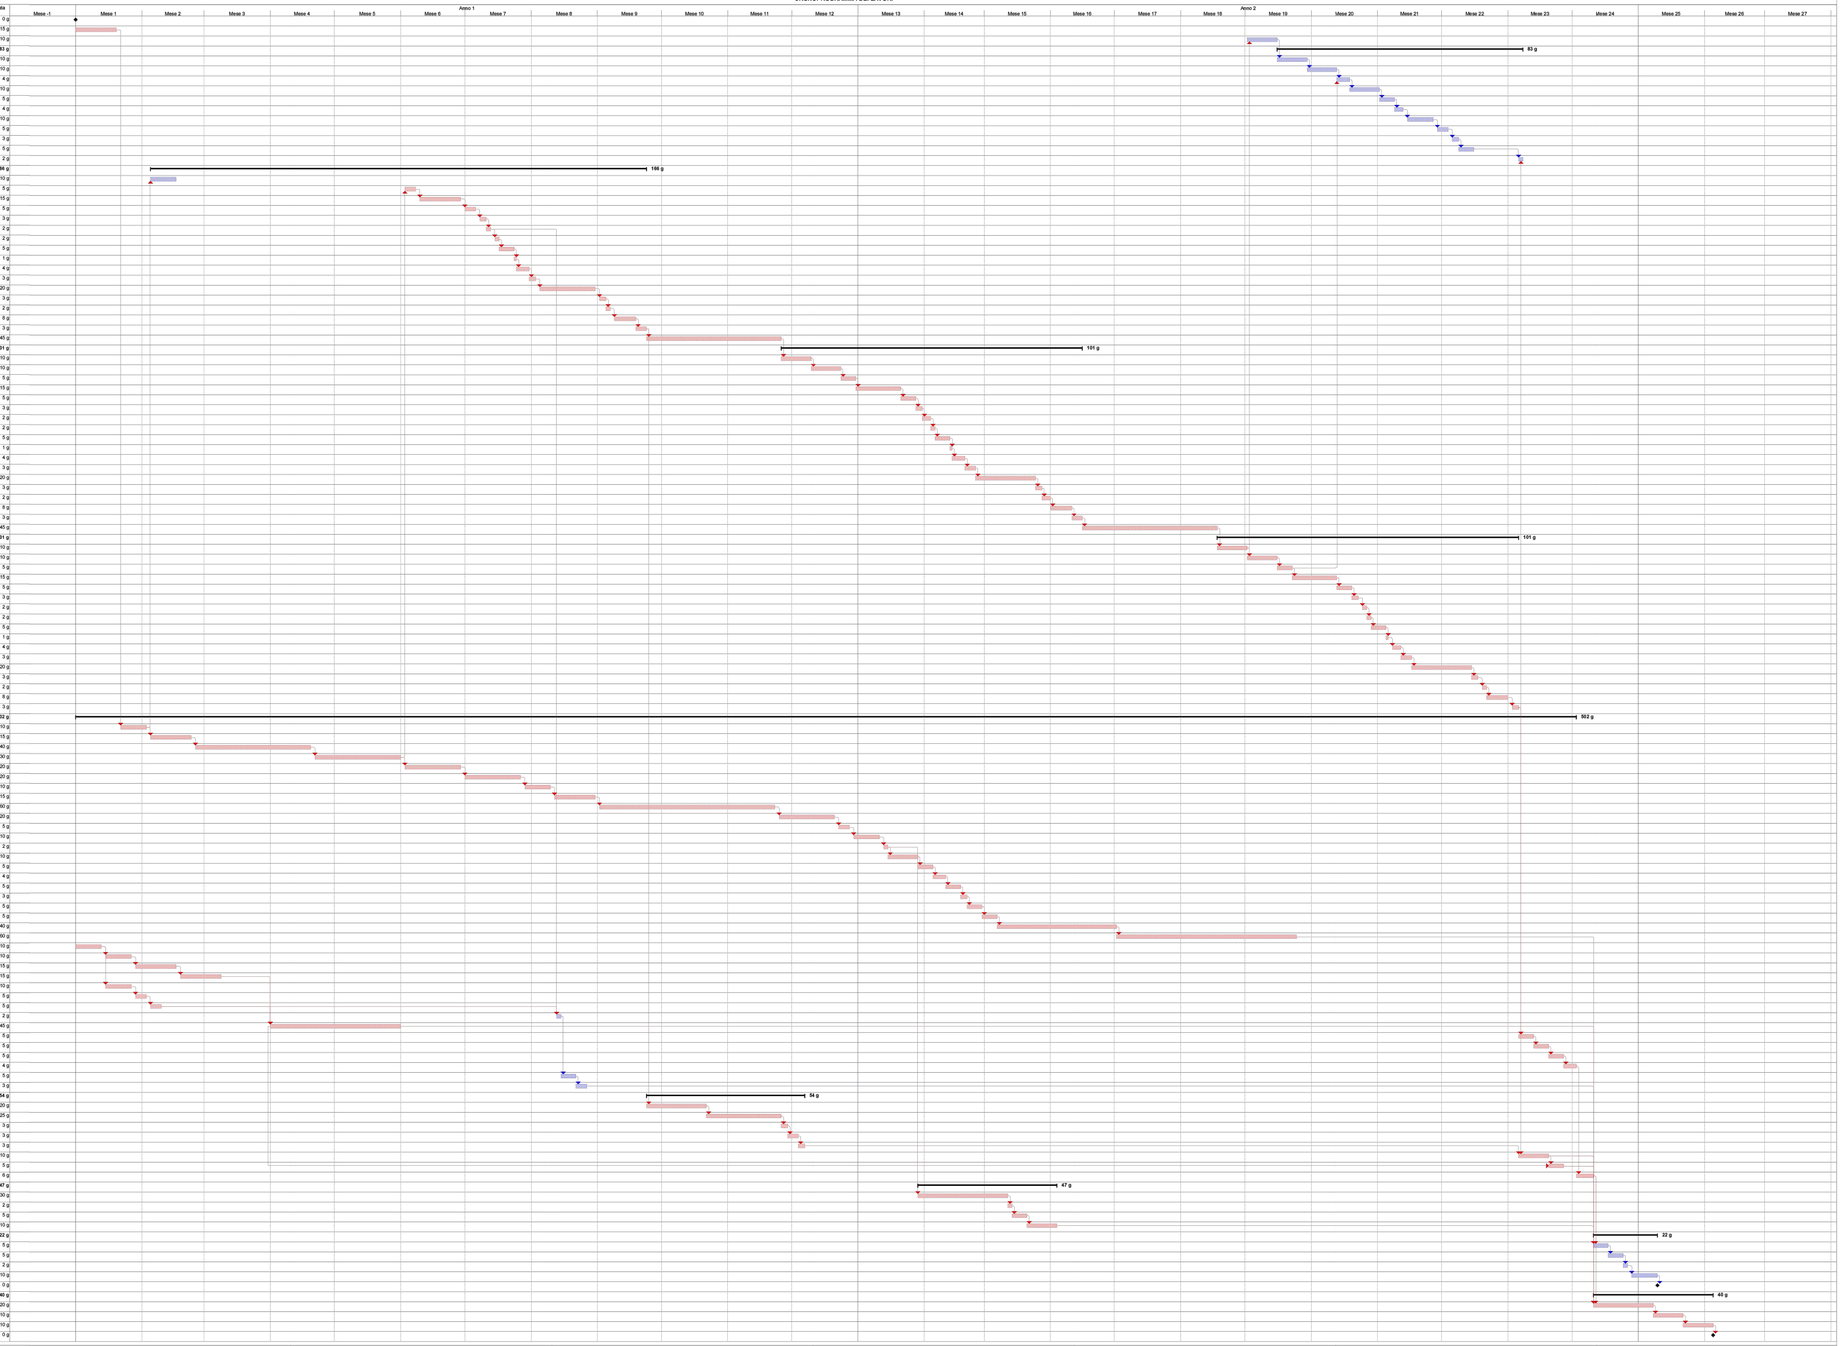

Progetto: Cronoprogramma Budriesse
Data: gio 14/09/23

Attività | Attività critica | Cardine | Attività riportata | Cardine riportato | Divisione | Riepilogo progetto | Cardine inattiva | Attività manuale | Riporto riepilogo manuale | Solo inizio | Attività esterne | Scadenza
Avanzamento attività | Avanzamento attività critica | Riepilogo | Attività critica riportata | Avanzamento riportato | Attività esterne | Riepilogo raggruppamento | Riepilogo inattiva | Solo durata | Riepilogo manuale | Solo fine | Cardine esterno

mod.	oggetto della modifica	dis.	ver.	app.	data
A	Revisione generale	RdV	PF		13-11-2023

STRATEGIES FOR WATER
FROSIO next
TAV RdV PF MF 14-09-2023
Tel. +39-030-3702371
Fax. +39-030-396143
e-mail: info@frosionext.com

IMPIANTO IDROELETTRICO BUDRIESSE
Progetto definitivo
Cronoprogramma dei lavori

scale

Commessa **1419**

COMMITTENTE: *EDISON S.P.A.*

disegno n° ***000 3335***

Questo disegno non può essere riprodotto, nè utilizzato altrove, nè ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori.
