CRONOPROGRAMMA TEMPIO PAUSANIA

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 42 MW COSTITUITO DA N.7 AEROGENERATORI DI POTENZA PARI A 6 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA – IMPIANTO DENOMINATO "TEMPIO PAUSANIA WIND" UBICATO NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SS)

ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO
A) Recinzione e apprestamenti del cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1	1
Impianti di servizio del cantiere		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	1
Scavi e rinterri		
Scavo a sezione obbligata	3	3
Rinterro di scavo eseguito a macchina	6	3
Fondazione per Eolico a terra		
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	6	6
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	12	6
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	18	4
Installazione Eolico		
Montaggio componenti di impianto eolico	22	4
Installazione di impianto eolico	26	16
Recinzione per eolico a terra		
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	42	4
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strut	46	1
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	47	1
Posa di recinzioni e cancellate	48	1
Smobilizzo del cantiere		
Pulizia generale dell'area di cantiere	49	2
Smobilizzo del cantiere	51	1

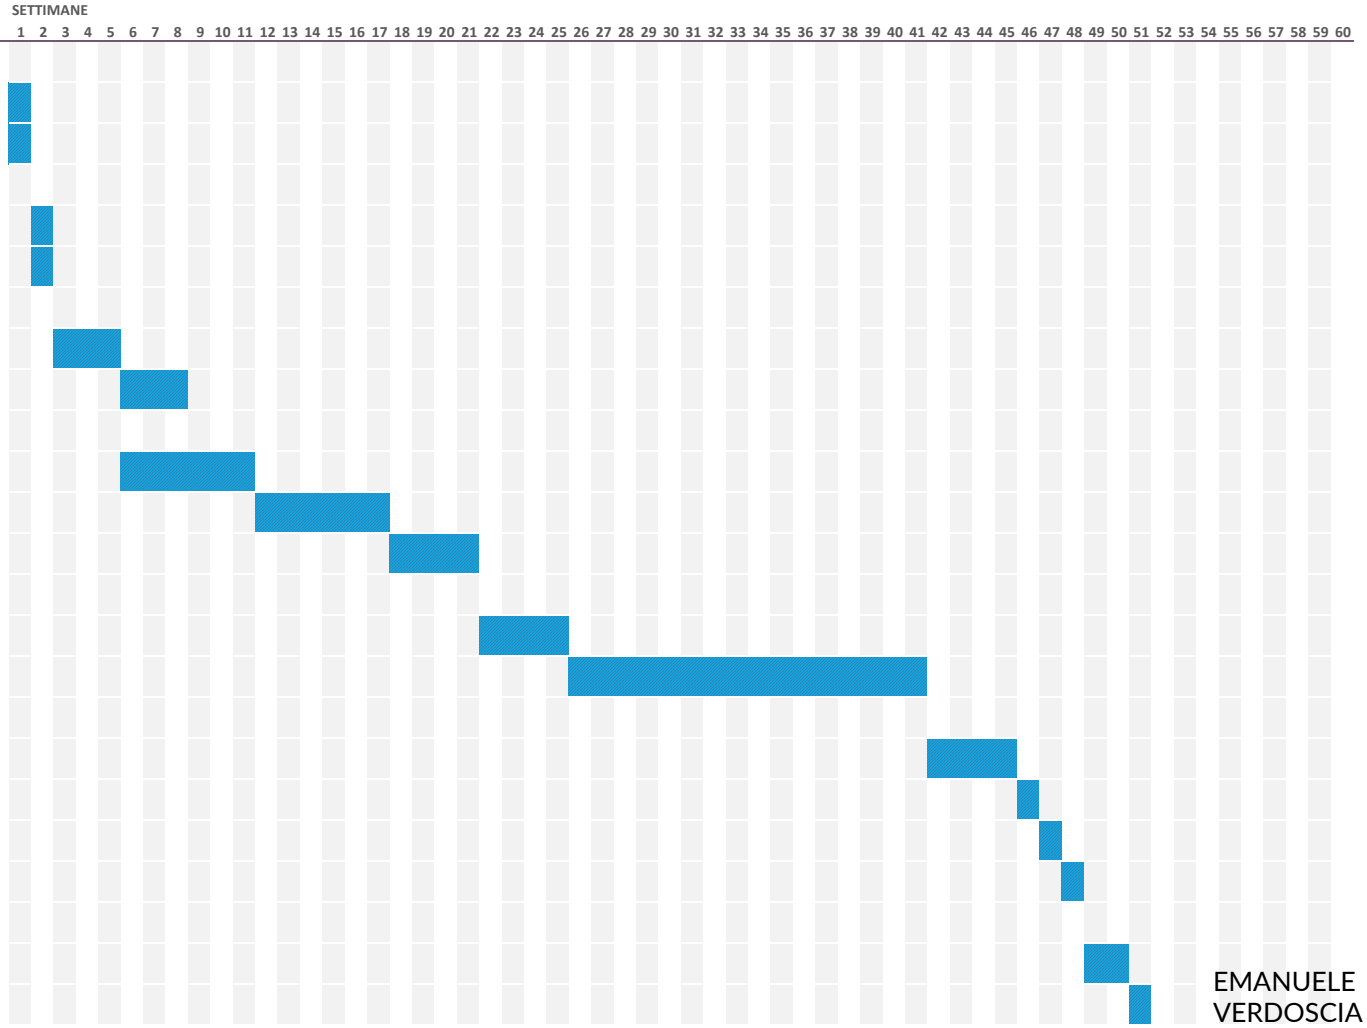

EMANUELE VERDOSCIA
28.11.2023
12:22:59
GMT+00:00
