A	23.11.2023	034	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

COMMITTENTE

SETTE SORELLE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 12
39100 Bolzano (BZ)
P.I. 03186330217

IMPIANTO

SE 380/132/36 kV CARISIO

INGEGNERIA & COSTRUZIONI

BRULLI trasmissione

TITOLO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO
-	A3	1 / 2	35802A

ID	Nome attività
1	**Milestones**
2	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio
3	Voltura autorizzazione a Terna
4	Messa in servizio ampliamento SE 380/132/36 kV Carisio
5	Termine delle attività
6	**Progettazione**
7	Elaborati generali di commessa
8	**Stazione elettrica SE 380/132/36 kV Carisio**
9	**Progettazione esecutiva**
10	Rilievo topografico area stazione elettrica
11	Elaborati costruttivi opere civili
12	Elaborati costruttivi opere meccaniche
13	Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT
14	Progetto elettrico sistema di automazione & controllo
15	Riesame della progettazione
16	Approvazione progetto esecutivo
17	**Approvvigionamenti**
18	RdO, ordine, costruzione e collaudo TR AAT/AT
19	RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT
20	RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri 36 kV
21	RdO e subappalto opere civili
22	RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici
23	RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT
24	RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio
25	RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc
26	RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT
27	RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo
28	RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT
29	**Esecuzione opere**
30	**OOCC**
31	Allestimento cantiere e vie di accesso
32	Tracciatura capisaldi
33	Realizzazione fondazione fabbricati
34	Realizzazione fondazioni trasformatori AAT/AT
35	Realizzazione fondazioni apparecchiature AT
36	Realizzazione rete di terra primaria
37	Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche
38	Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura
39	Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade
40	Realizzazione recinzione
41	Asfaltature strade
42	Sistemazione aree a verde
43	**Montaggi elettromeccanici**
44	Posa trasformatori AAT/AT
45	Posa carpenterie metalliche
46	Posa apparecchiature AT
47	Montaggio sbarre AT e collegamenti AT
48	Realizzazione rete di terra secondaria
49	**Montaggi 36 kV, MT/BT**
50	Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna
51	Posa quadri 36 kV
52	Posa apparecchiature MT
53	Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc
54	Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo
55	Posa e collegamento cavi MT e BT
56	**Collaudi e MIS**
57	Verifiche di passo e contatto rete di terra
58	Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc
59	Collaudo apparecchiature AT di piazzale
60	Collaudo quadri 36 kV
61	Taratura protezioni di linea e di impianto
62	Disponibilità rete dati per teleconduzione
63	Collaudo e verifiche SCADA
64	**Ripristini e smobilizzo cantiere**

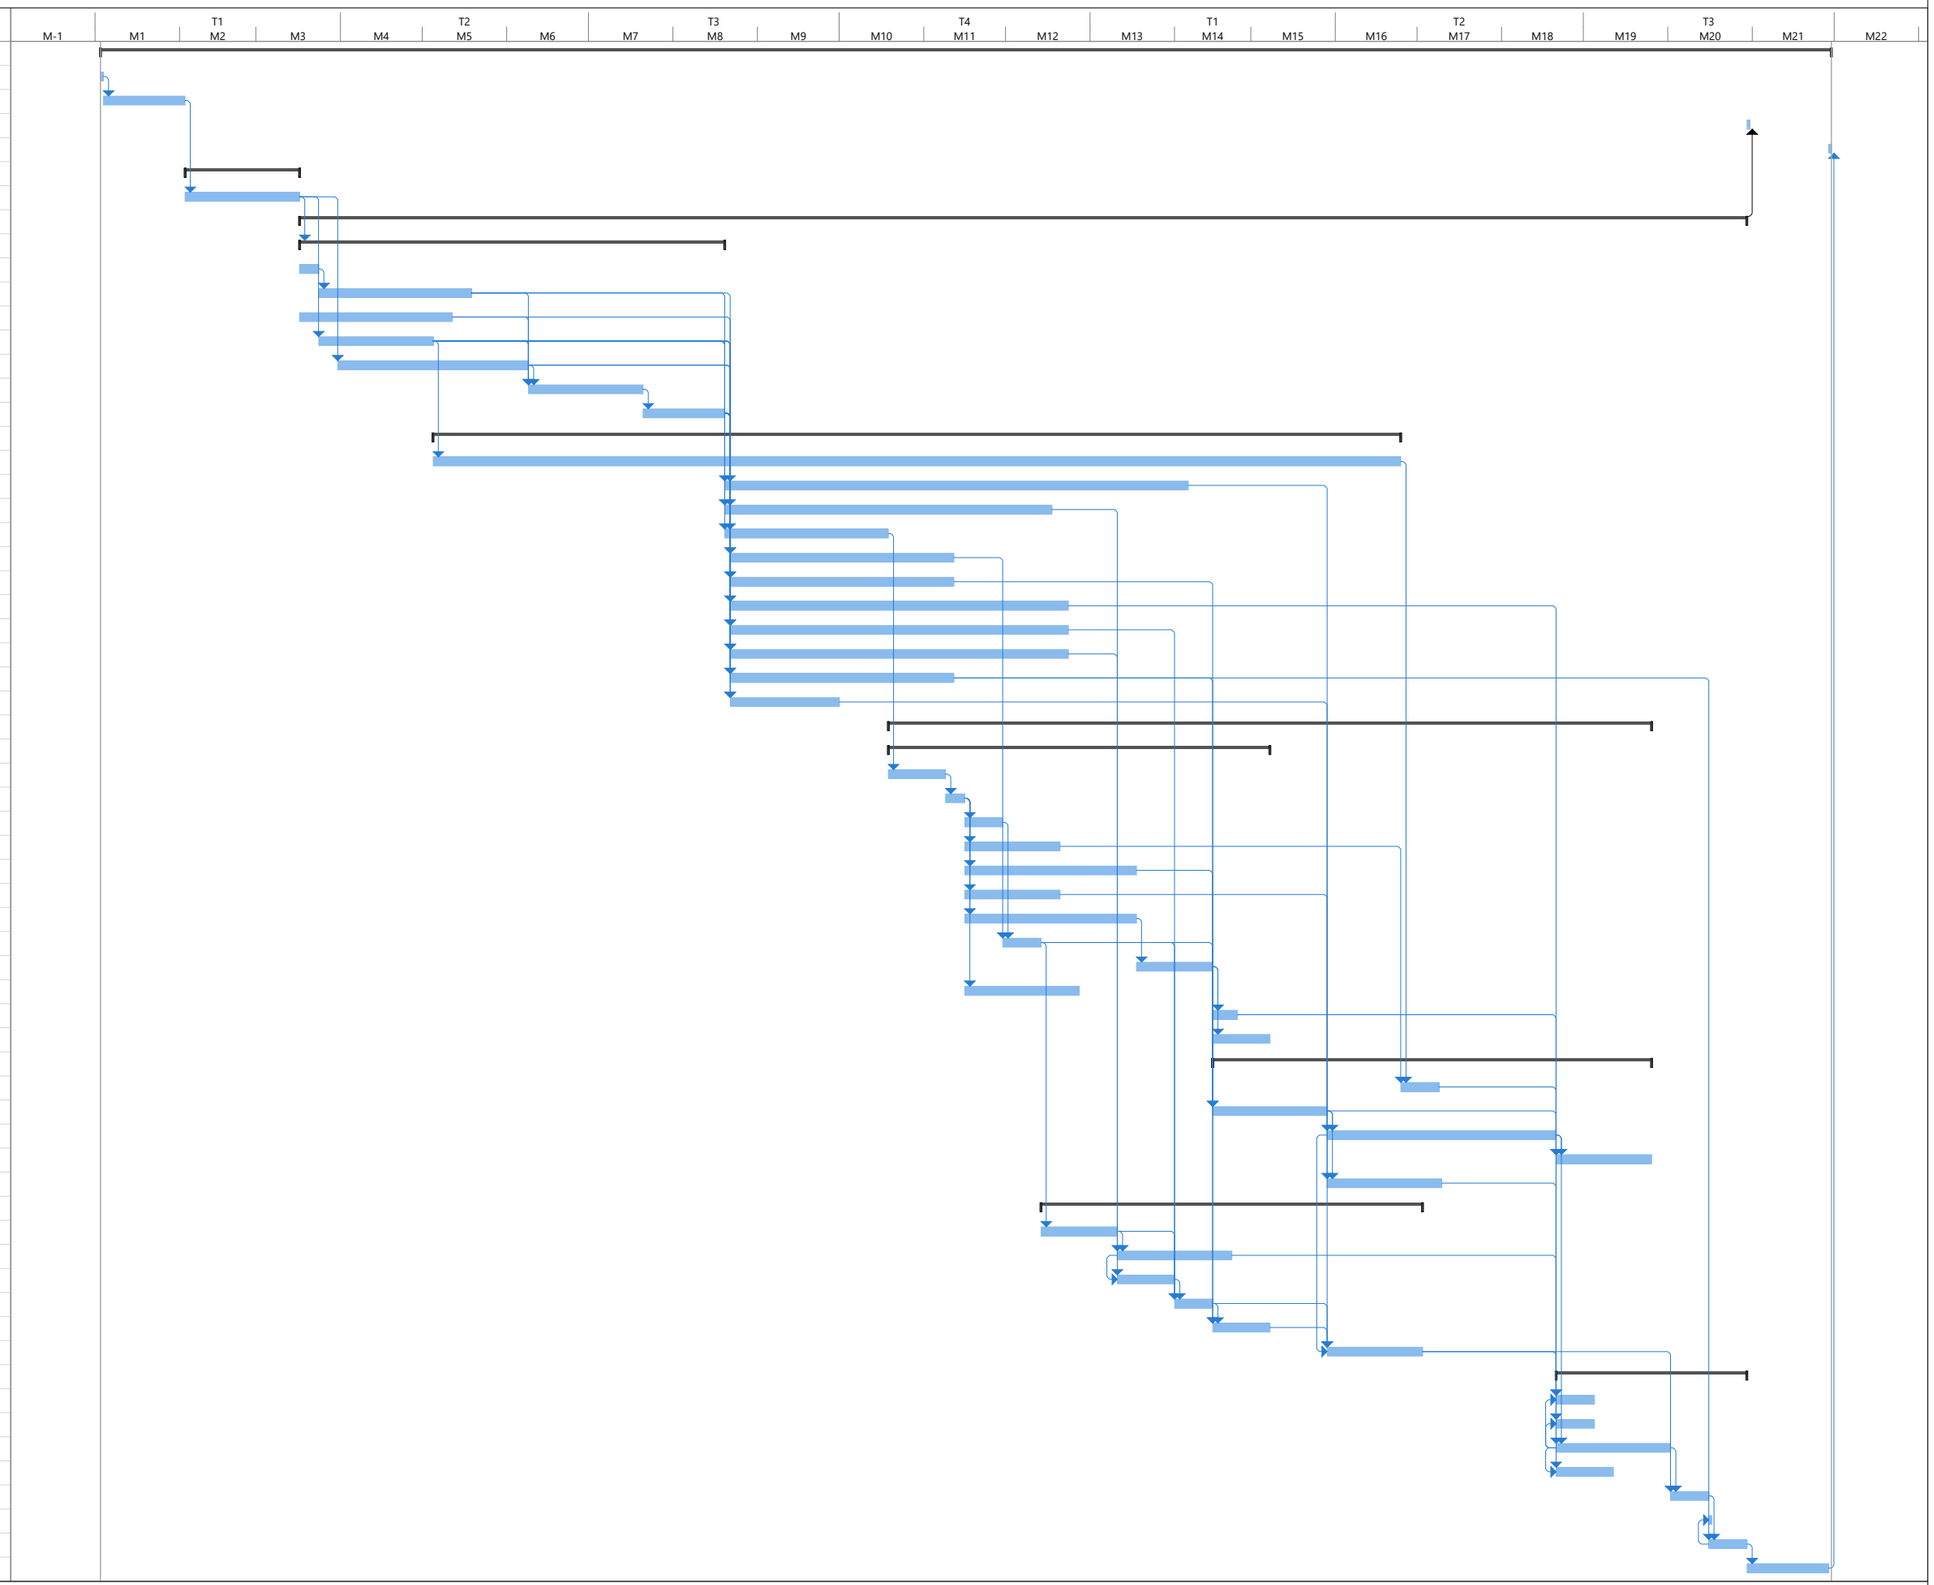

Attività | Riepilogo | Cardine inattiva | Solo-durata | Solo inizio | Cardine esterno | Avanzamento manuale
Divisione | Riepilogo progetto | Riepilogo inattiva | Riporto riepilogo manuale | Solo-fine | Scadenza
Cardine | Attività inattiva | Attività manuale | Riepilogo manuale | Attività esterne | Avanzamento
