



PLANIMETRIA FASE 1

Scala 1:500

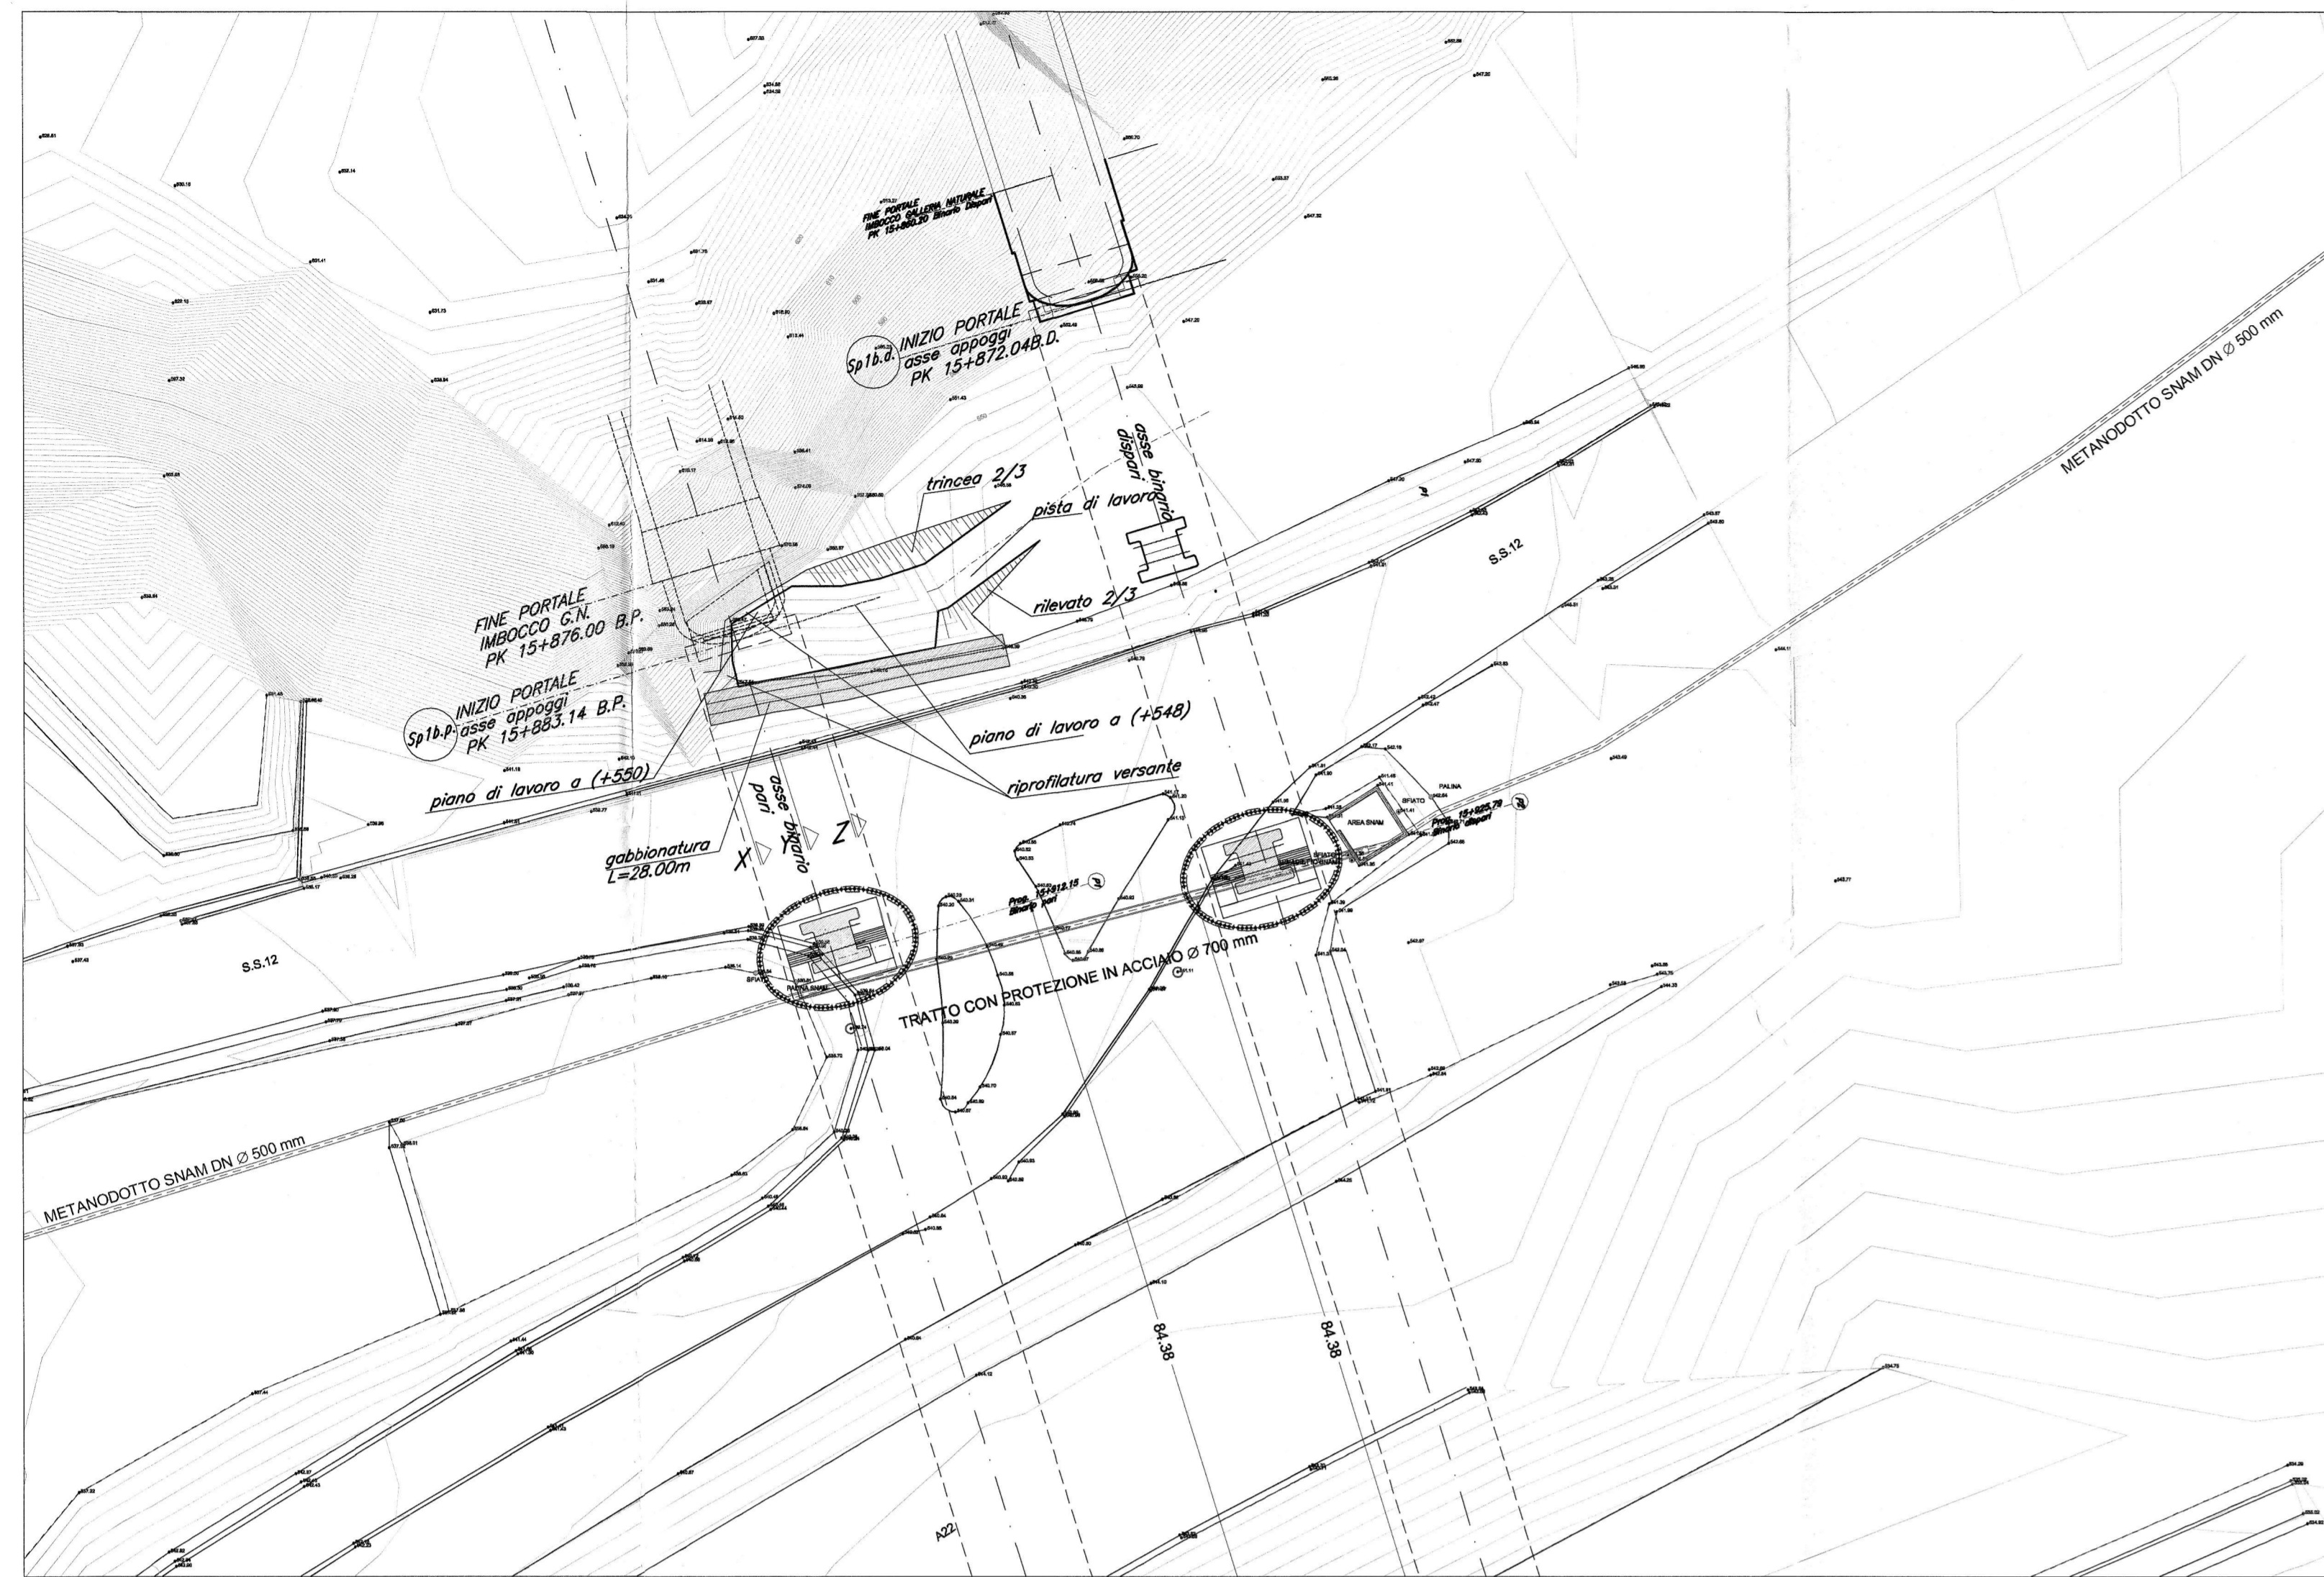

PROFILI FASE 1


Scala 1:500

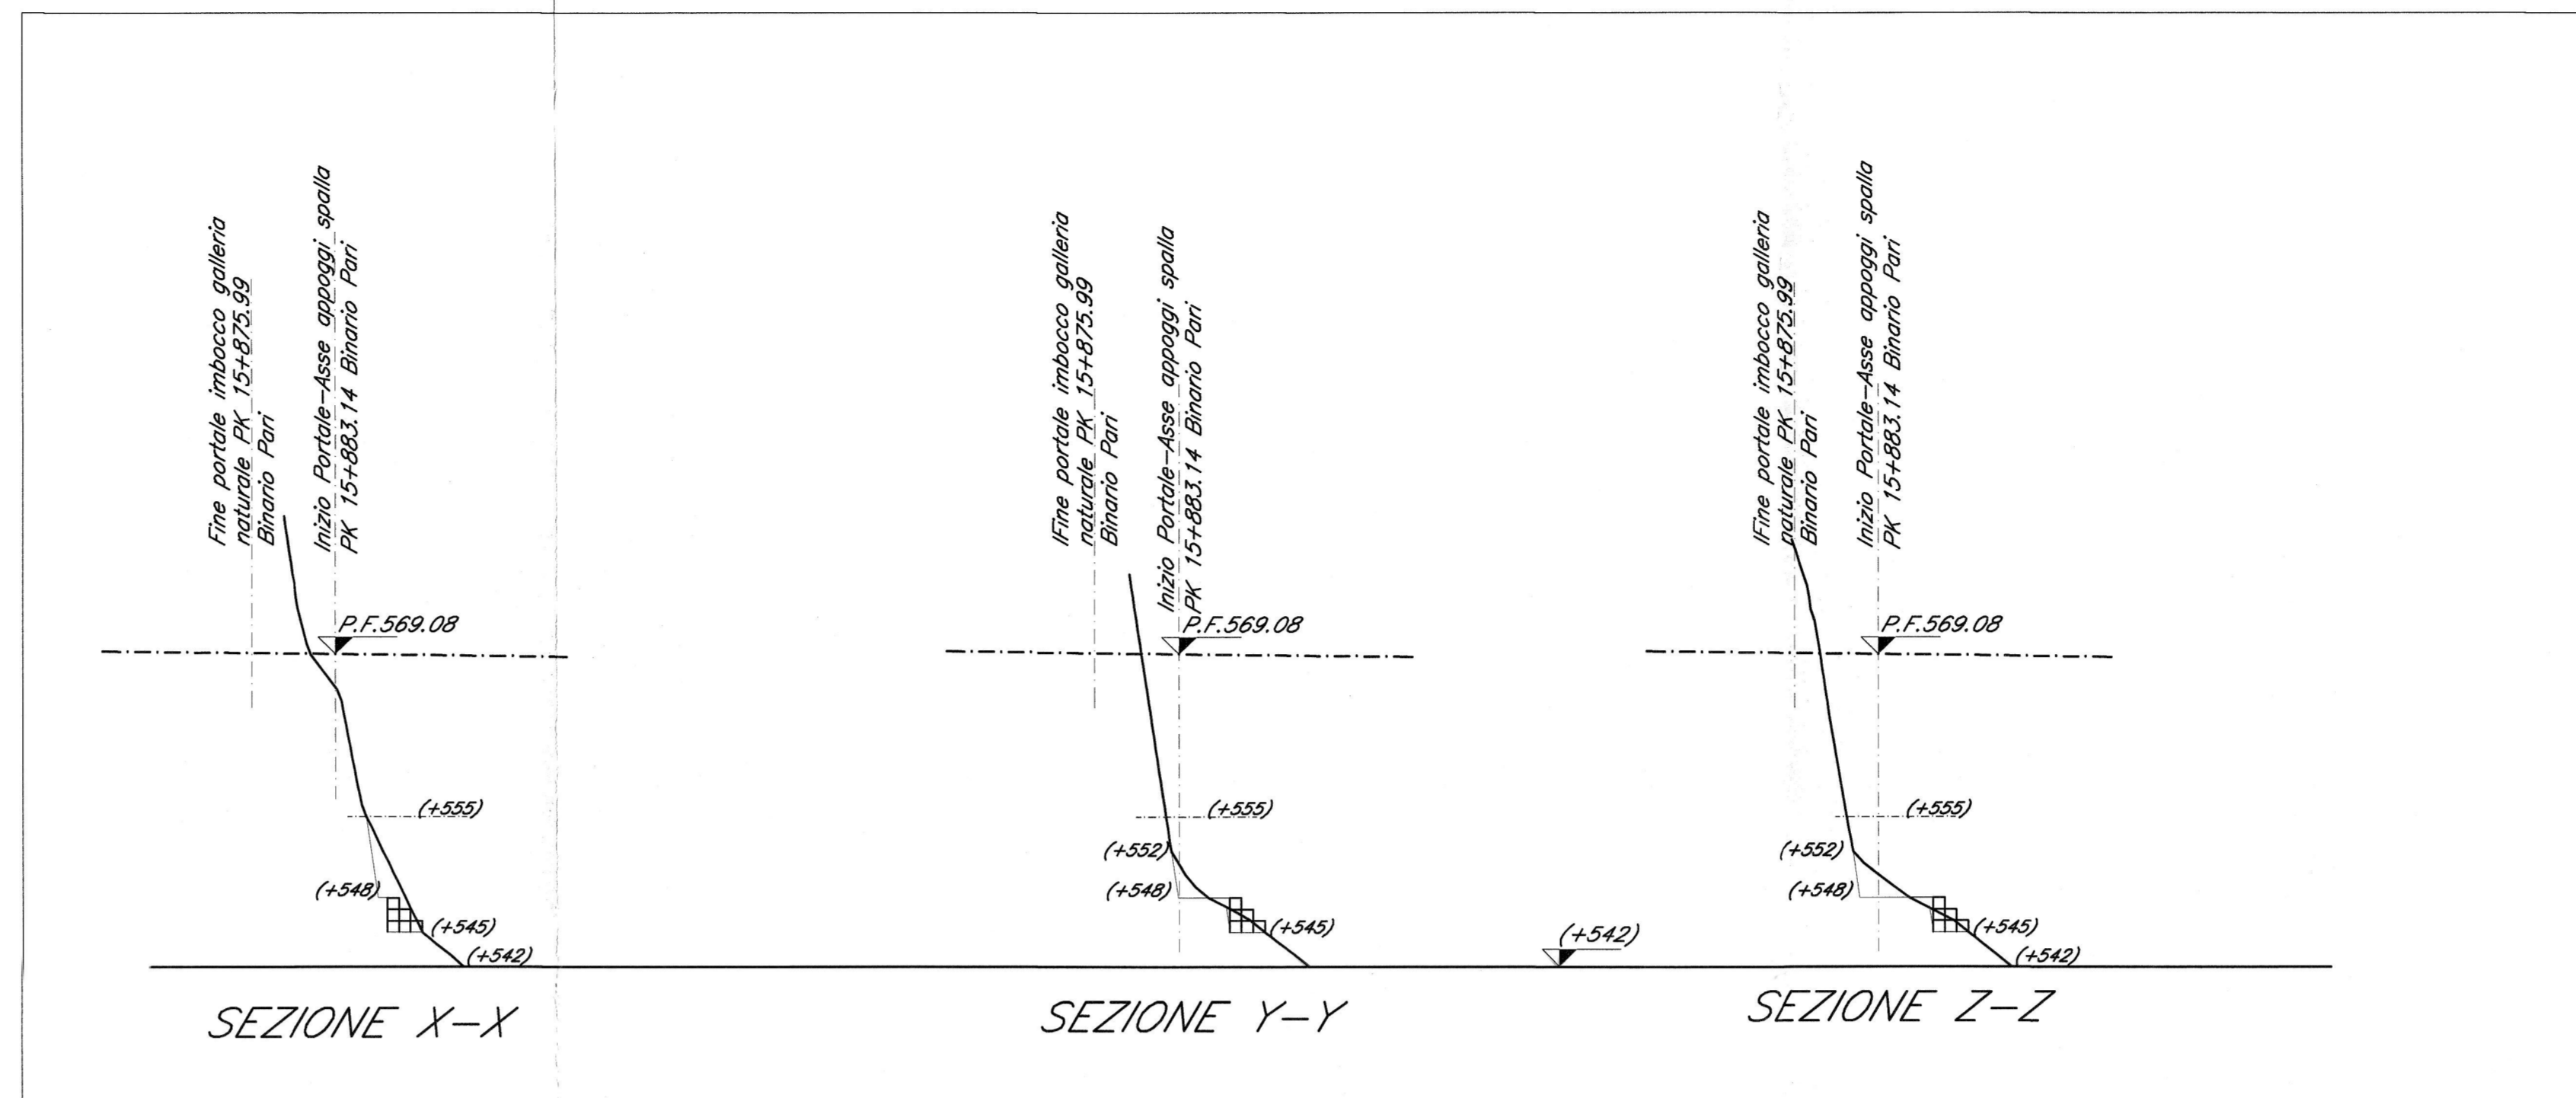

- Fase 1:
- Scavi per realizzazione piano di posa gabbionata con versante 1:7
 - Esecuzione gabbionata con gabbioni 1.00x1.00m L=28.00m opportunamente ammassata al piano di posa +545m slm
 - Esecuzione pista di lavoro fino al piano di lavoro a quota +548m slm in corrispondenza dell'imposta spalla
 - Esecuzione pista di lavoro fino al piano di lavoro a quota +548m slm e riprofilatura dei versanti da quota +548m slm (pendenza 1:7)
 - Se necessario esecuzione del placcaggio roccia da quota +548m slm fino a quota +555m slm


PLANIMETRIA FASE 2

Scala 1:500

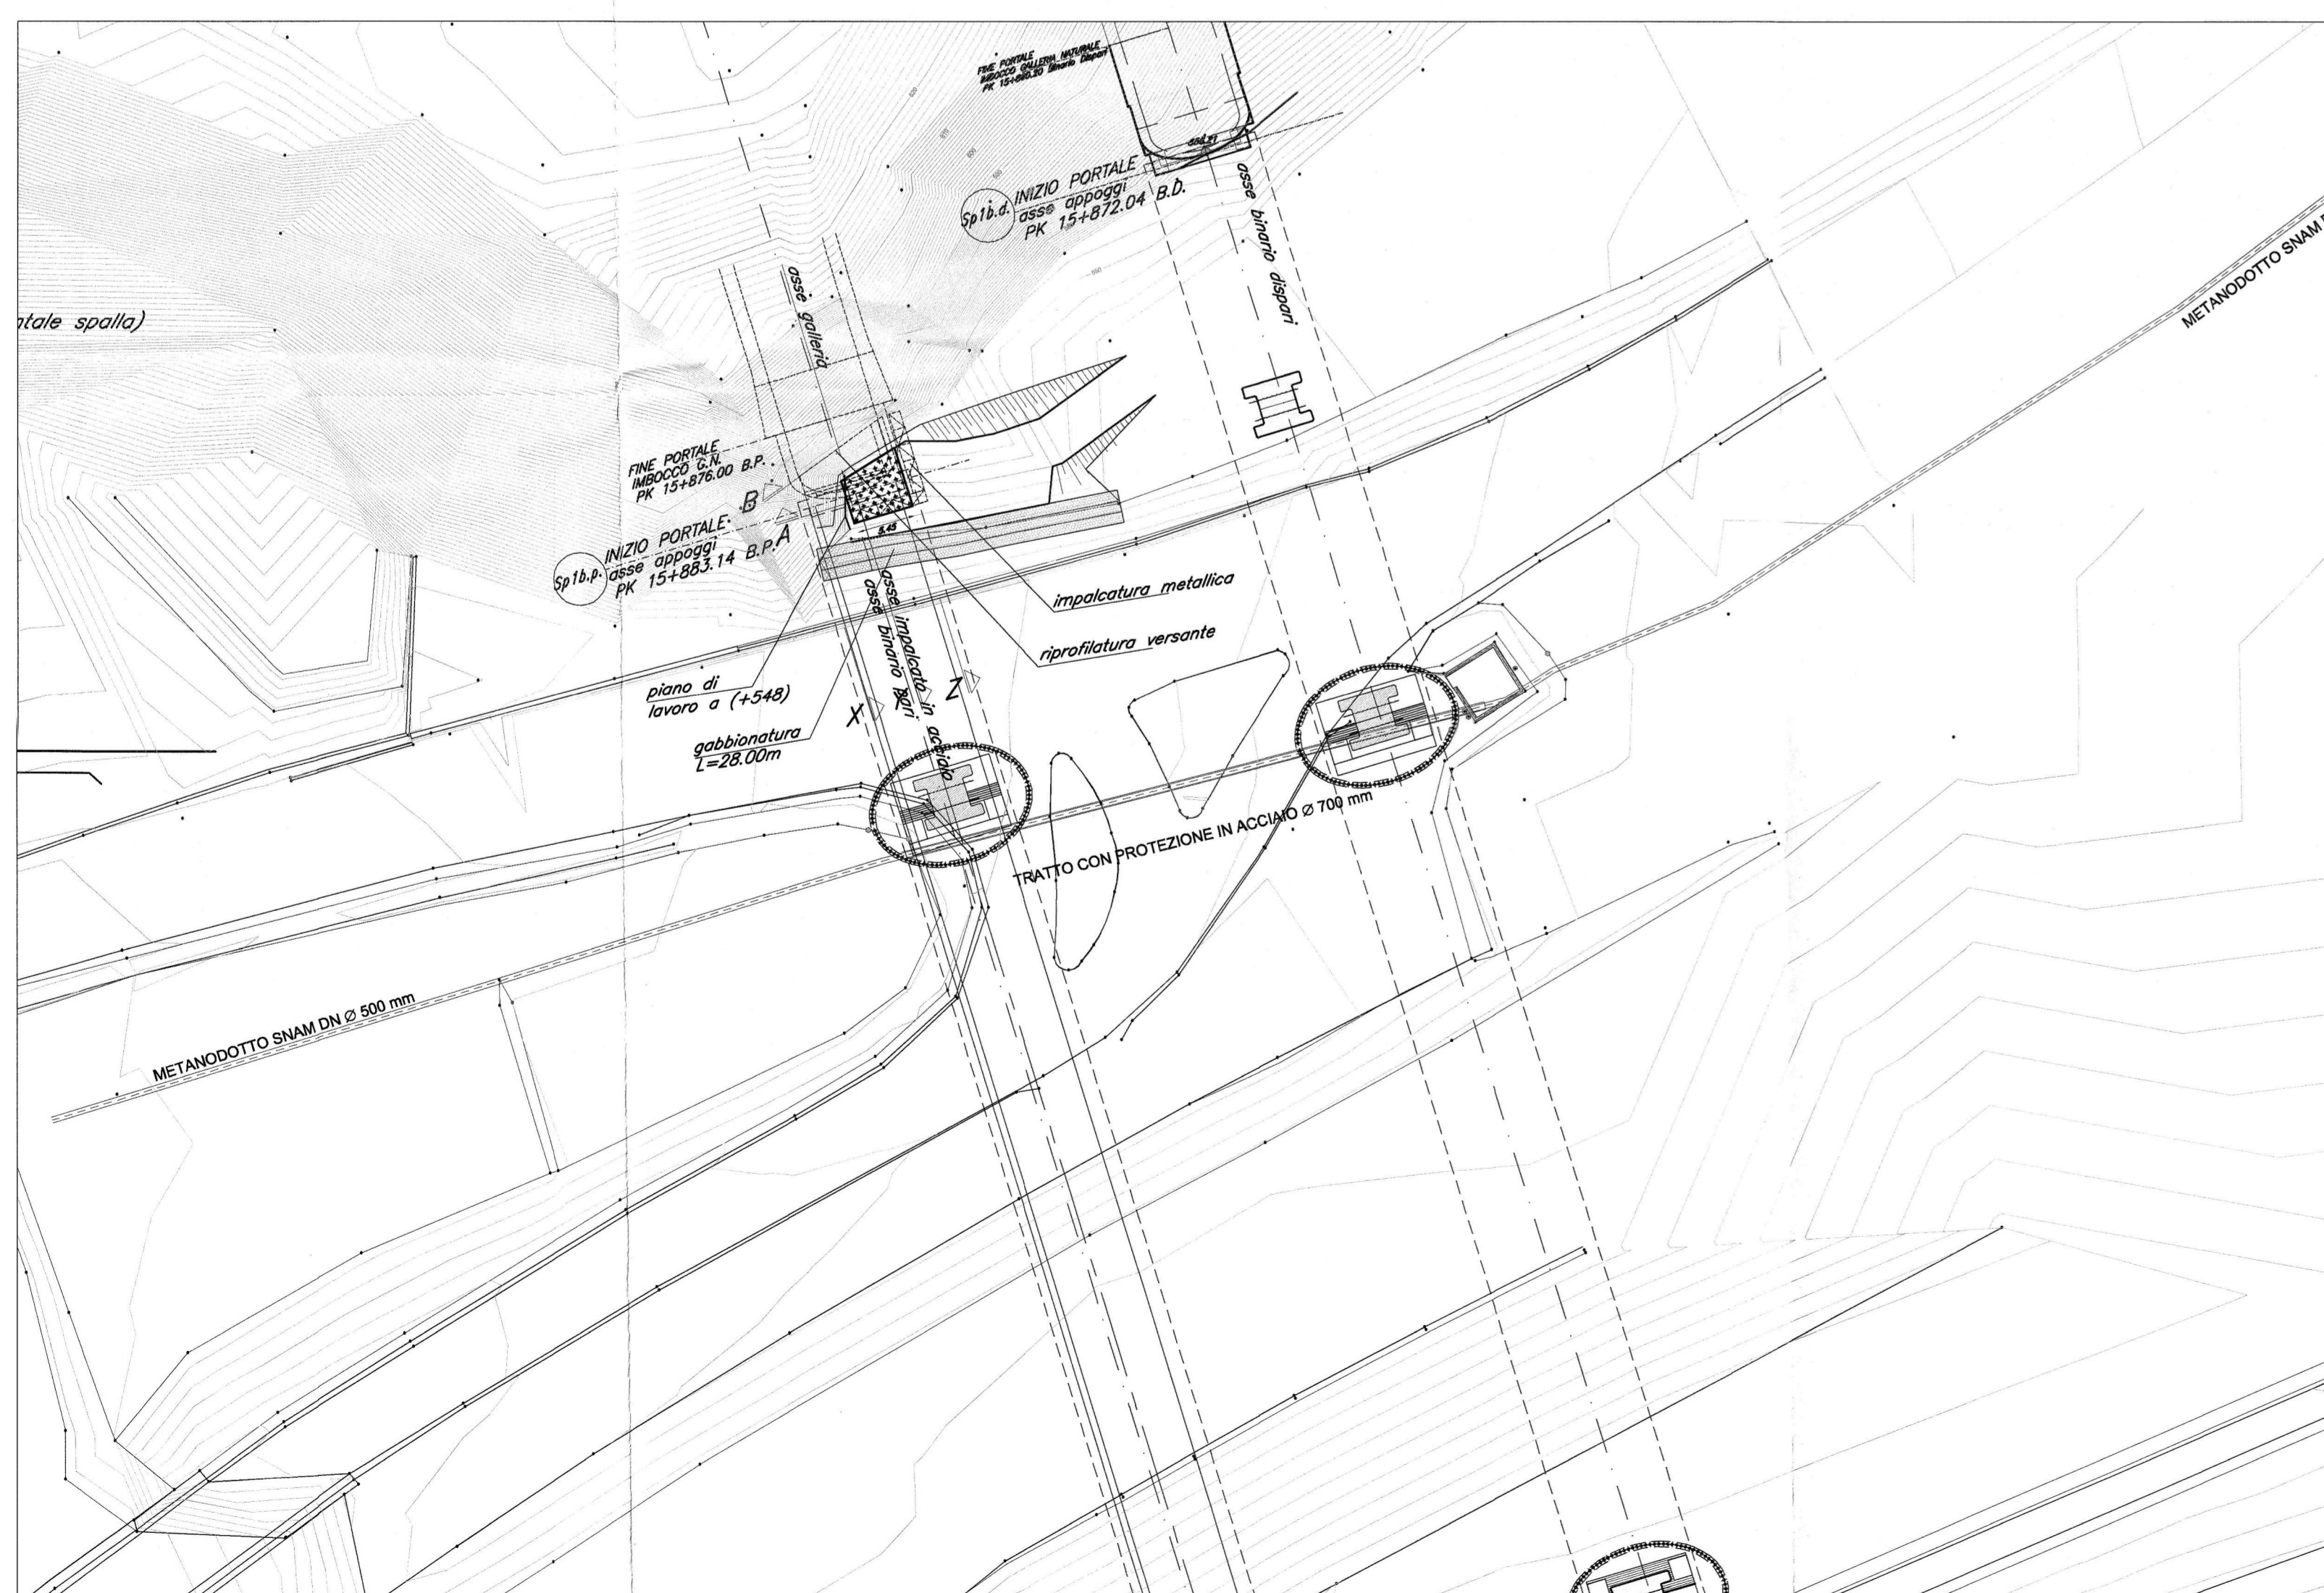

PROFILI FASE 2

Scala 1:500

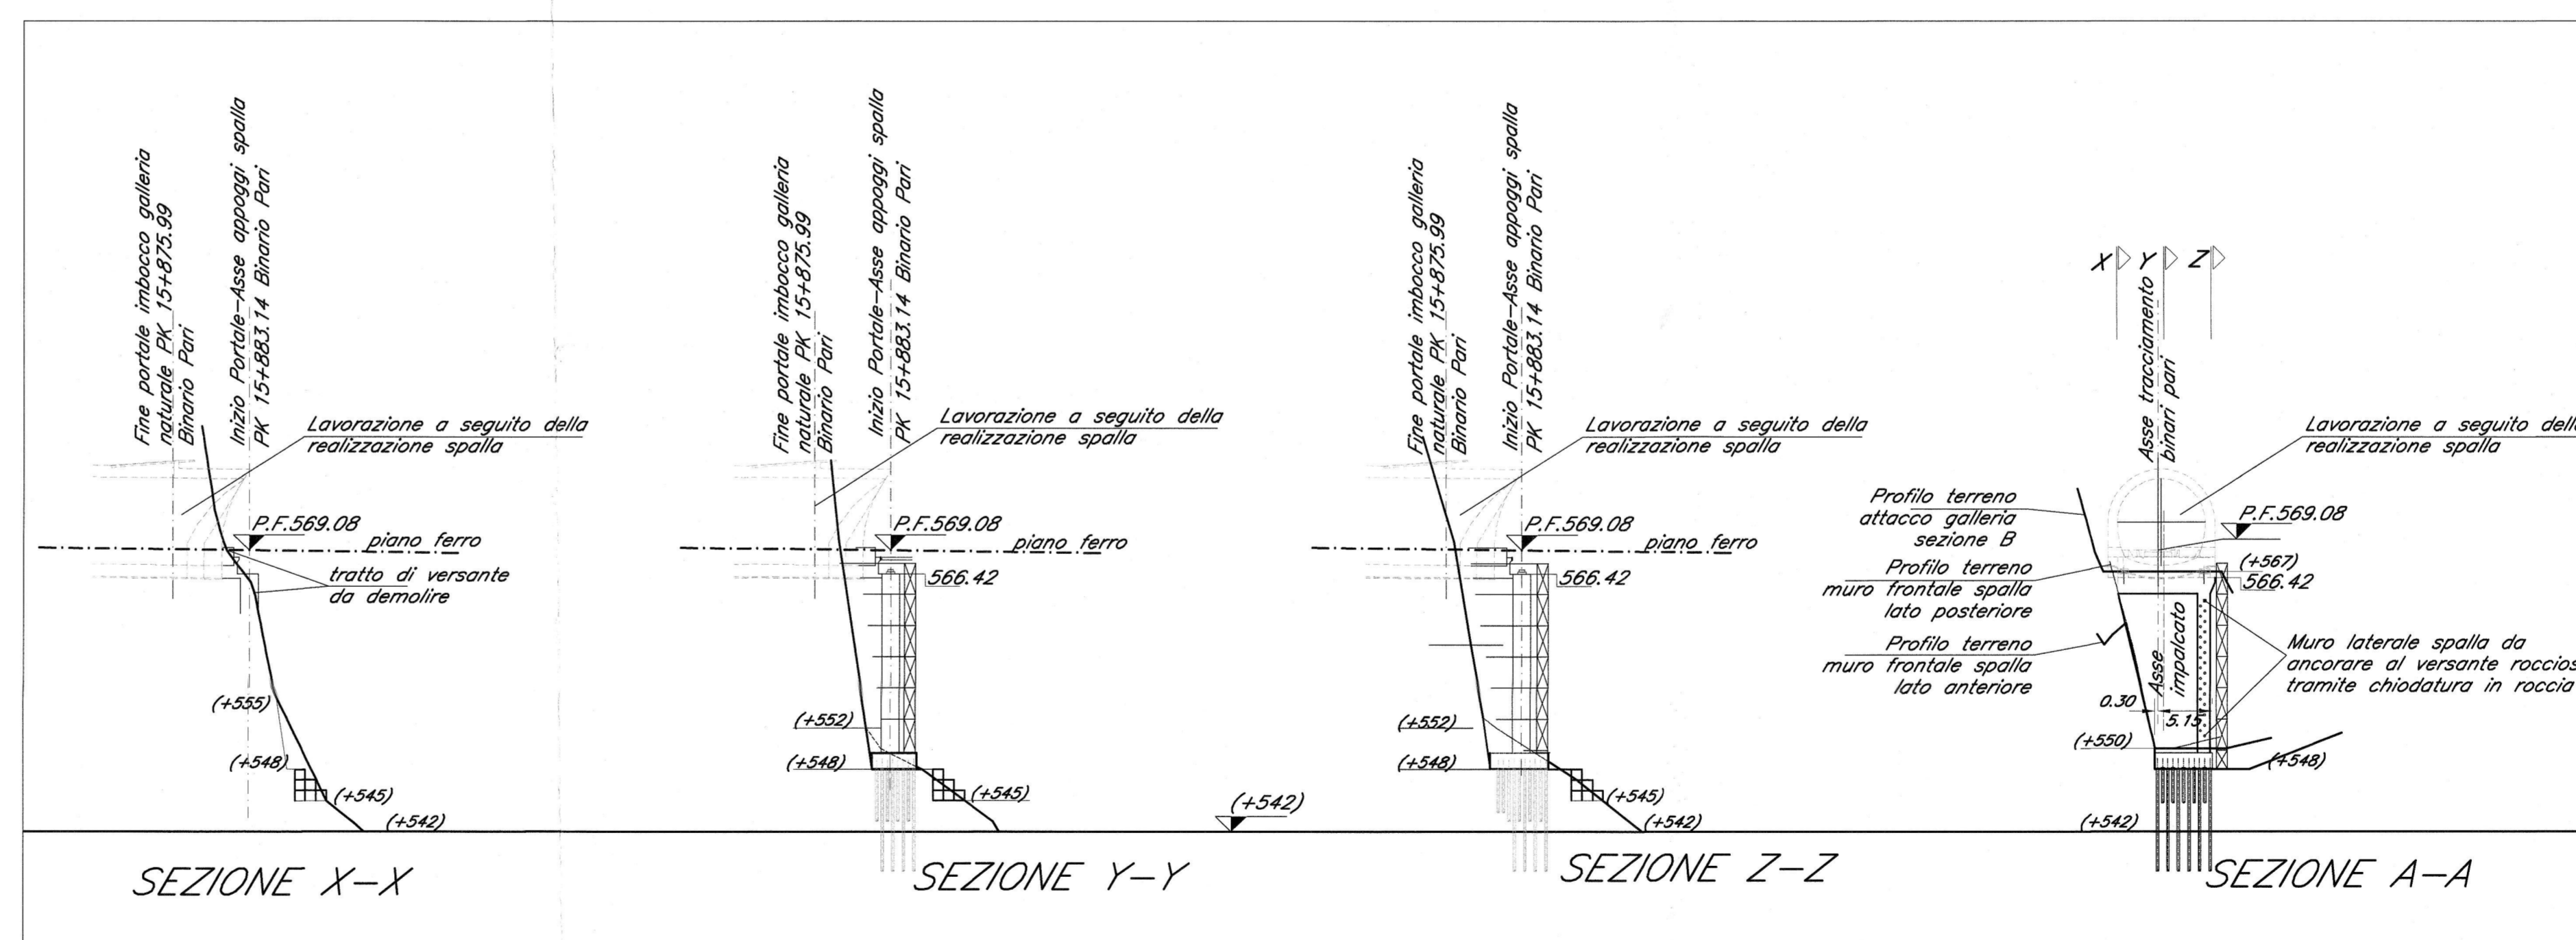

- Fase 2:
- Demolizione tratto di versante lato Sud Ovest tramite cestello da quota +548m slm (vedi sezione x-x)
 - Esecuzione micropali e getto fondazione spalla (vedi elaborato specifico carpenteria)
 - Montaggio impalcato a salire su fondazione spalla
 - Realizzazione spalla (muro frontale e muri laterali)
 - Completamento spalla fino a quota +566.42m slm, riempimento a tergo della spalla con cls magro armato per ritiro e fessurazione, prevedere ferri d'attesa per la realizzazione della galleria sul tratto gettato in opera
 - Completamento del collegamento galleria - impalcato

NOTA BENE -
Per le prescrizioni e i materiali vedi tavola:
IBL110009DMV0000001

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CUP: J54F4000020001

U.O. STRUTTURE

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

PONTE SUL FIUME ISARCO
VERSANTE GARDENA NORD
FASI REALIZZATIVE SPALLA BINARIO PARI SCALERES

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IBL11	10	D	09	P8	V10100	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizz. / Data
A	Emissione Esecutiva	G. G. M.	MAR20 2013	F. F.	MAR20 2013	[Signature]	MAR20 2013	[Signature]

Stampato dal servizio di plotteraggio ITALFERR S.p.A. ALBA S.r.l.
