




- FASE 1**
- Interruzione al transito veicolare della S.S. n°265.
 - Realizzazione del nuovo tombino 3x2 fosso Valle Pietra Rossa.
 - Realizzazione di tutte le paratie di micropali necessarie, ad esclusione di quelle relative alle pile P4 e P5.
 - Scavo fino a quota testa cordolo paratie.
 - Scavo fino alla quota d' imposta fondazione di tutte le pile ad esclusione delle pile P4 e P5.

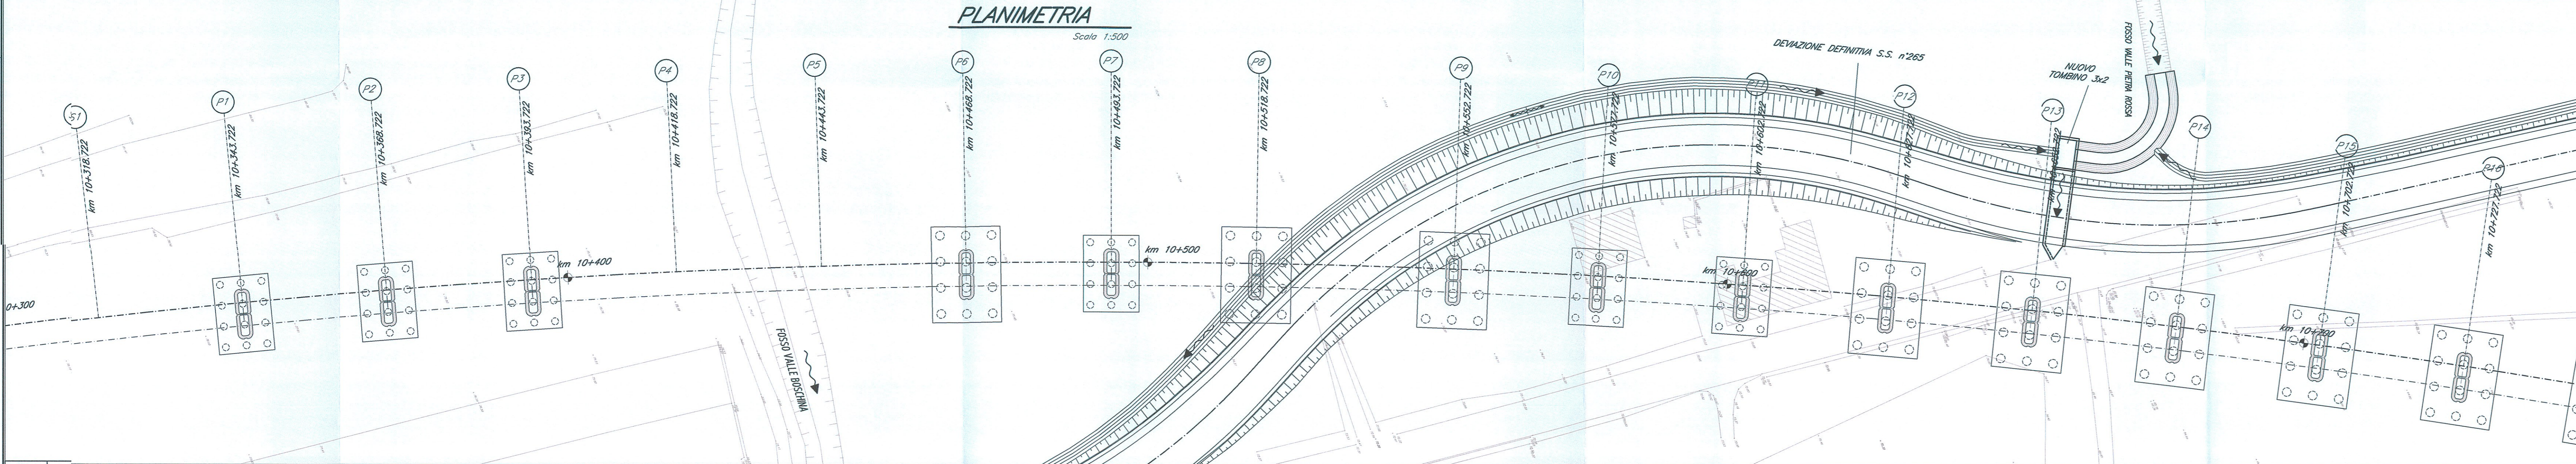

- FASE 2**
- Realizzazione palificate e plinti di fondazione di tutte le pile ad esclusione delle pile P4 e P5.
 - Realizzazione elevazione delle spalle e dei tutti fusti pile ad esclusione delle pile P4 e P5.
 - Realizzazione pulvini di tutte le pile ad esclusione delle pile P4 e P5.
 - Realizzazione deviazione definitiva della S.S. n°265 al km 10+536.342 e riapertura al transito veicolare.

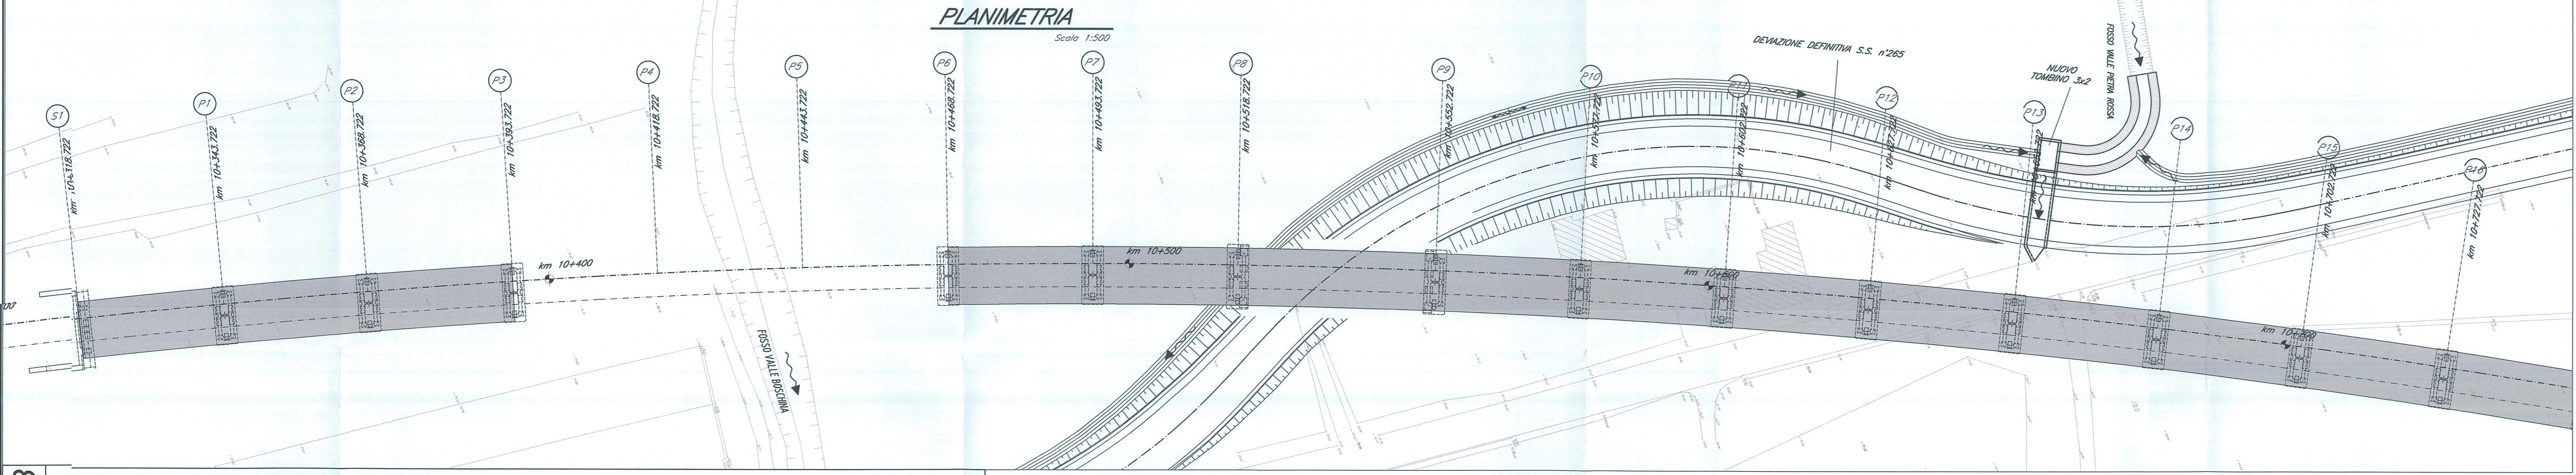

- FASE 3**
- Varo delle travi prefabbricate in c.a.p. e delle travi metalliche per tutte le pile ad esclusione delle pile P4 e P5.
 - Interruzione provvisoria della S.S. n°265 durante il varo delle travi relative alla campata P8-P9.

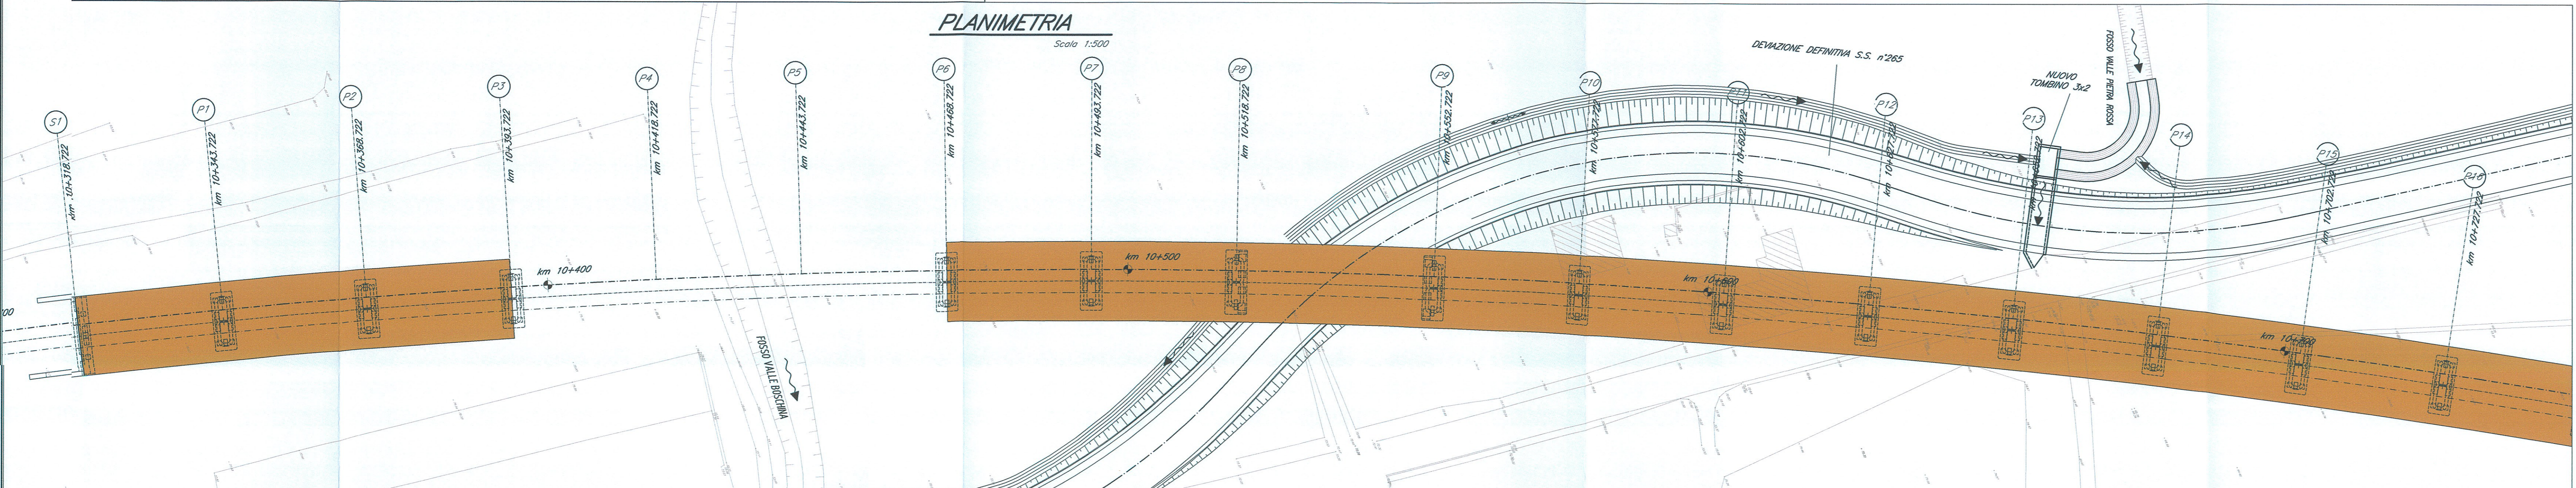

- FASE 4**
- Getto delle solette dell'impalcato di tutte le pile ad esclusione delle pile P4 e P5.
 - Interruzione provvisoria della S.S. n°265 durante il getto della soletta relativa alla campata P8-P9.

AVV:
 - NELL'ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI E' NECESSARIO REALIZZARE PRIMA I PALI ED IL PUNTO DELLA PILA P13. POI I PALI ED IL PUNTO DELLA PILA P15 E SUCCESSIVAMENTE I PALI E IL PUNTO DELLA PILA P14. REALIZZARE PRIMA I PALI ED IL PUNTO DELLA PILA P10. POI I PALI ED IL PUNTO DELLA PILA P12 E SUCCESSIVAMENTE I PALI ED IL PUNTO DELLA P11.

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. STRUTTURE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI

PONTI E VIADOTTI
 VIADOTTO da km 10+318,722 al km 11+729,722: Viadotto S. Michele
 Fasi realizzative - Tav. 1 di 5

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0F 01 D 09 P8 VI0600 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	A. Totani	Lug 2015	T. Alberti	Lug 2015	F. Contone	Lug 2015	A. Vitrozzi	Lug 2015

FILE: IF0F-01.D.09.P8.VI0600.001.A n. Ebb.: 332
