


PLANIMETRIA 1:100


SEZIONE LONGITUDINALE A-A 1:100

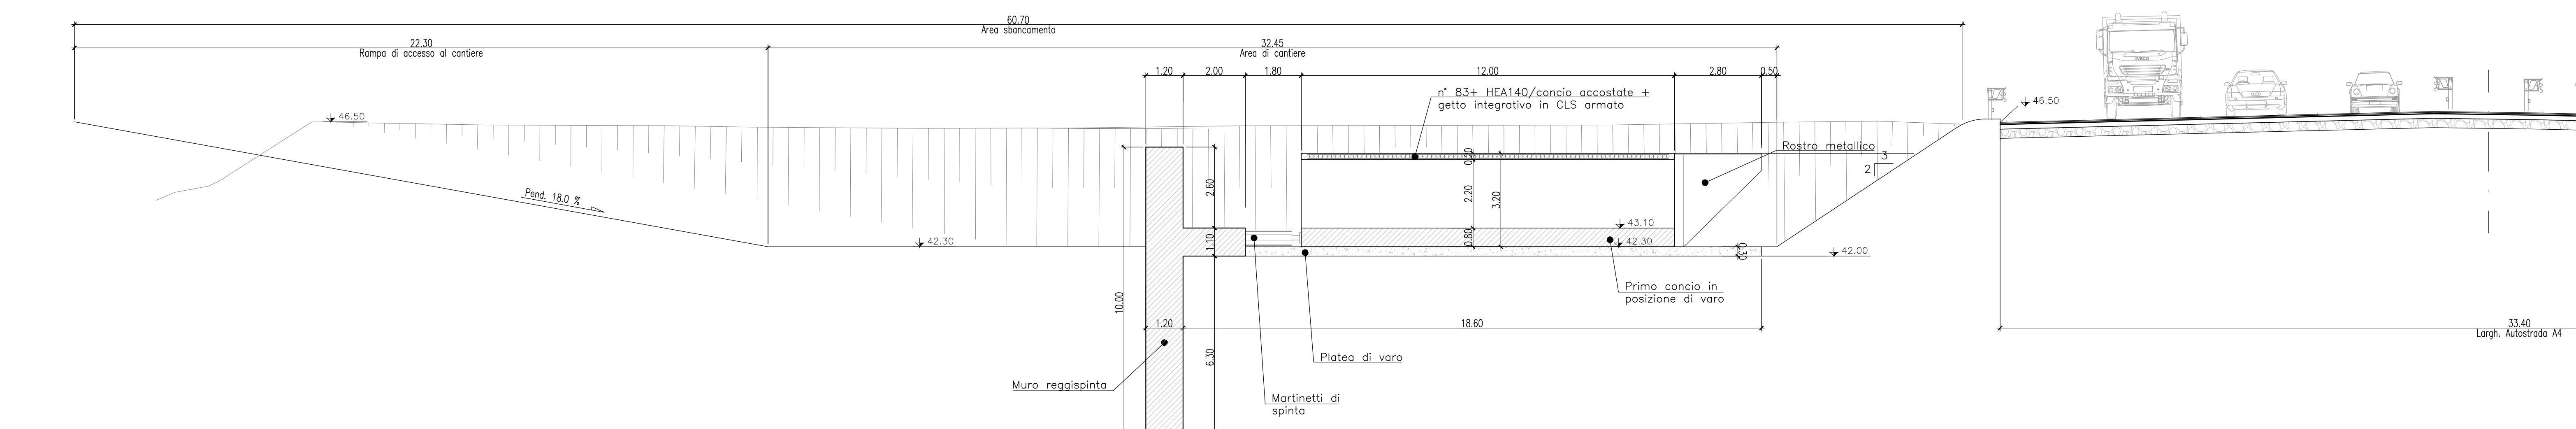

NOTA:
GIUNTO REALIZZATO IN WATERSTOP CON PROFILATO IN RESINE VINILICHE DI 300mm.


SEQUENZA FASI REALIZZATIVE

- FASE 1
1) Preparazione area di cantiere e scavo a sezione aperta; Getto in opera del muro reggispinta, della platea di contrasto e della platea di varo con relativi martinetti; Posa in opera del primo cuneo con relativo rostro metallico;
- FASE 2
1) Spinta del primo cuneo, in c.a. (lunghezza 12.00 m) con relativa estensione dei martinetti idraulici; collegamento dei cunei successivi con waterstop idroresistenti di tenuta idraulica con effetto ritardante;
- FASE 3
1) Spinta dell'ultimo cuneo con massima estensione dei martinetti; Monitoraggio inclinazione scotolare e pavimentazione stradale superiore;
- FASE 4
1) Smontaggio rostro metallico, realizzazione massetto delle pendenze e realizzazione soletta di invito del canale idraulico; sistemazione finale.

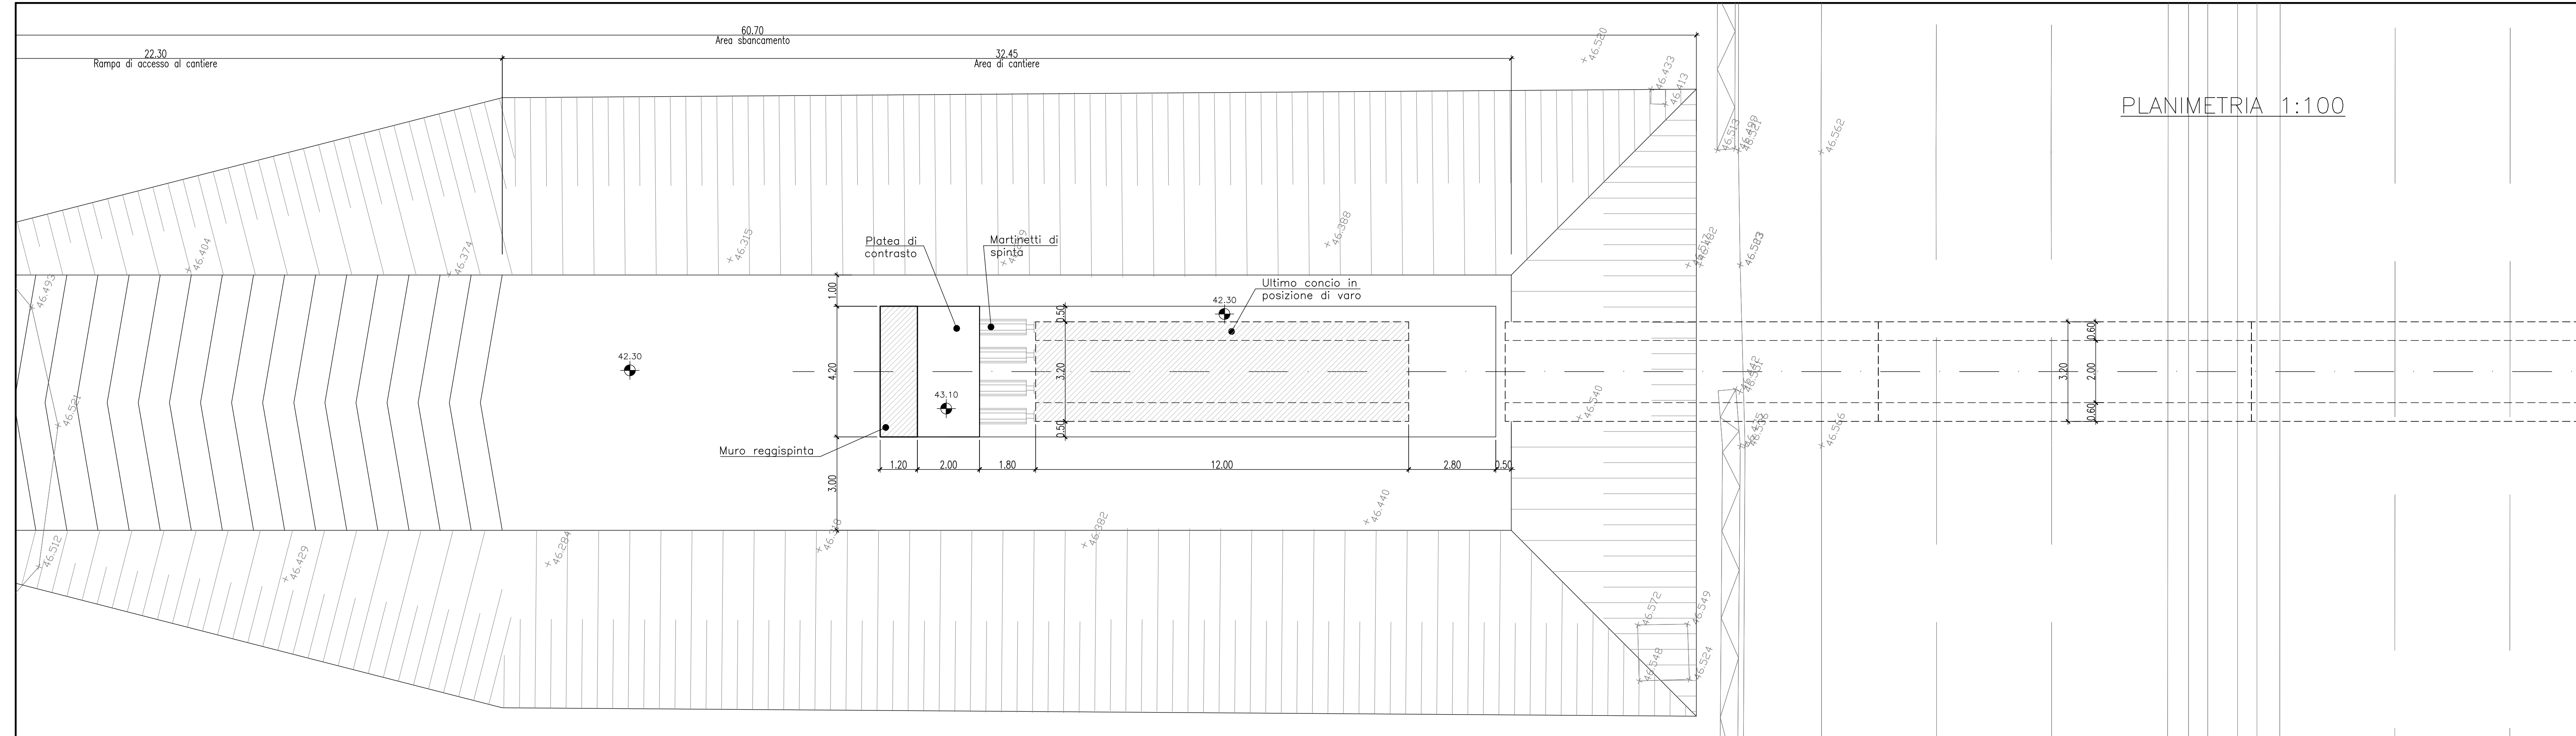

PLANIMETRIA 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE A-A 1:100

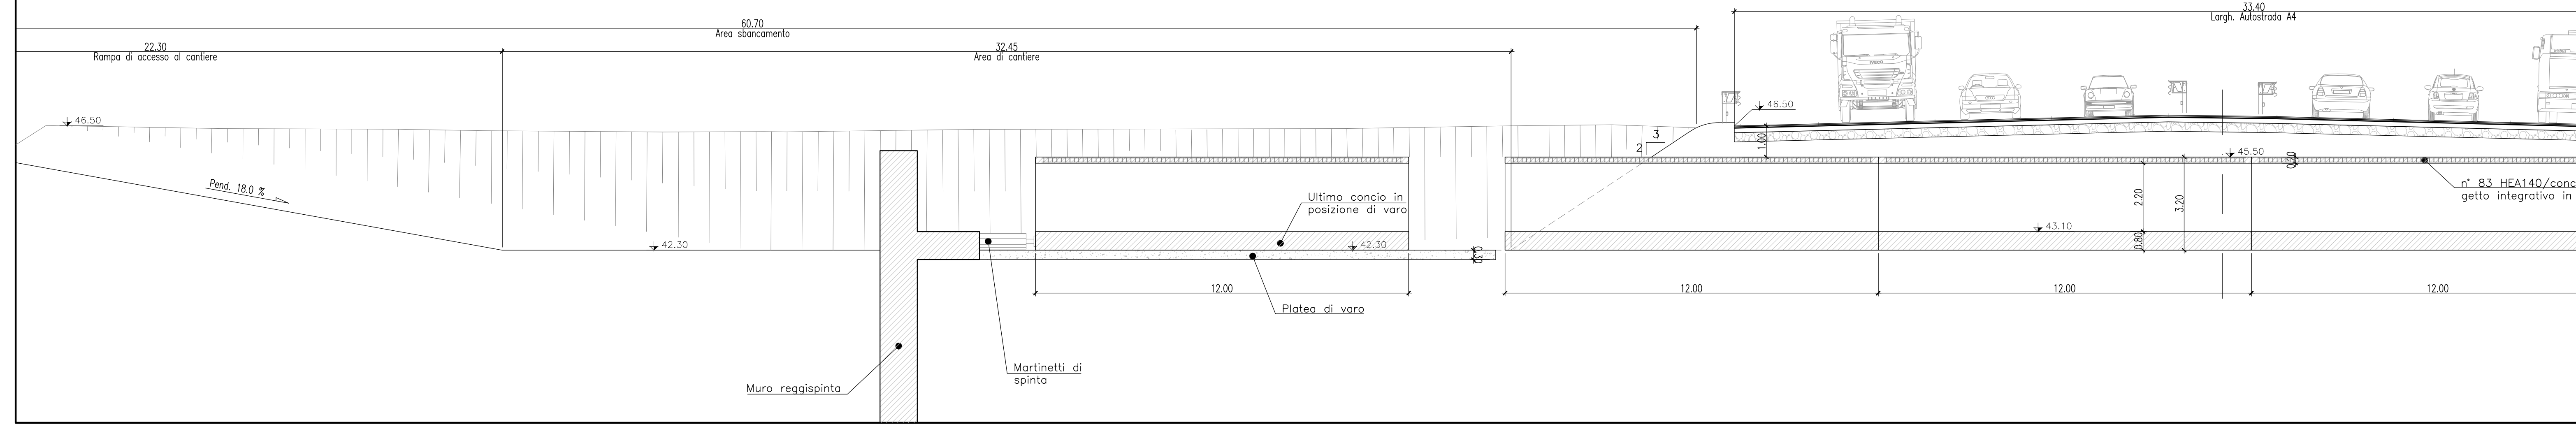

Incidenza armatura	
Elemento	kg/mc
Copertura	120
Piedritti	120
Fondazione	120
Muri andatori (Paramento e Fondazione)	90
Muri reggispinta	150
Platea di varo	160

COMMITTENTE: **RFI** - R.F. FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA Sorveglianza: **ITALFER** - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio Irico-V Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AVIAC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

DISEGNO INTERFERENZE VIARIE - IN16 - INTERFERENZA CON SEDE AUTOSTRADE AL km 6+220
TOMBINO DEVIAZIONE A4 2,00X2,20 - OPERA 11 - PIANTE E SEZIONI - FASI 1 E 2

GENERAL CONTRACTOR: **ATI bonifica** | CONSORZIO IIRICAV DUE | **ITALFERR S.p.A.**

SCALA: 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN0D	00	D	I2	PA	IN16	I1	001	A

ATI bonifica - VISTO ATI BONIFICA

Progettazione	Disegnazione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMMISSIONE	A. Ricci	10/04/15	S. Geronzi	13/04/15	F. Pizzoni	13/04/15	

File: IN00006P/AN/1611001A_01AAA.DWG | CUSP: J41E9100000009 | n. Elab.: | CIG: 3320049F17
