


LEGENDA			
	Opere da realizzare		Traffico in esercizio
	Opere in corso di realizzazione		Traffico in fase provvisoria (Rif. D.M. 10/07/2002)
	Opere realizzate		

FASE 0  
- ALLARGAMENTO VIABILITA' ESISTENTE PROPEDEUTICO ALLE DEVIAZIONI DI FASE 1

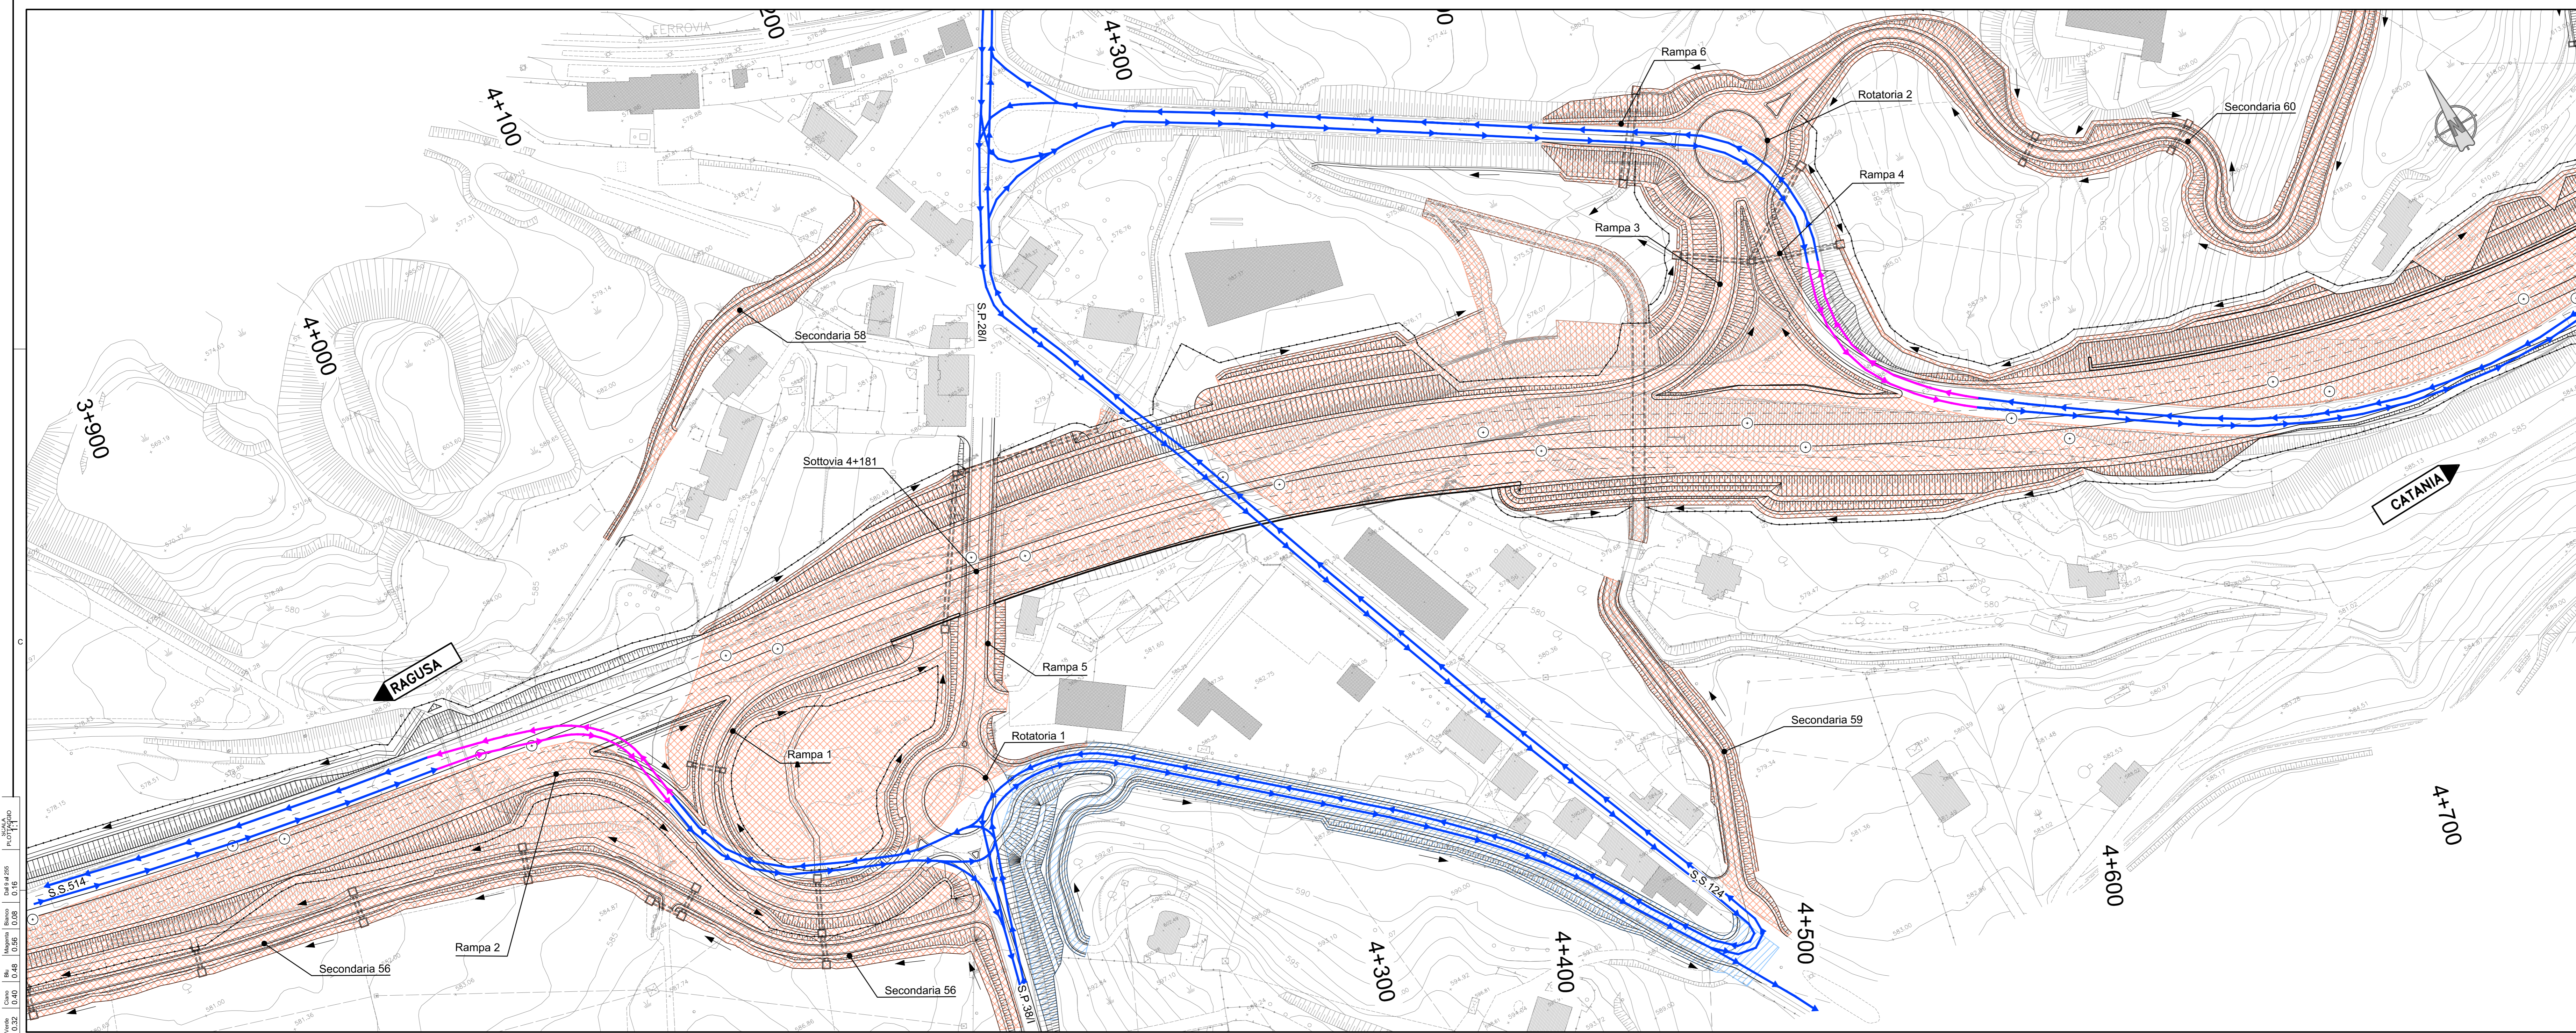

**NOTE**

- Traffico sull'attuale sede stradale: traffico su doppio senso di circolazione con almeno una carreggiata carrabile avente larghezza minima di 6,00m. Ove non fosse possibile garantire la larghezza minima sopra indicata si ricorrerà ad una larghezza non inferiore a 5,60m (DM 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

FASE 1  
- DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DELLA S.S.514 SULLA VIABILITA' DI SVINCOLO ESISTENTE CON COLLEGAMENTO NORD-SUD GARANTITO DAL SOTTOVIA DELLA S.S. 124  
- REALIZZAZIONE CARREGGIATA DX E CARREGGIATA SX ASSE PRINCIPALE NELLE PORZIONI ESTERNE ALLA VIABILITA' TRA PROGRESSIVA 4+030-4+550, REALIZZAZIONE CARREGGIATA SX DA PROGRESSIVA 4+650

- REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOTTOVIA ALLA PROGRESSIVA 4+181
- REALIZZAZIONE SECONDARIA 56, SECONDARIA 58, SECONDARIA 60, RAMPA 3 E RAMPA 4
- REALIZZAZIONE PARZIALE RAMPA 1, RAMPA 2, RAMPA 4 E ROTATORIE DI SVINCOLO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

**AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114.**  
(C.U.P. F12C03000000001)

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LOTTO 5  
CANTIERIZZAZIONE  
Svincolo 6 "VIZZINI SCALO"  
Fasi esecutive e deviazioni viabilità esistente  
Tavola 1 di 2**

<b>Il Progettista</b> Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni: Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H	<b>Supporto specialistico</b> Ottimizzazione della cantierizzazione delle opere: Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074
<b>Geologo:</b> Dott. Geologo Fabio Melchioni Ordine Geologi del Lazio A.P. n. 663	<b>Geotecnica e opere d'arte minori:</b> Ing. Antonio Alparone
<b>Opere d'arte principali:</b> Viadotti Ing. G. Mondello	<b>Opere di mitigazione dell'impatto ambientale:</b> Ecosistemi e paesaggio Ing. G. Guittucci Ing. G. Guittucci

ITALCONSULT	GP Ingegneria	ILISE	ALTRAN
-------------	---------------	-------	--------

FASE	TRLT	DISCIPLINA/OPERA	DOC	PROGR.	ST./REV.	FOGLIO	DATA
D01	T1	L5-CAI	06-1	P7-0	01-0A	01	GENNAIO '17
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REGISTRAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO		
A	GENNAIO '17	Emissione	E.Fam	De Stada	Monaco		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCESSIONARIO SARC SRL	L'ENTITA' COSTRUTTRICE VETO/PER ACCETTAZIONE
----------------------------------	-------------------------------	---
