
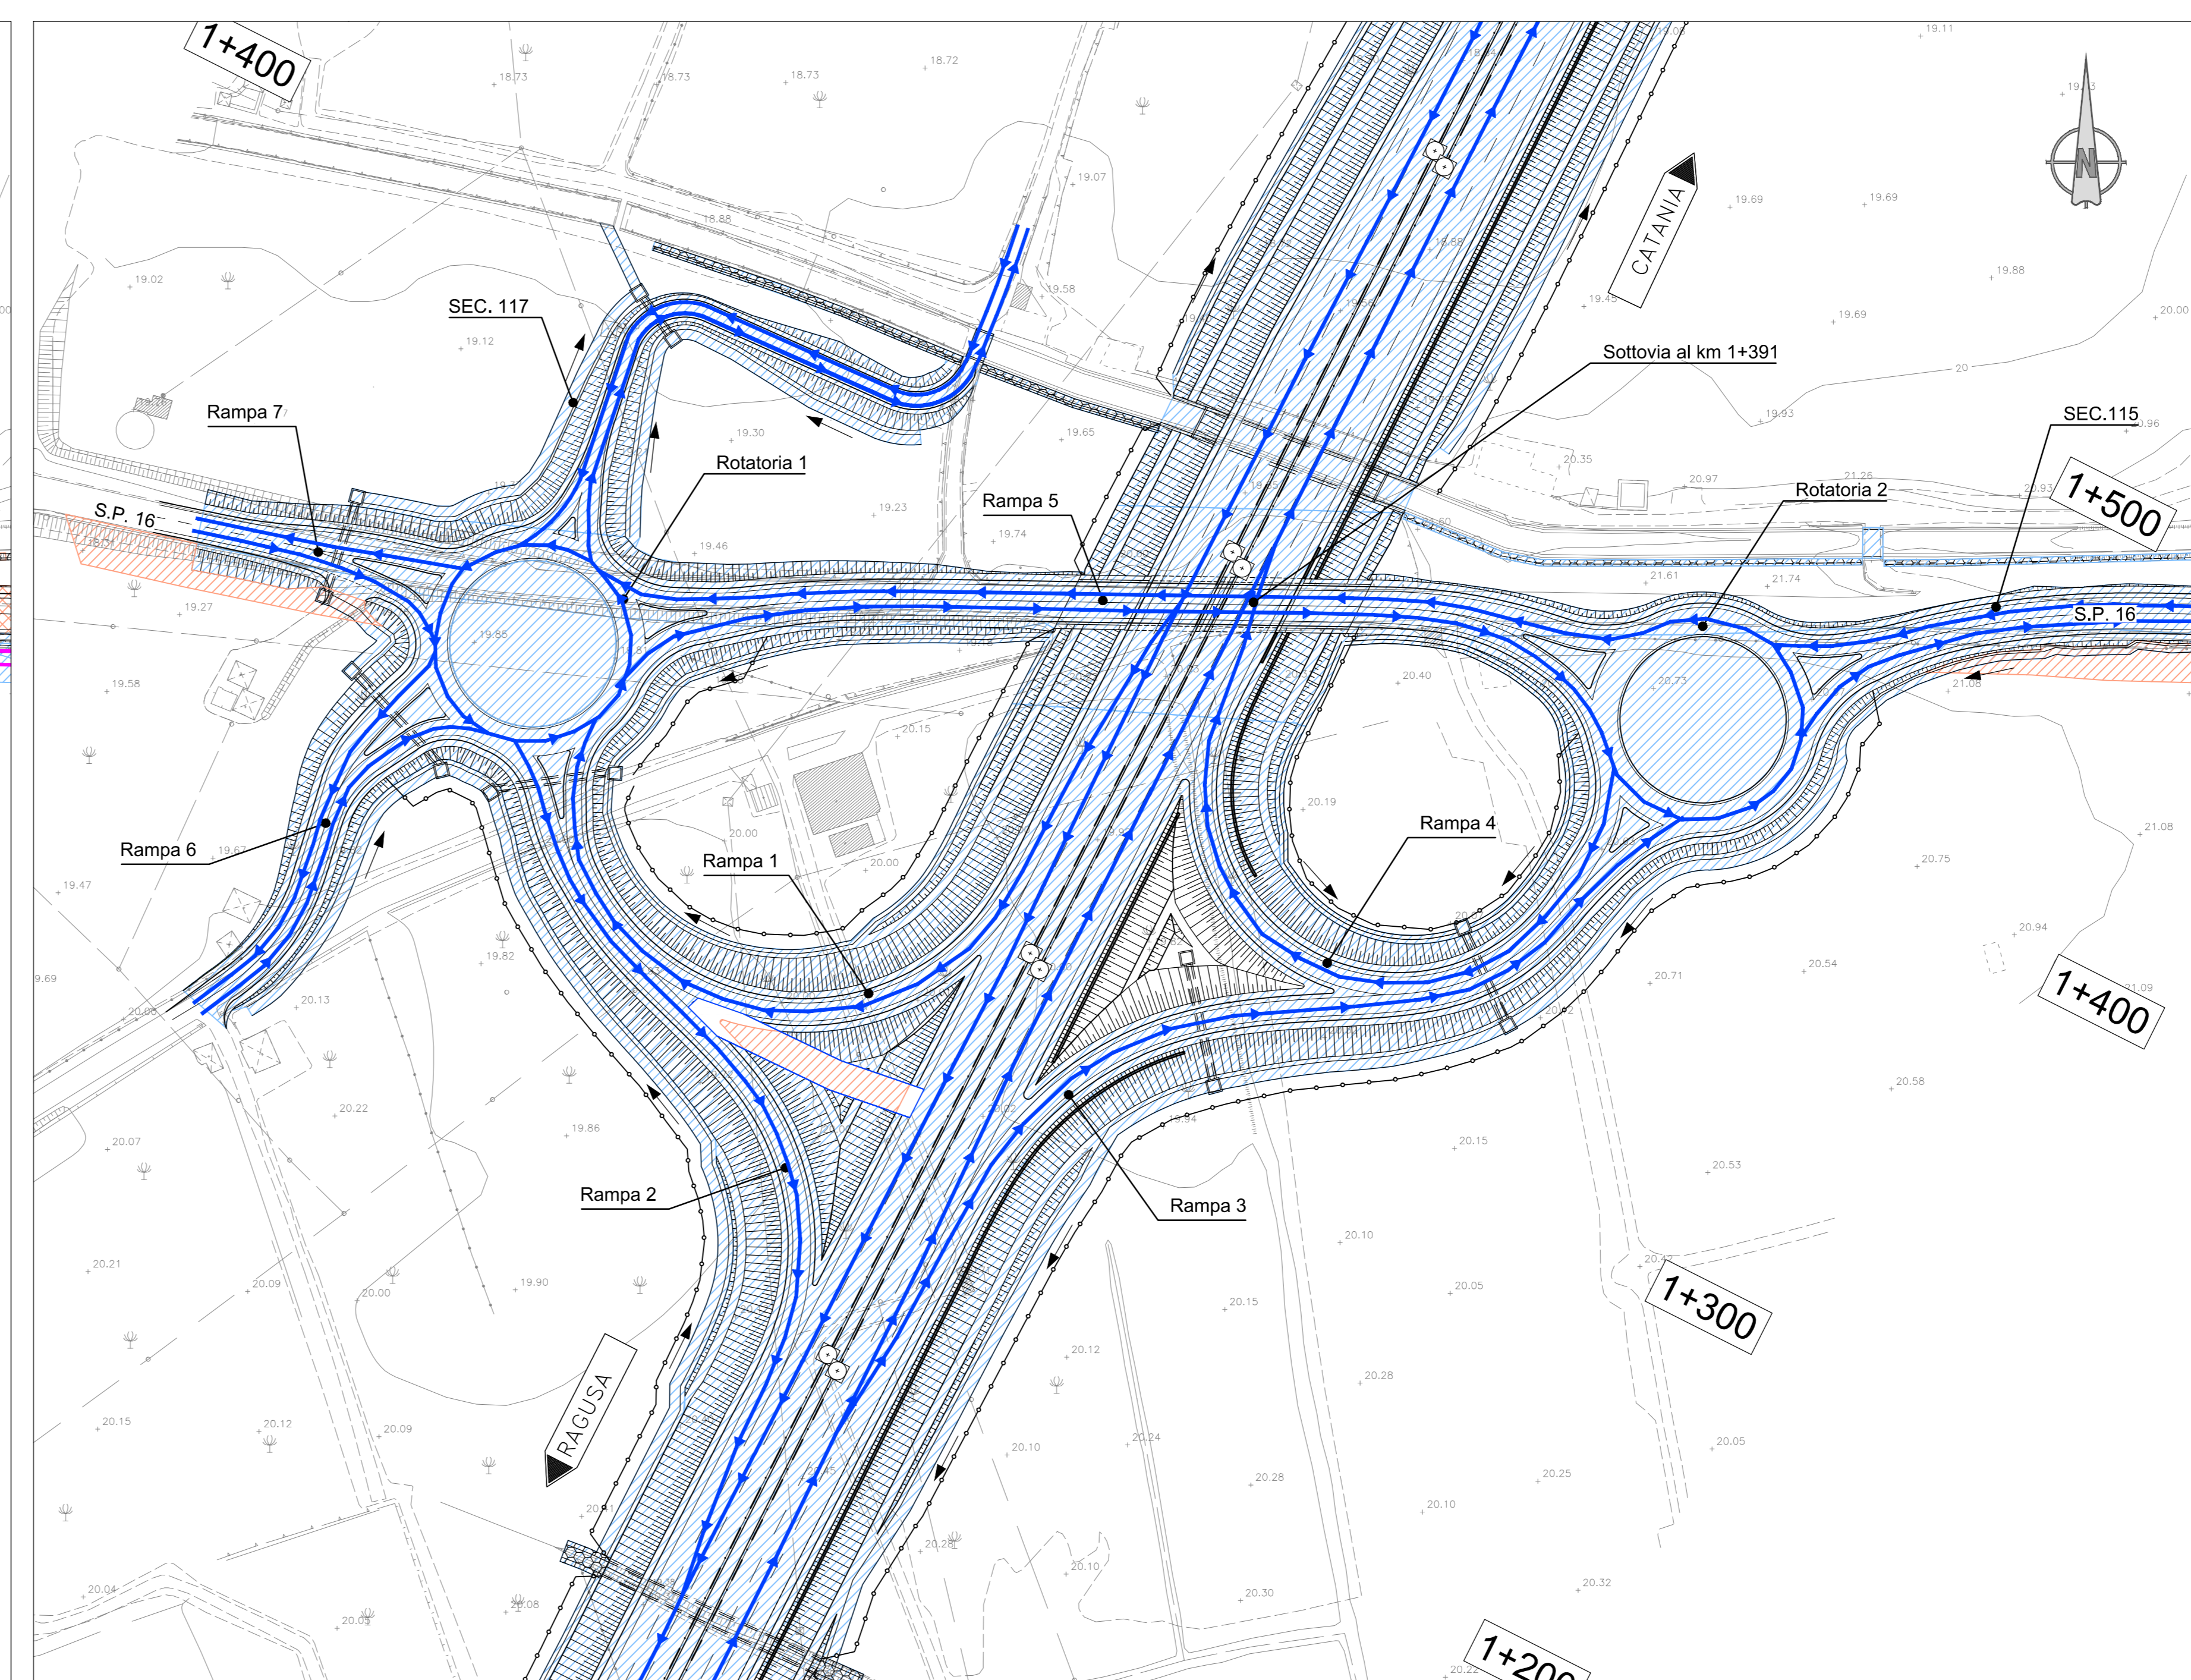


FASE 0

FASE 1
 - TRAFFICO SU SEDE ESISTENTE S.P. 16 CON LOCALI RESTRINGIMENTI
 - REALIZZAZIONE PISTE TEMPORANEE PER DEVIAZIONE TRAFFICO IN FASE 2
 - REALIZZAZIONE SECONDARIA 117 E RAMPE 1, 2, 3, 4, 6 E PARZIALE ROTATORIE 1 E 2 FUORI SEDE
 - REALIZZAZIONE ASSE PRINCIPALE A NORD E A SUD DEL SOTTOVIA

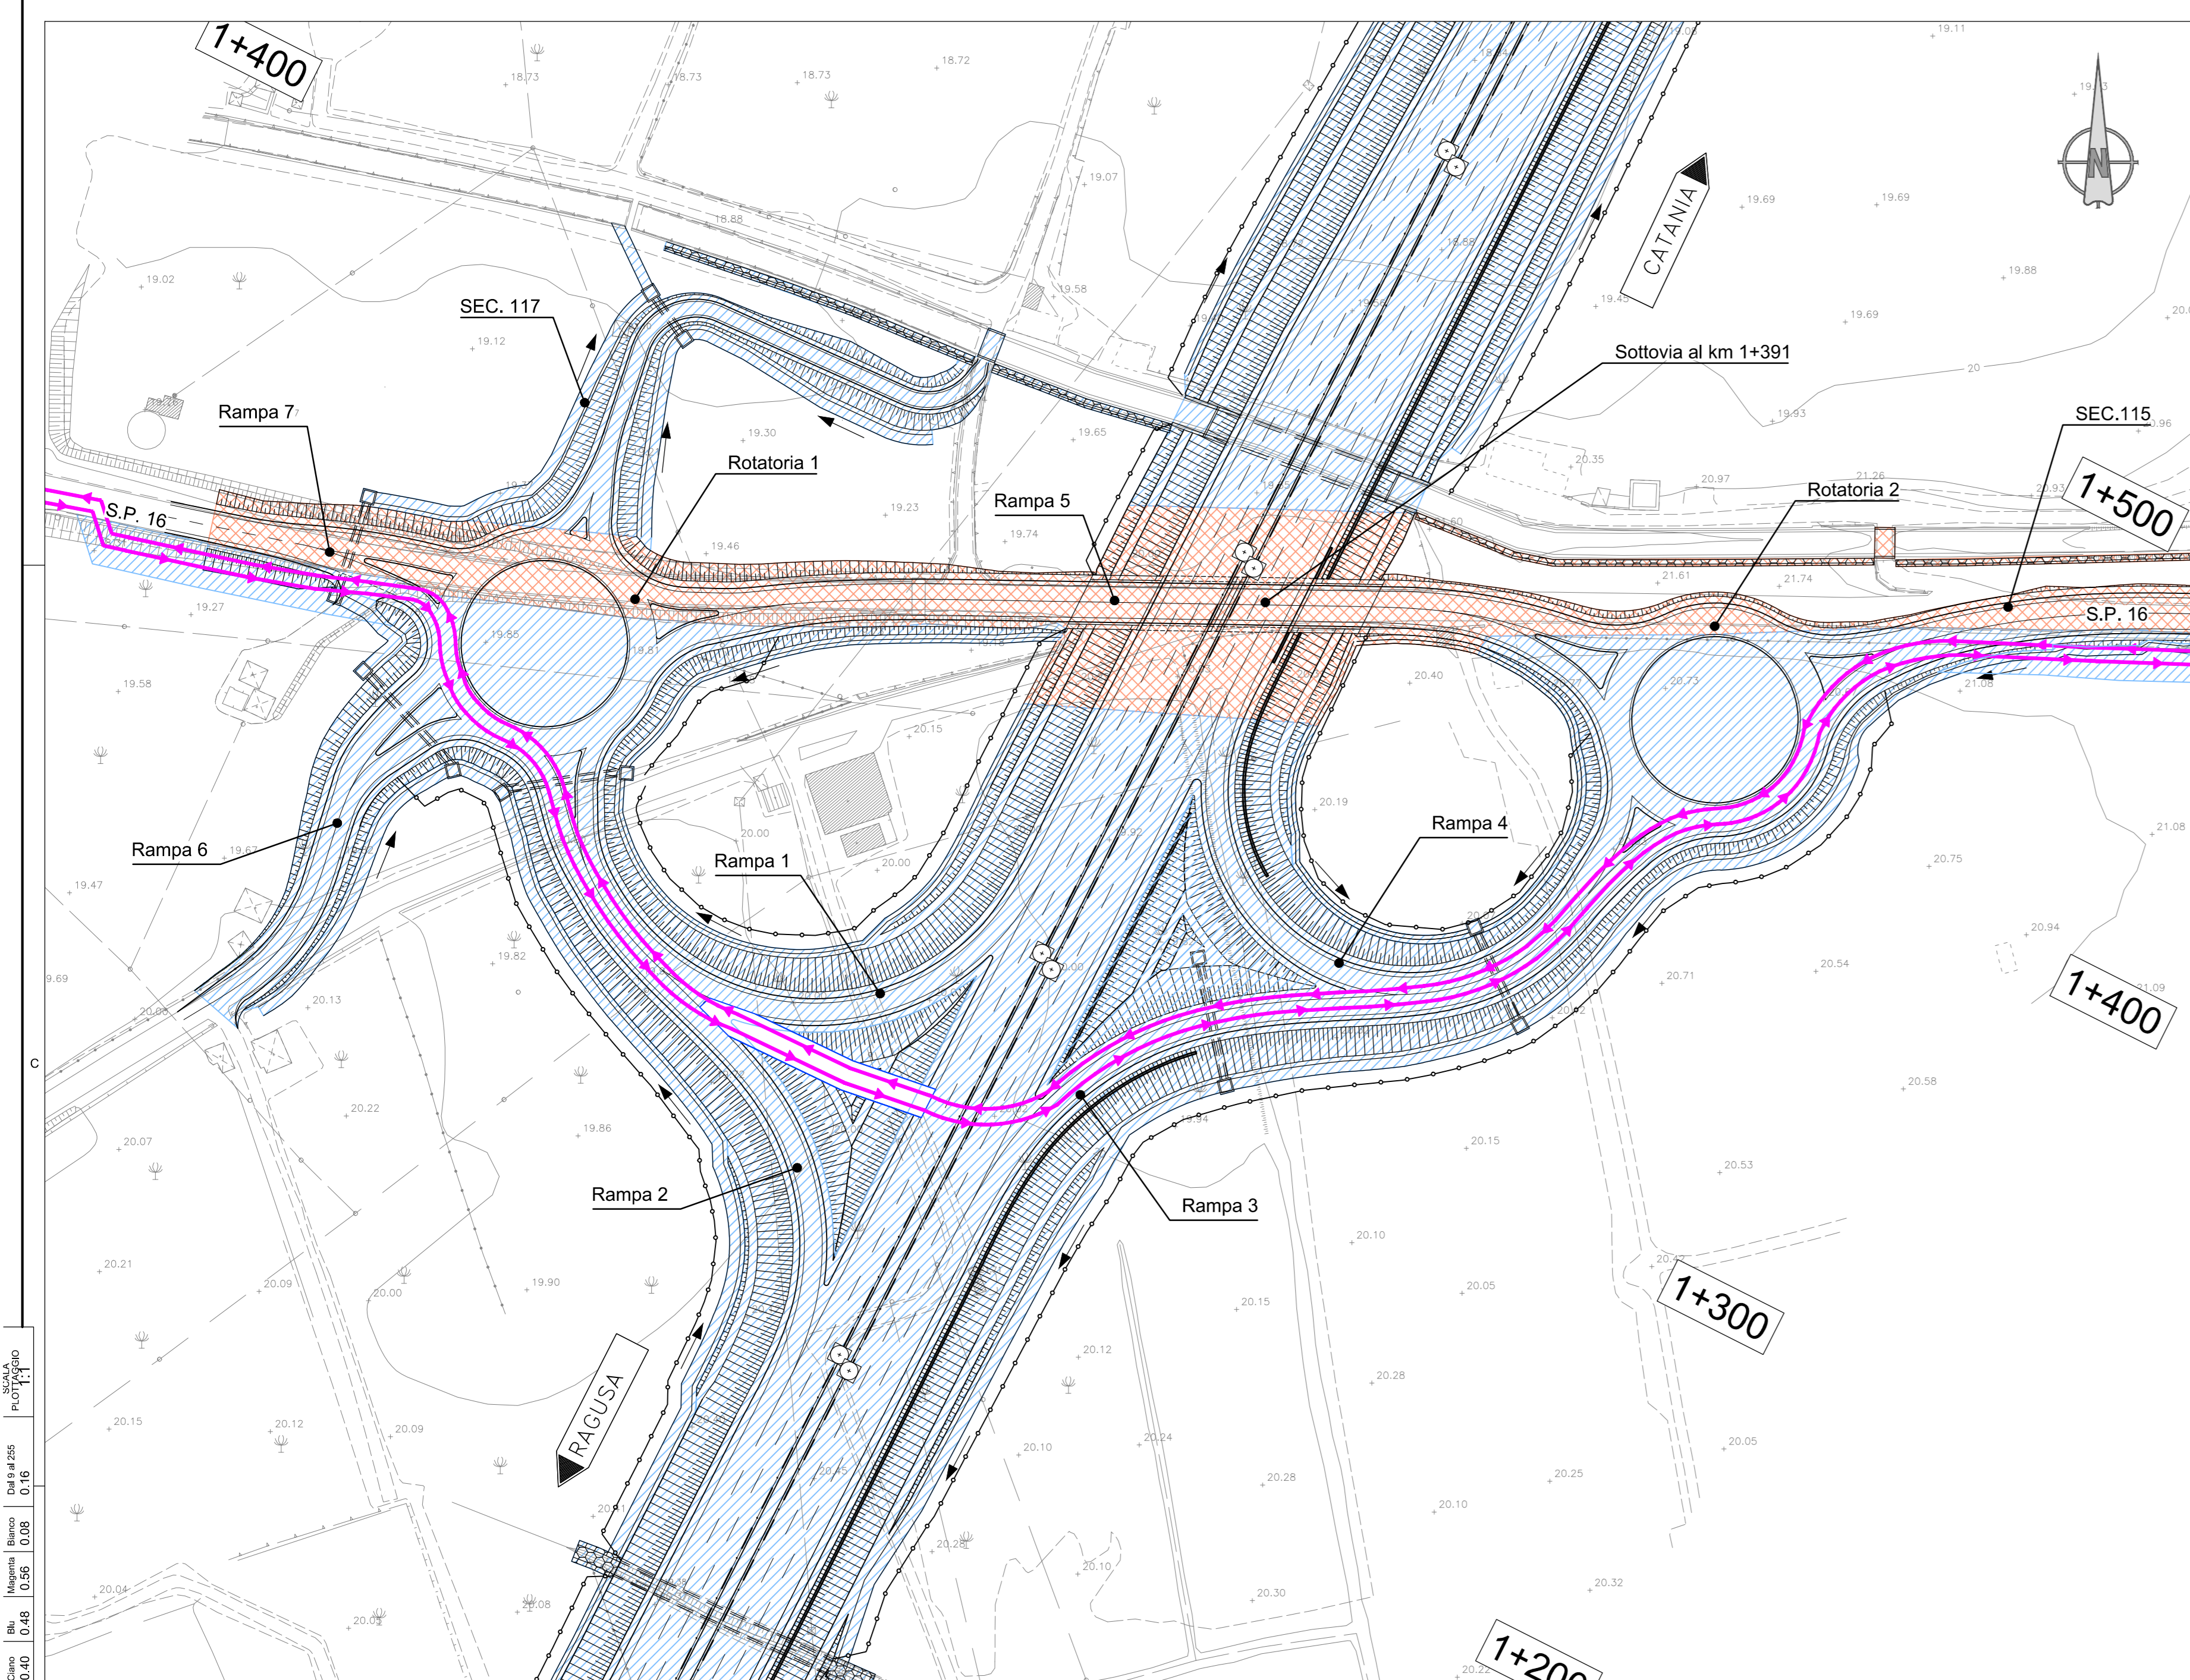

FASE 2
 - DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU PISTE TEMPORANEE, ROTATORIA 1-2, RAMPE 1-2-3 E ASSE PRINCIPALE
 - REALIZZAZIONE DEL SOTTOVIA
 - COMPLETAMENTO RAMPE DI SVINCOLO E ROTATORIE

FASE 3
 - DEMOLIZIONE PISTE TEMPORANEE E RINATURALIZZAZIONE DELLE AREE
 - COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA
 - APERTURA AL TRAFFICO

LEGENDA	
	Opere da realizzare
	Opere in corso di realizzazione
	Opere realizzate
	Traffico in esercizio
	Traffico in fase provvisoria (Rif. D.M. 10/07/2002)

NOTE

- Per il sistema di smaltimento acque di piattaforma ed i relativi dettagli vedere le planimetrie idrauliche e gli elaborati di sezioni tipo
- Traffico sull'attuale sede stradale: traffico su doppio senso di circolazione con almeno una carreggiata carrabile avente larghezza minima di 6,00m. Ove non fosse possibile garantire la larghezza minima sopra indicata si ricorrerà ad una larghezza non inferiore a 5,60m (DM 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnalatici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114.
 (C.U.P. F12C0300000001)

PROGETTO DEFINITIVO

**LOTTO 8
 CANTIERIZZAZIONE
 Svincolo 9 "LENTINI Ospedale"
 Fasi realizzative e deviazione viabilità esistente**

Il Progettista Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni: Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H	Supporto specialistico Ottimizzazione della cantierizzazione delle opere: Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074
Geologo: Dott. Geologo Fabio Melichioni Ordine Geologi del Lazio A.P. n. 663	Geotecnica e opere d'arte minori: Ing. Antonio Alparone
Opere d'arte principali: Viadotti Ing. G. Mondello Gallerie Ing. G. Guittucci	Opere di mitigazione dell'impatto ambientale: Rumore, vibrazioni ed atmosfera altran

IT/CONSULT	GP Ingegneria	DATA	GENNAIO '17
FASE	TR/L	DISCIPLINA/OPERA	DOC
D01	T1	L8-CAI09-1-P7-001-0A	01
REV.	DATA	DESCRIZIONE	VERIFICATO
A	GENNAIO '17	Emissione	E.Fam De Stada Monaco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCESSIONARIO SARC SRL	L'ENTITA' COSTRUTTRICE VETO PER ACCETTAZIONE
----------------------------------	-------------------------------	---
