




- (A) FASI DI LAVORAZIONE LATO NORD-OVEST**
- 01A — ESECUZIONE DEGLI SCAVI DI SBANCAMENTO GENERALE FINO A QUOTA ESTRADOSSO DELLE TRAVI DI CORONAMENTO DEI PALI, LASCIANDO APERTA LA CIRCOLAZIONE SU VIA FERMI
 - 02A — REALIZZAZIONE DEI PALI #120cm E DEI MICROPALI
- (B) FASI DI LAVORAZIONE SU VIA FERMI**
- 01B — CHIUSURA DEL TRAFFICO SU VIA FERMI E ESECUZIONE DEI RIMANENTI SCAVI DI SBANCAMENTO GENERALE FINO A QUOTA ESTRADOSSO DELLE TRAVI DI CORONAMENTO DEI PALI
 - 02B — REALIZZAZIONE DEI PALI #120cm E DEI MICROPALI RIMANENTI

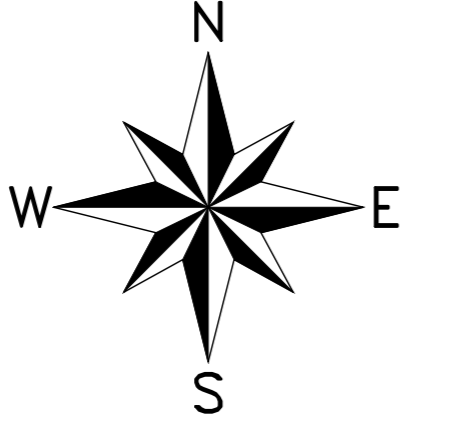

NOTA: LE FASI CONTRASSEGNAE CON LA LETTERA "A" POSSONO ESSERE EFFETTUATE PRIMA DELLE FASI CON LA LETTERA "B", NELL'OTTICA DI INTERRUPIRE IL TRAFFICO SU VIA FERMI PER IL MINOR TEMPO POSSIBILE

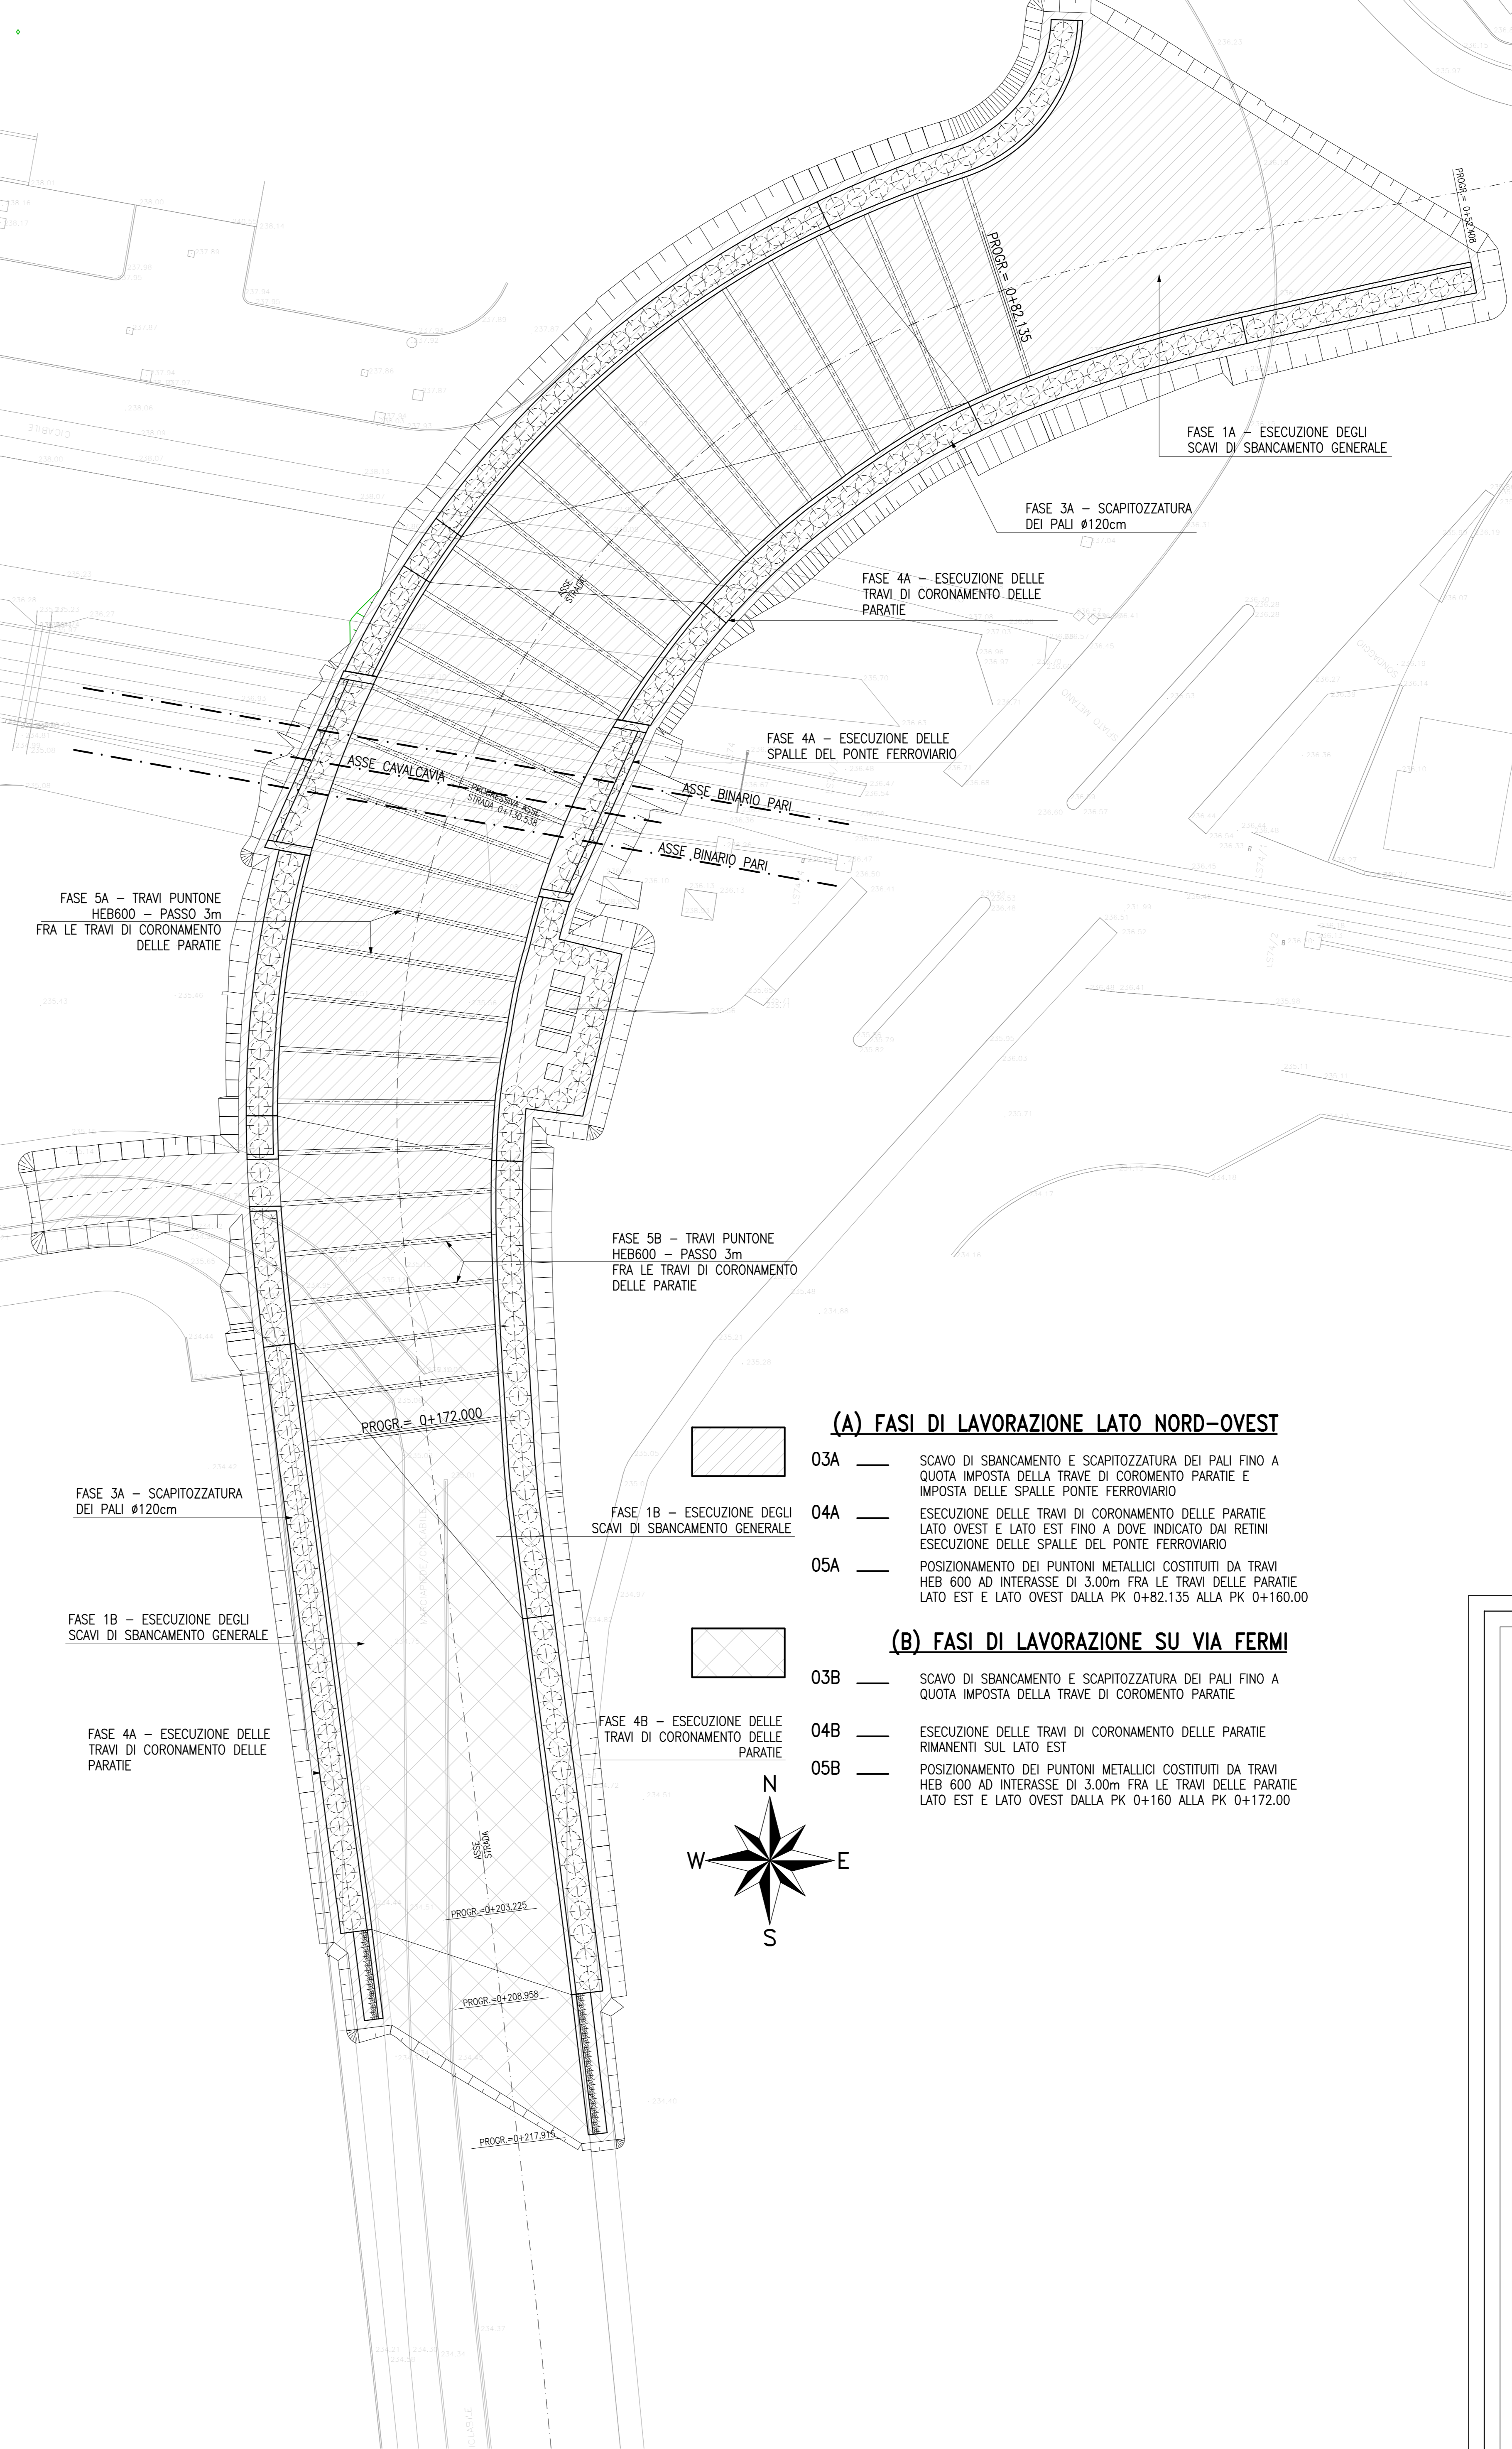

- (A) FASI DI LAVORAZIONE LATO NORD-OVEST**
- 03A — SCAVO DI SBANCAMENTO E SCAPITIZZATURA DEI PALI FINO A QUOTA IMPOSTA DELLA TRAVE DI CORONAMENTO PARATIE E IMPOSTA DELLE SPALLE PONTE FERROVIARIO
 - 04A — ESECUZIONE DELLE TRAVI DI CORONAMENTO DELLE PARATIE LATO OVEST E LATO EST FINO A DOVE INDICATO DAI RETINI ESECUZIONE DELLE SPALLE DEL PONTE FERROVIARIO
 - 05A — POSIZIONAMENTO DEI PUNTONI METALLICI COSTITUITI DA TRAVI HEB 600 AD INTERASSE DI 3.00m FRA LE TRAVI DELLE PARATIE LATO EST E LATO OVEST DALLA PK 0+82.135 ALLA PK 0+160.00
- (B) FASI DI LAVORAZIONE SU VIA FERMI**
- 03B — SCAVO DI SBANCAMENTO E SCAPITIZZATURA DEI PALI FINO A QUOTA IMPOSTA DELLA TRAVE DI CORONAMENTO PARATIE RIMANENTI SUL LATO EST
 - 04B — ESECUZIONE DELLE TRAVI DI CORONAMENTO DELLE PARATIE RIMANENTI SUL LATO EST
 - 05B — POSIZIONAMENTO DEI PUNTONI METALLICI COSTITUITI DA TRAVI HEB 600 AD INTERASSE DI 3.00m FRA LE TRAVI DELLE PARATIE LATO EST E LATO OVEST DALLA PK 0+160 ALLA PK 0+172.00

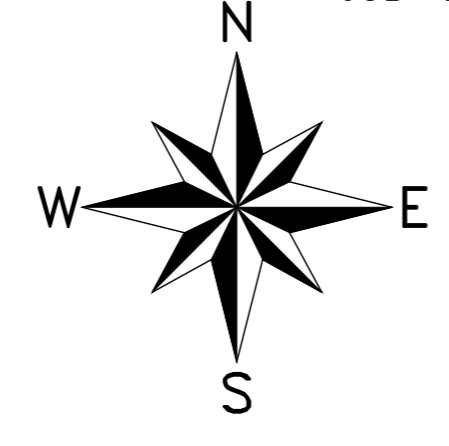

Per Tabella Materiali: vedi tav. NB1R00D26TTOC0000001A

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DURANTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE ADOTTATI TUTTI GLI ACCORGIMENTI ATTI AD ASSICURARE CHE A PALI COMPLETATI SIANO GARANTITI LA LARGHEZZA INTERNA DELLE RAMPE E GLI SPESSORI DI PROGETTO DELLE RIFODERE

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

CUP: J64H17000140001

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELO

APPALTO 2: PRG PONTE SAN PIETRO E RADDOPPIO DELLA LINEA DA CURNO A BERGAMO

VIGI PONTE DI VIA ENRICO FERMI
FASI REALIZZATIVE TAV.1/2

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	F. Sempì	Marzo 2020	A. Marzani	Marzo 2020	M. Bertignoni	Marzo 2020	A. Parigi	Marzo 2020

File: NB1R02D26B9VI0600001A.dwg n. Esab.:
