


PLANIMETRIA FASI 11-12
SCALA 1:500

FASI DI LAVORAZIONE


- 11 SPINTA DEL MONOLITE SOTTO I BINARI CON PROGRESSIVA DEMOLIZIONE DEI JET-GROUTING SUL FRONTE DI SCAVO SCAVO DI RIBASSO LUNGO RAMPA NORD ATTIVAZIONE SISTEMA DI EMUNIMENTO INTERNO AI VARI COMPARTI E PUNTELLAZIONE PROVVISORIA DEI DIAFRAMMI REALIZZAZIONE DEI MURI AD "U" LATO SUD
- 12 RIMOZIONE DEL PONTE GUIDO (durante I.P.O. notturna) DEMOLIZIONE DEI CORDOLI GUIDA REALIZZAZIONE DEI MURI DELLA CAMERA DI VARO DEMOLIZIONE PARZIALE DELLA TRAVE REGOSPINTA

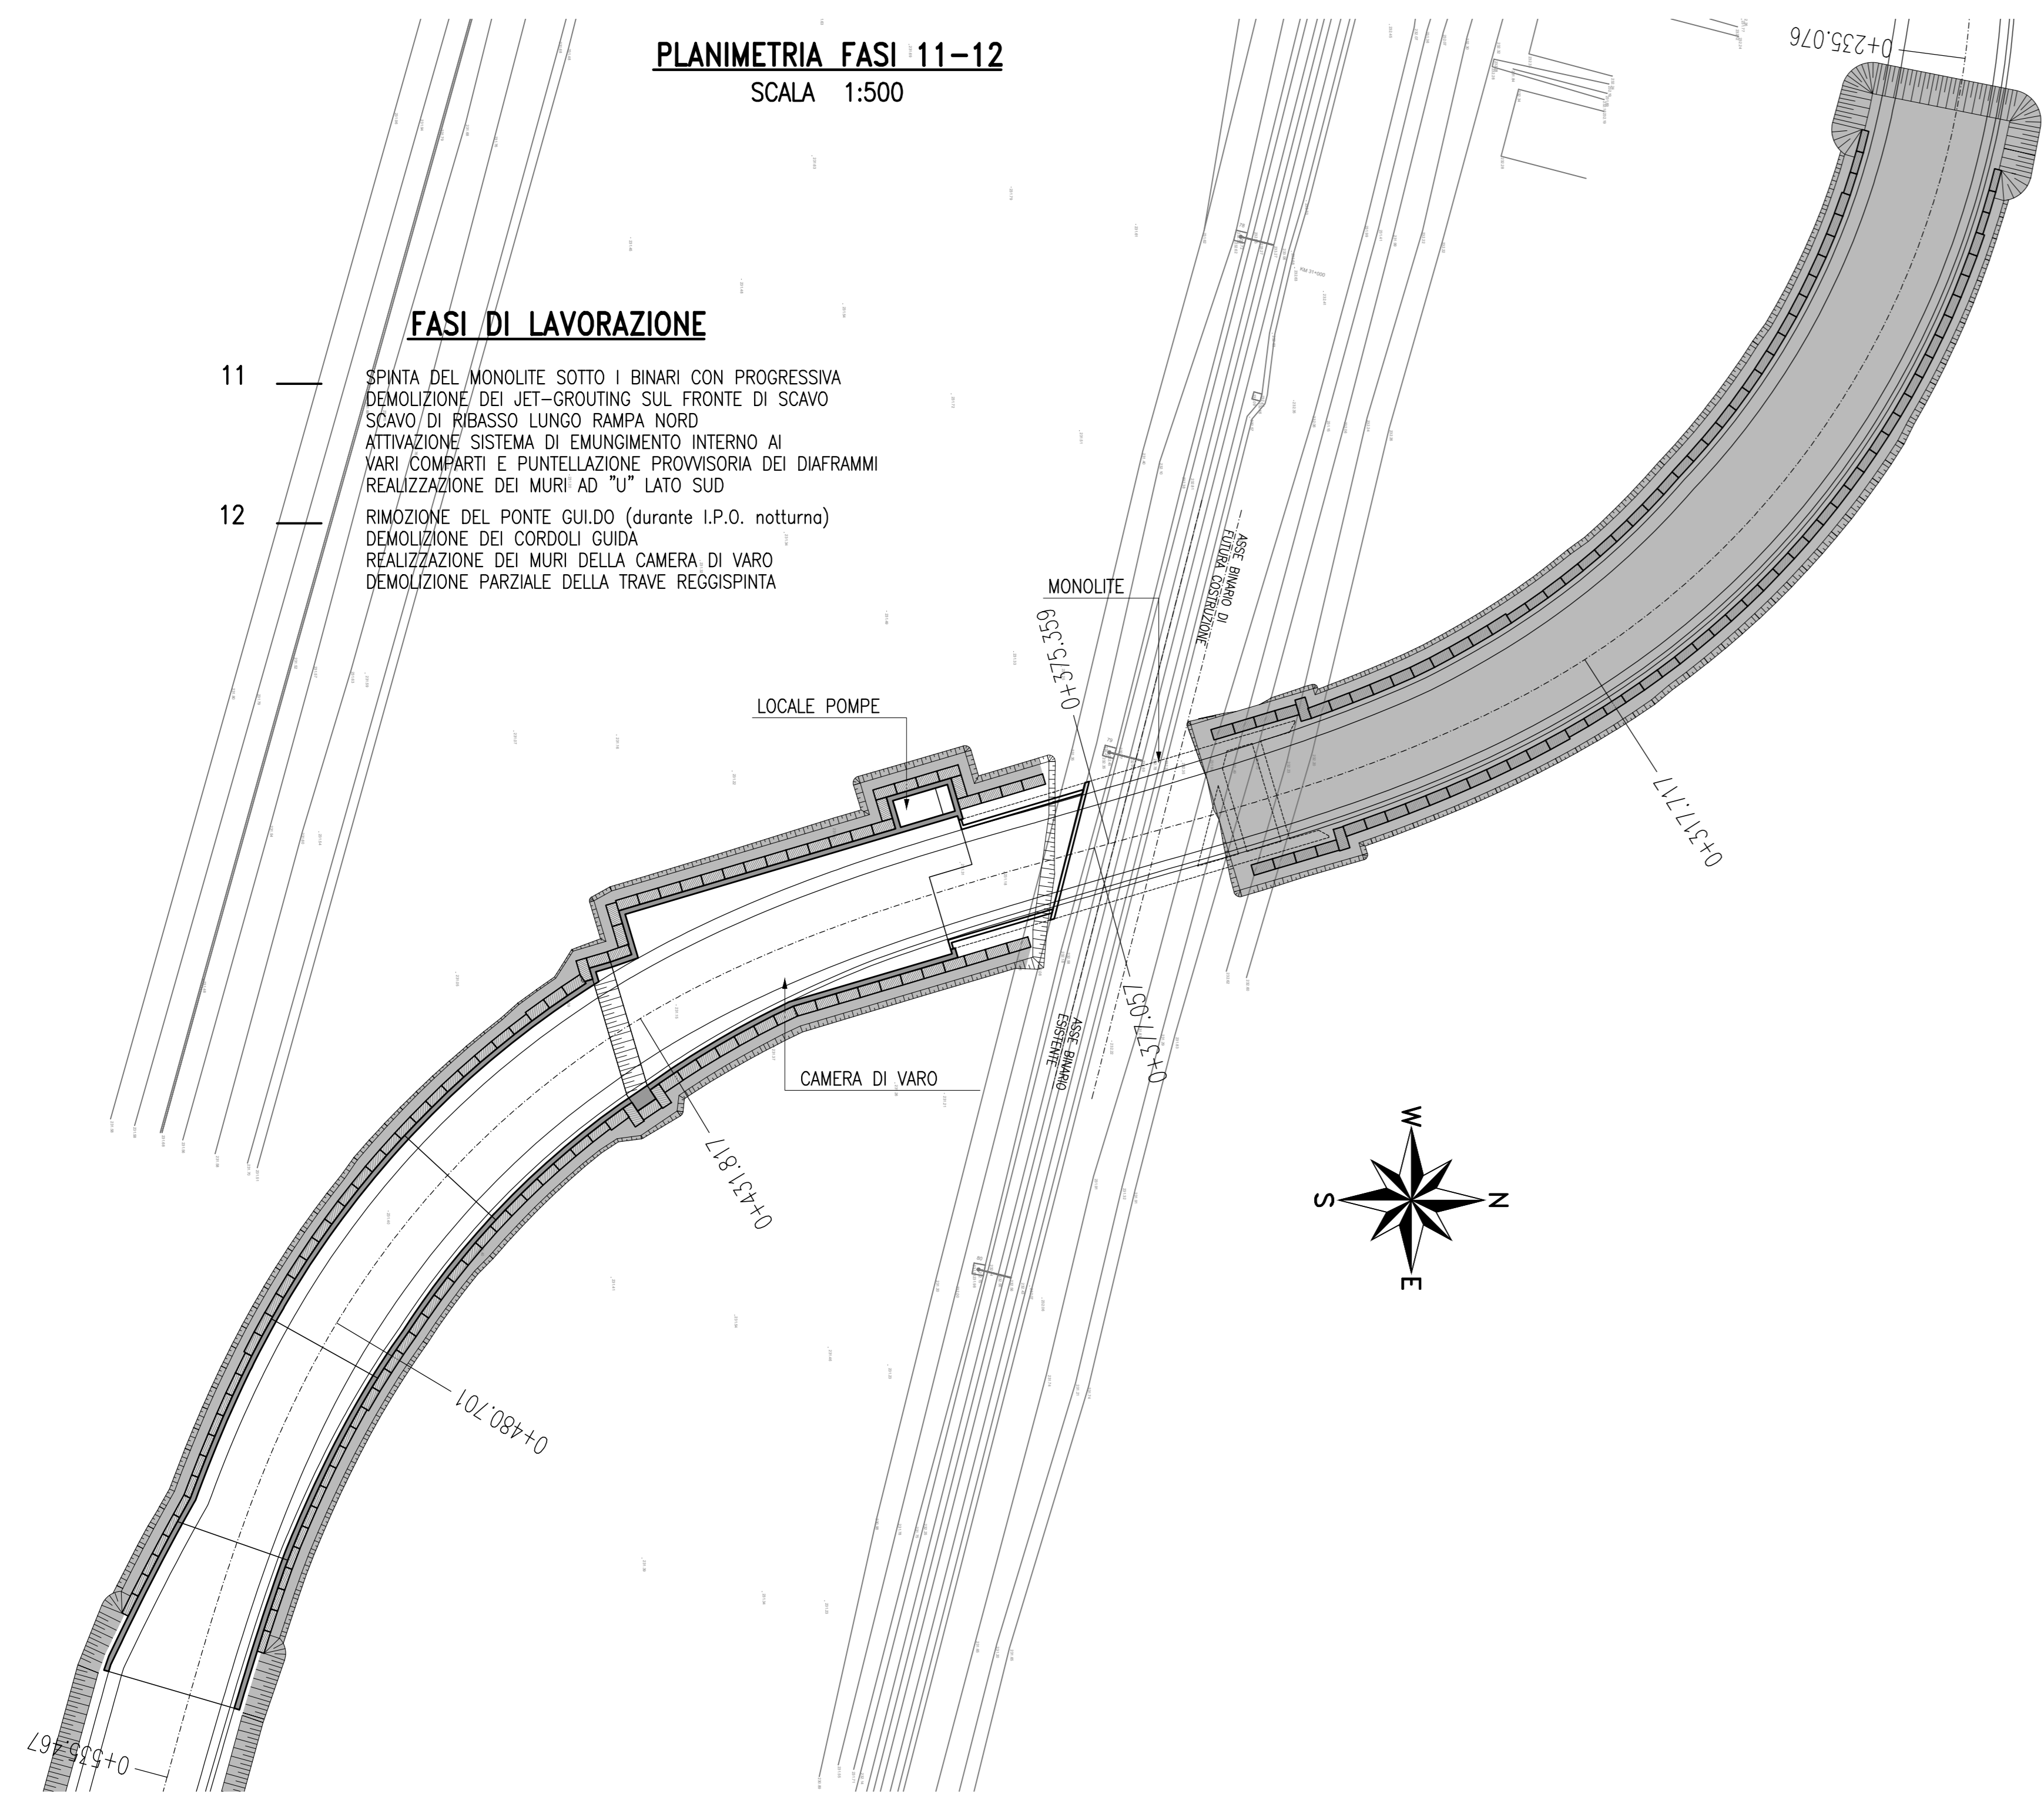

PLANIMETRIA FASI 13-14
SCALA 1:500

FASI DI LAVORAZIONE


- 13 REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DEI MURI AD "U" RAMPA LATO NORD DEMOLIZIONE DEL ROSTRO DEL MONOLITE A MATURAZIONE AVVENUTA DELLE FONDAZIONI DEI MURI AD "U" SI POTRA' TOGLIERE LA PUNTELLAZIONE PROVVISORIA DEI DIAFRAMMI
- 14 REALIZZAZIONE DEI MURETTI E DELLA SOLETTA DI COPERTURA DELLA VASCA DI ACCUMULO SOPRA LA PLATEA DI VARO COMPLETAMENTO DEL LOCALE POMPE

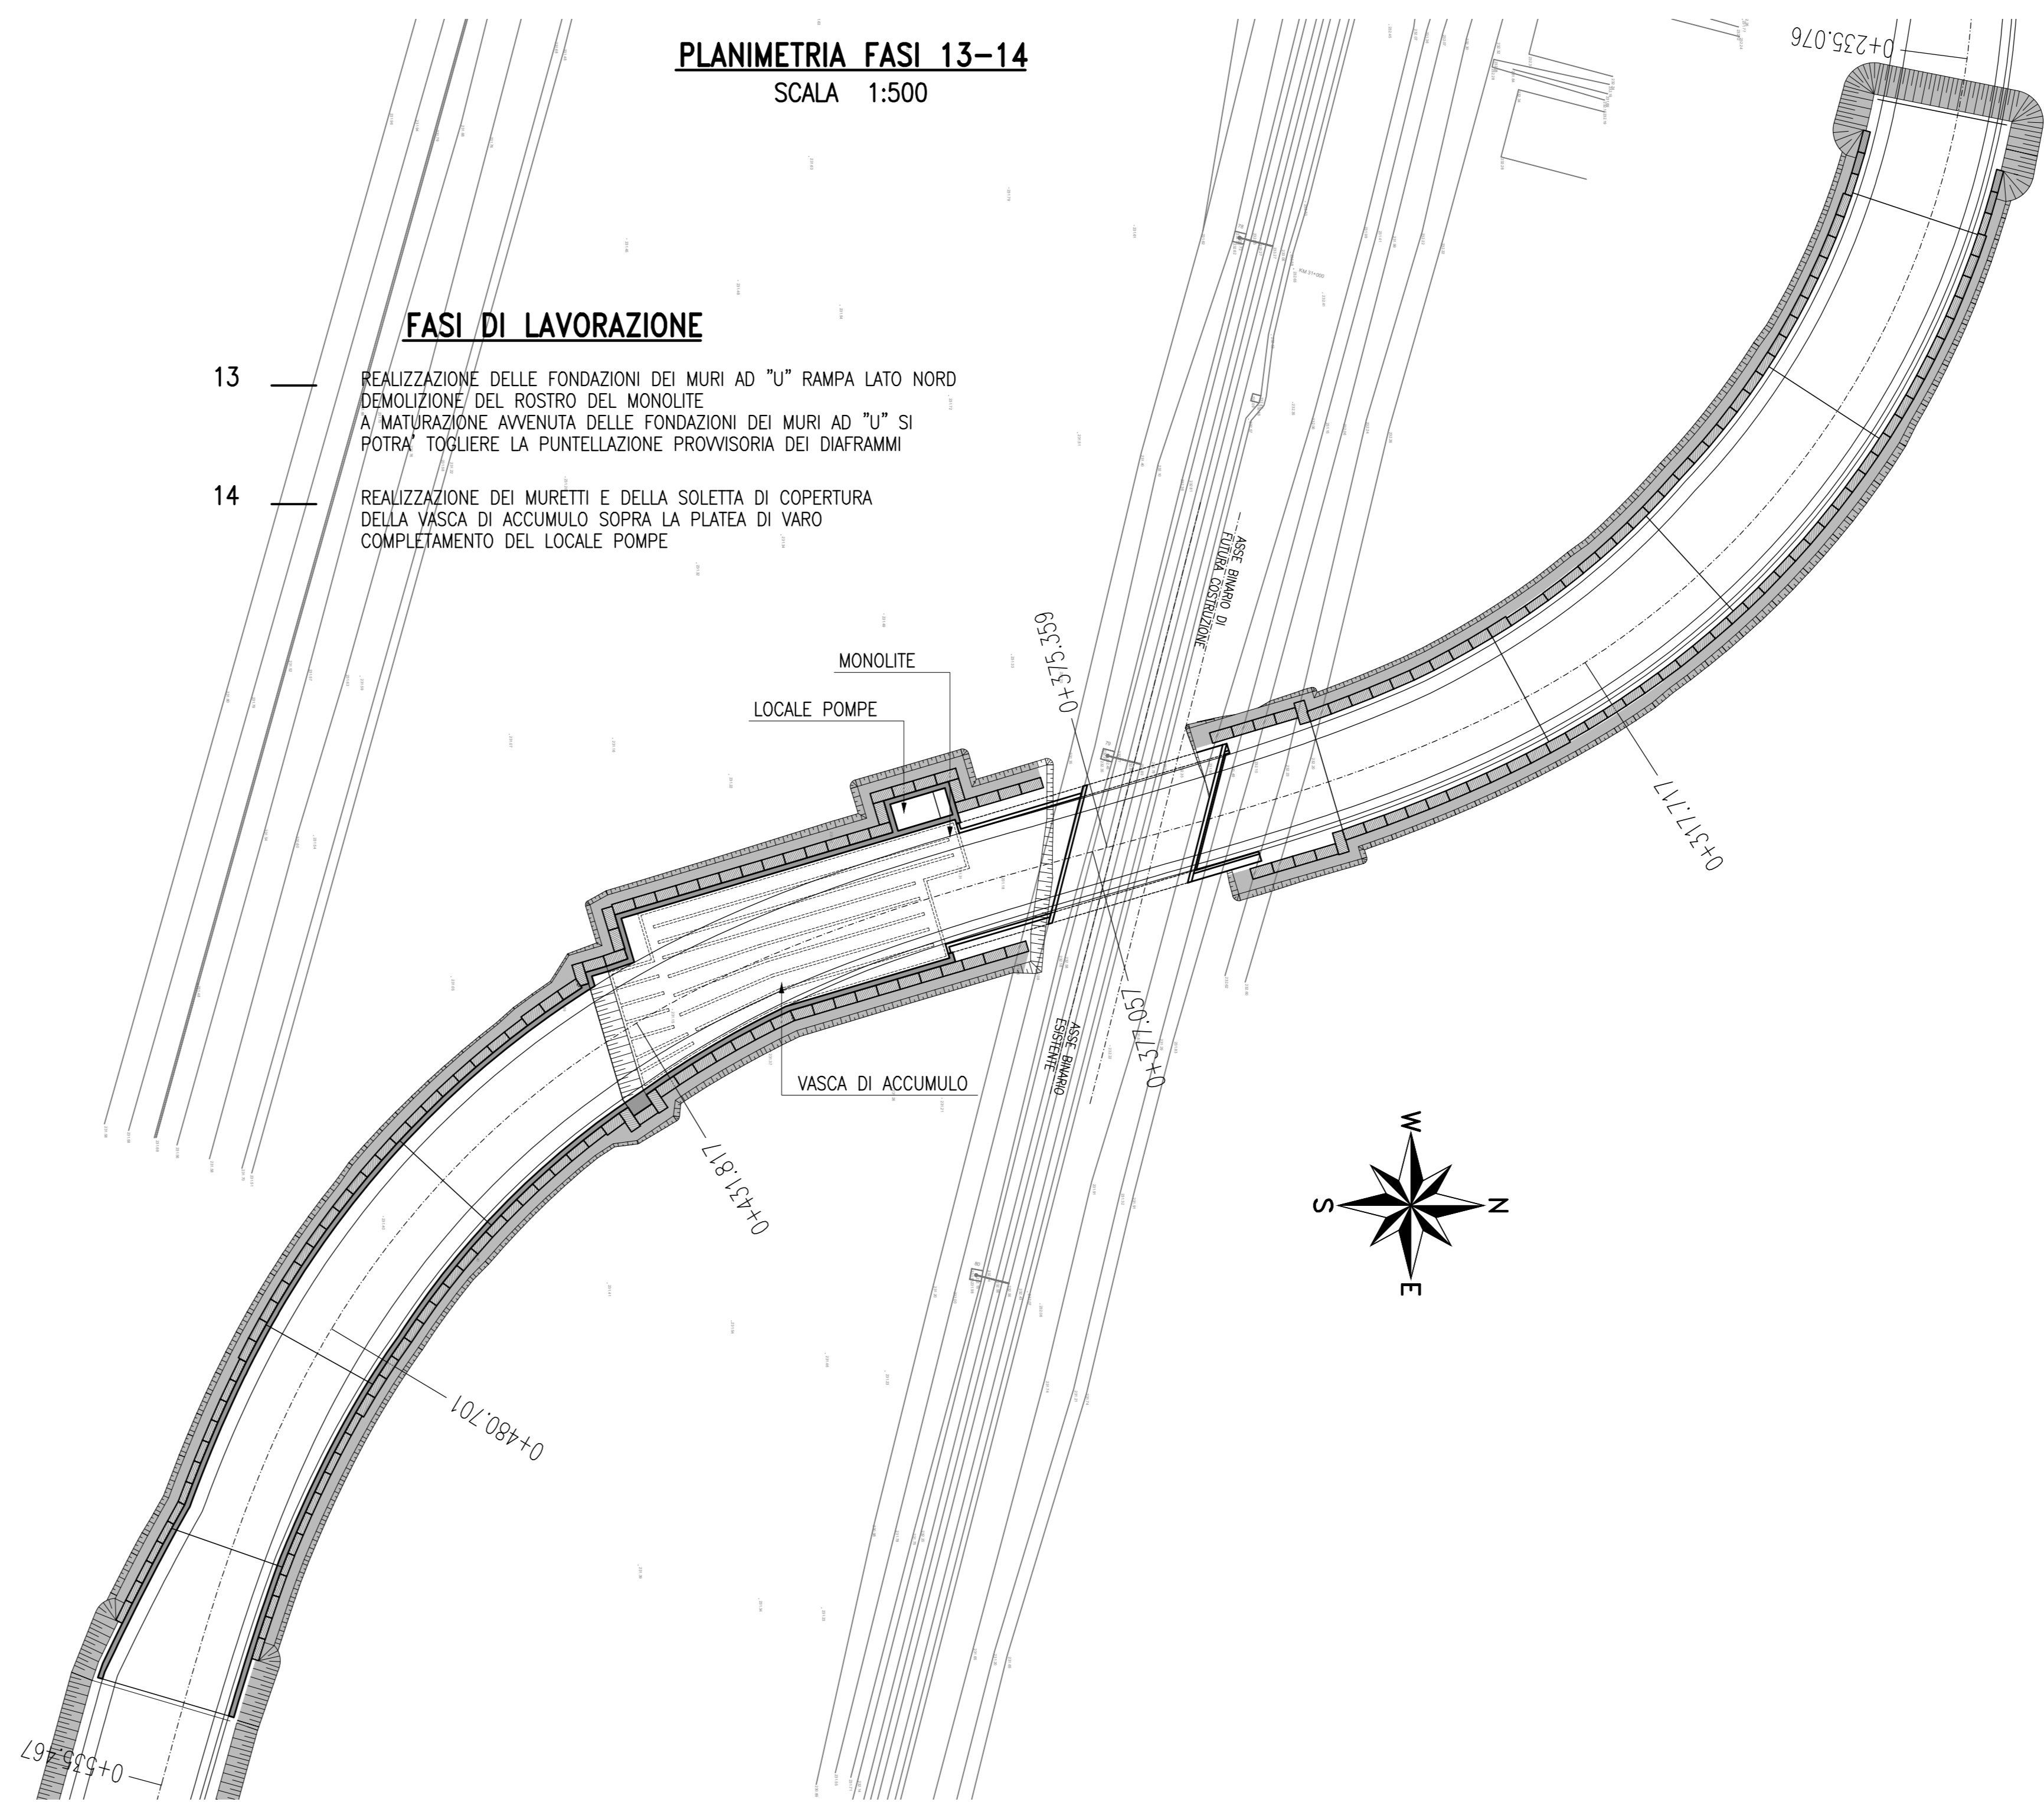

PLANIMETRIA FASI 15-16
SCALA 1:500

FASI DI LAVORAZIONE


- 15 REALIZZAZIONE DEI MURI AD "U" RAMPA LATO NORD
- 16 COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE LATO SUD

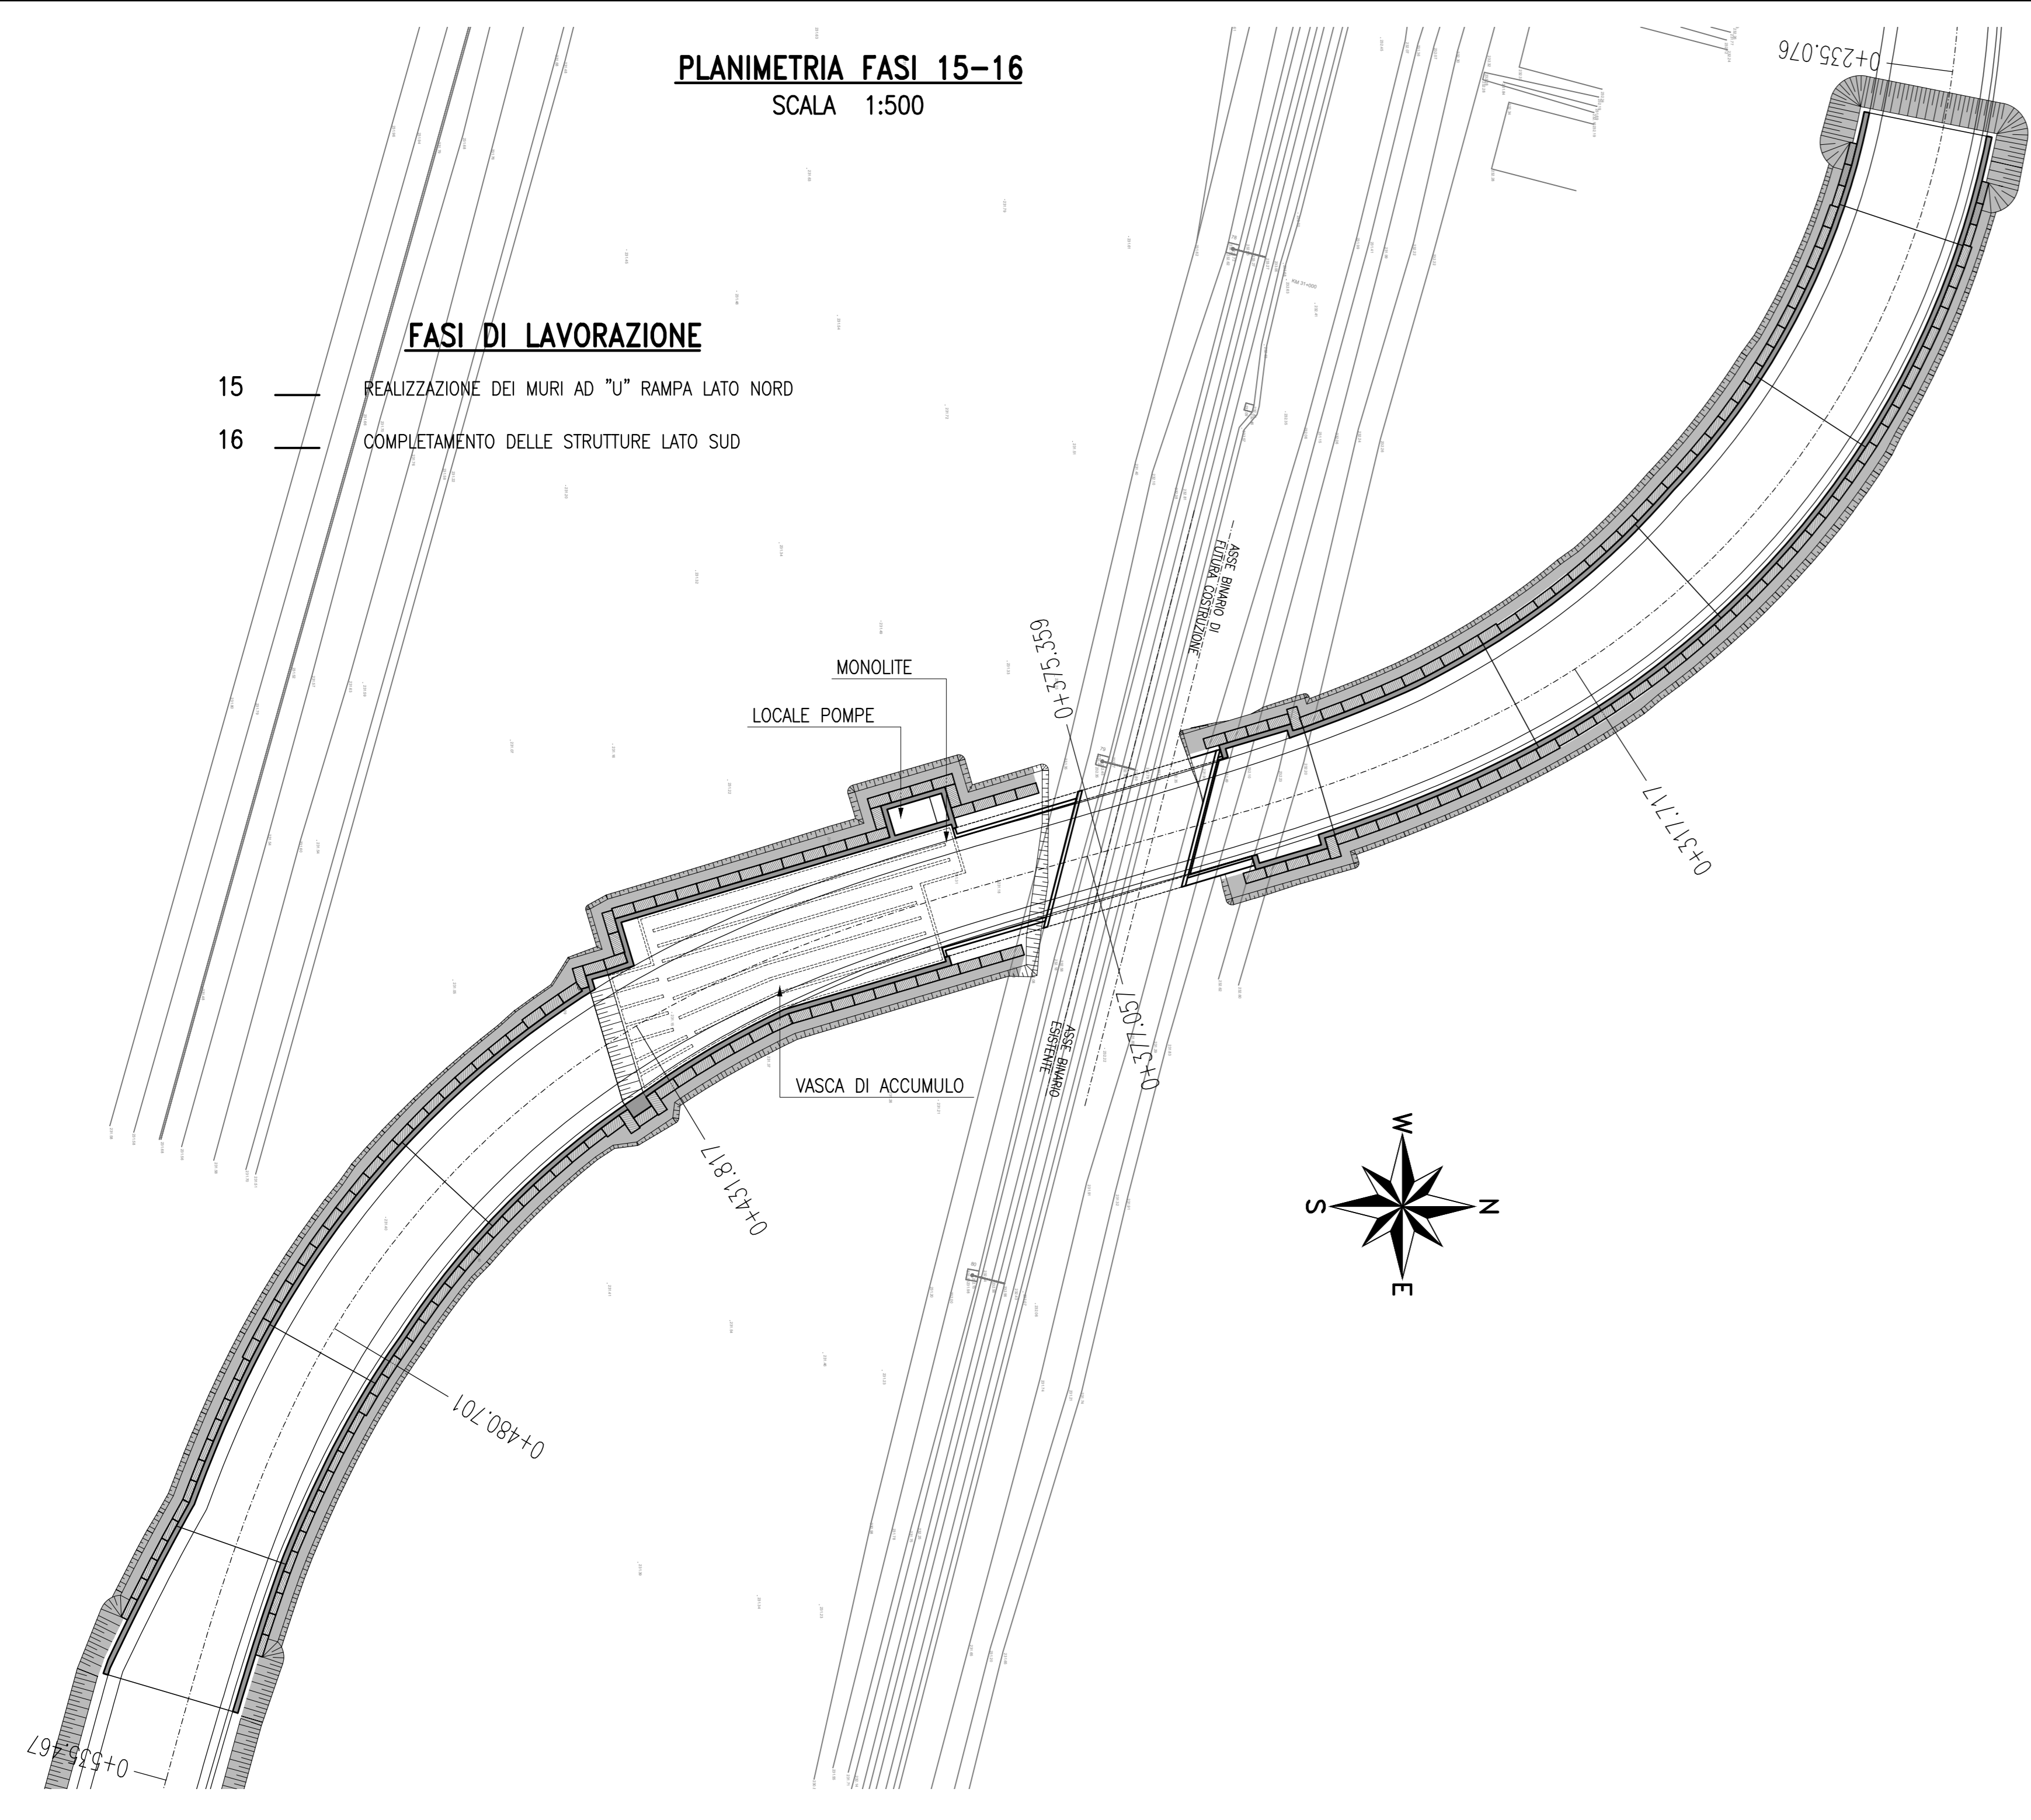

PLANIMETRIA FASI 17-18
SCALA 1:500

FASI DI LAVORAZIONE

- 17 REALIZZAZIONE DEI MURI A "T" ROVESCIO REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE INSTALLAZIONE PARAPETTI E FINITURE
- 18 RIPRISTINO DEI LUOGHI

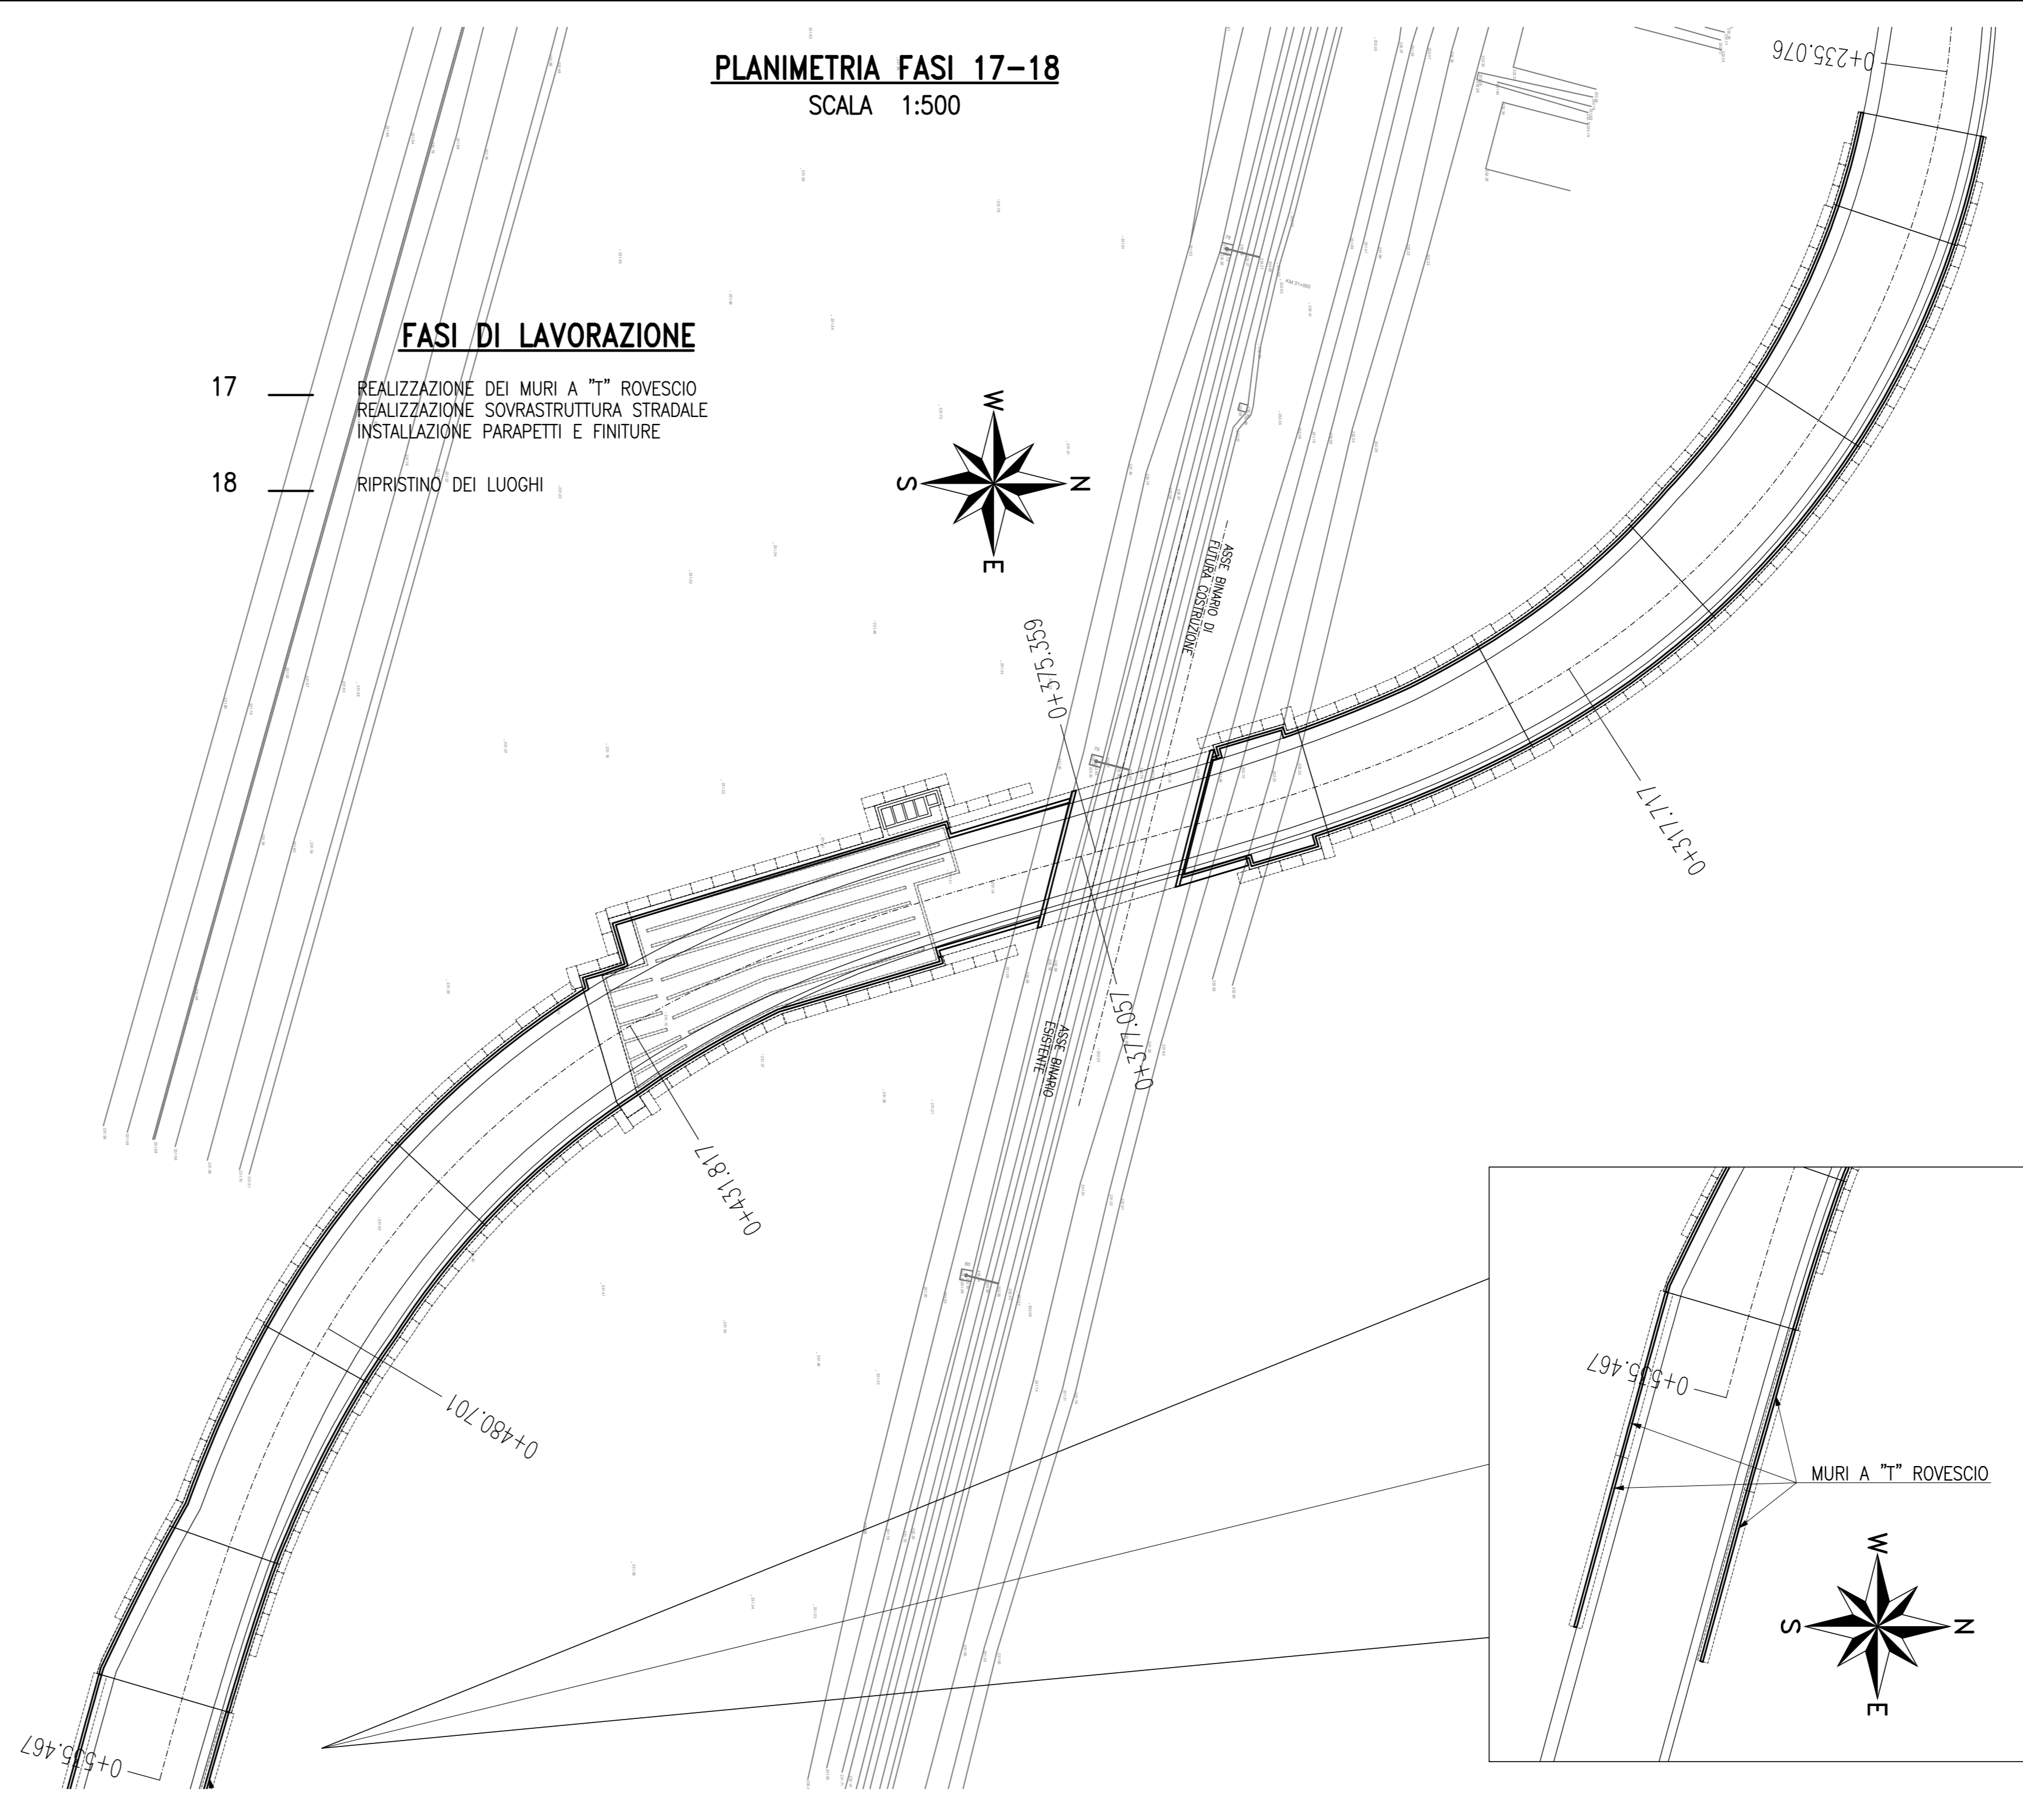

Per Tabella Materiali: vedi tav. NB1R00D26TTOC0000001A

COMMITTENTE: 
 PROGETTAZIONE: 
 CUP: J64H17000140001
 U.O. INFRASTRUTTURE NORD
 PROGETTO DEFINITIVO
 RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO
 APPALTO 8: OPERE SOSTITUTIVE PER SOPPRESSIONE PL TRA BERGAMO E MONTELLO
 OPERE D'ARTE
 Nuovo sottovia km 31+085 LS (tratta Bergamo-Montello)
 Fasi realizzative Tav. 3/3

SCALA: 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Sempit	Marzo 2020	A. Manzi	Marzo 2020	M. Sestini	Marzo 2020	A. Parigi Marzo 2020

File: NB1R00D26B9SL0300003A.dwg n. Elab.:
