




**FASE 1 - Venerdì sera dalle ore 18:00 alle 22:00-**  
 -Chiusura FF.SS. Linea Lenta B0-PD  
 -Rimozione linee elettriche e collegamenti binari ponte esistente

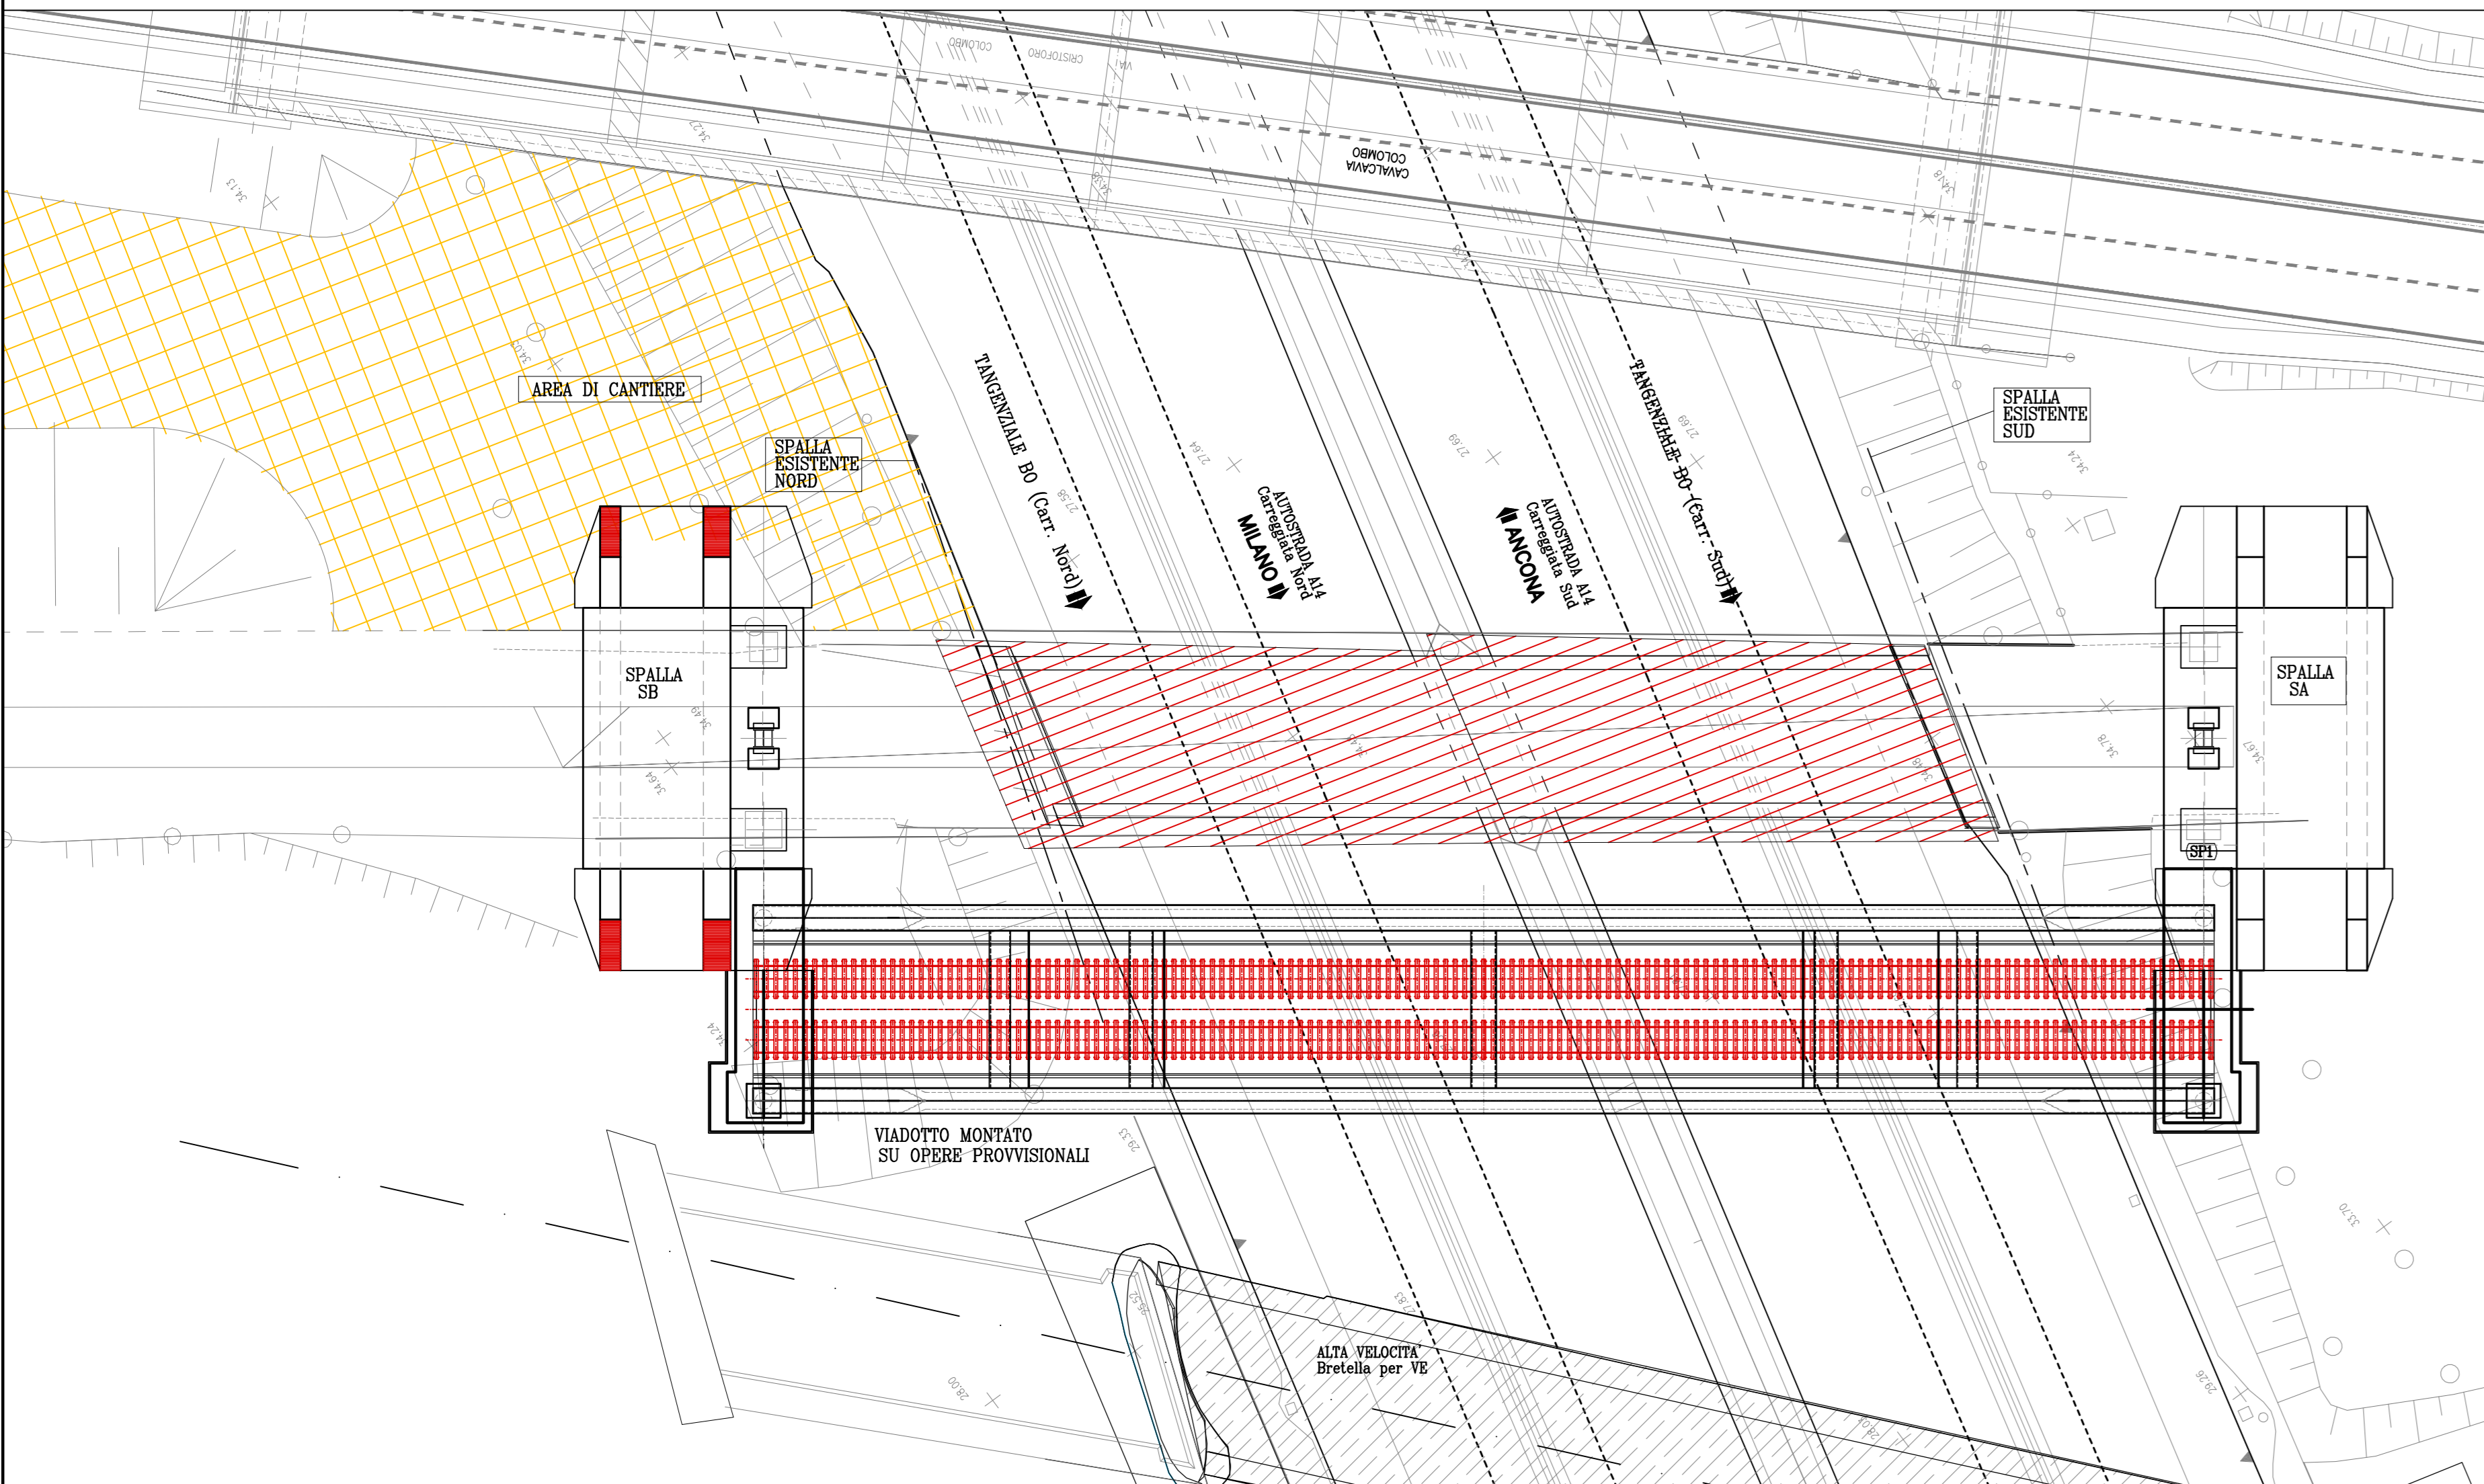


**FASE 3b -Sabato dalle 6:00 alle 22:00**  
 -Posizionamento di traversa per traslazione viadotto su spalle

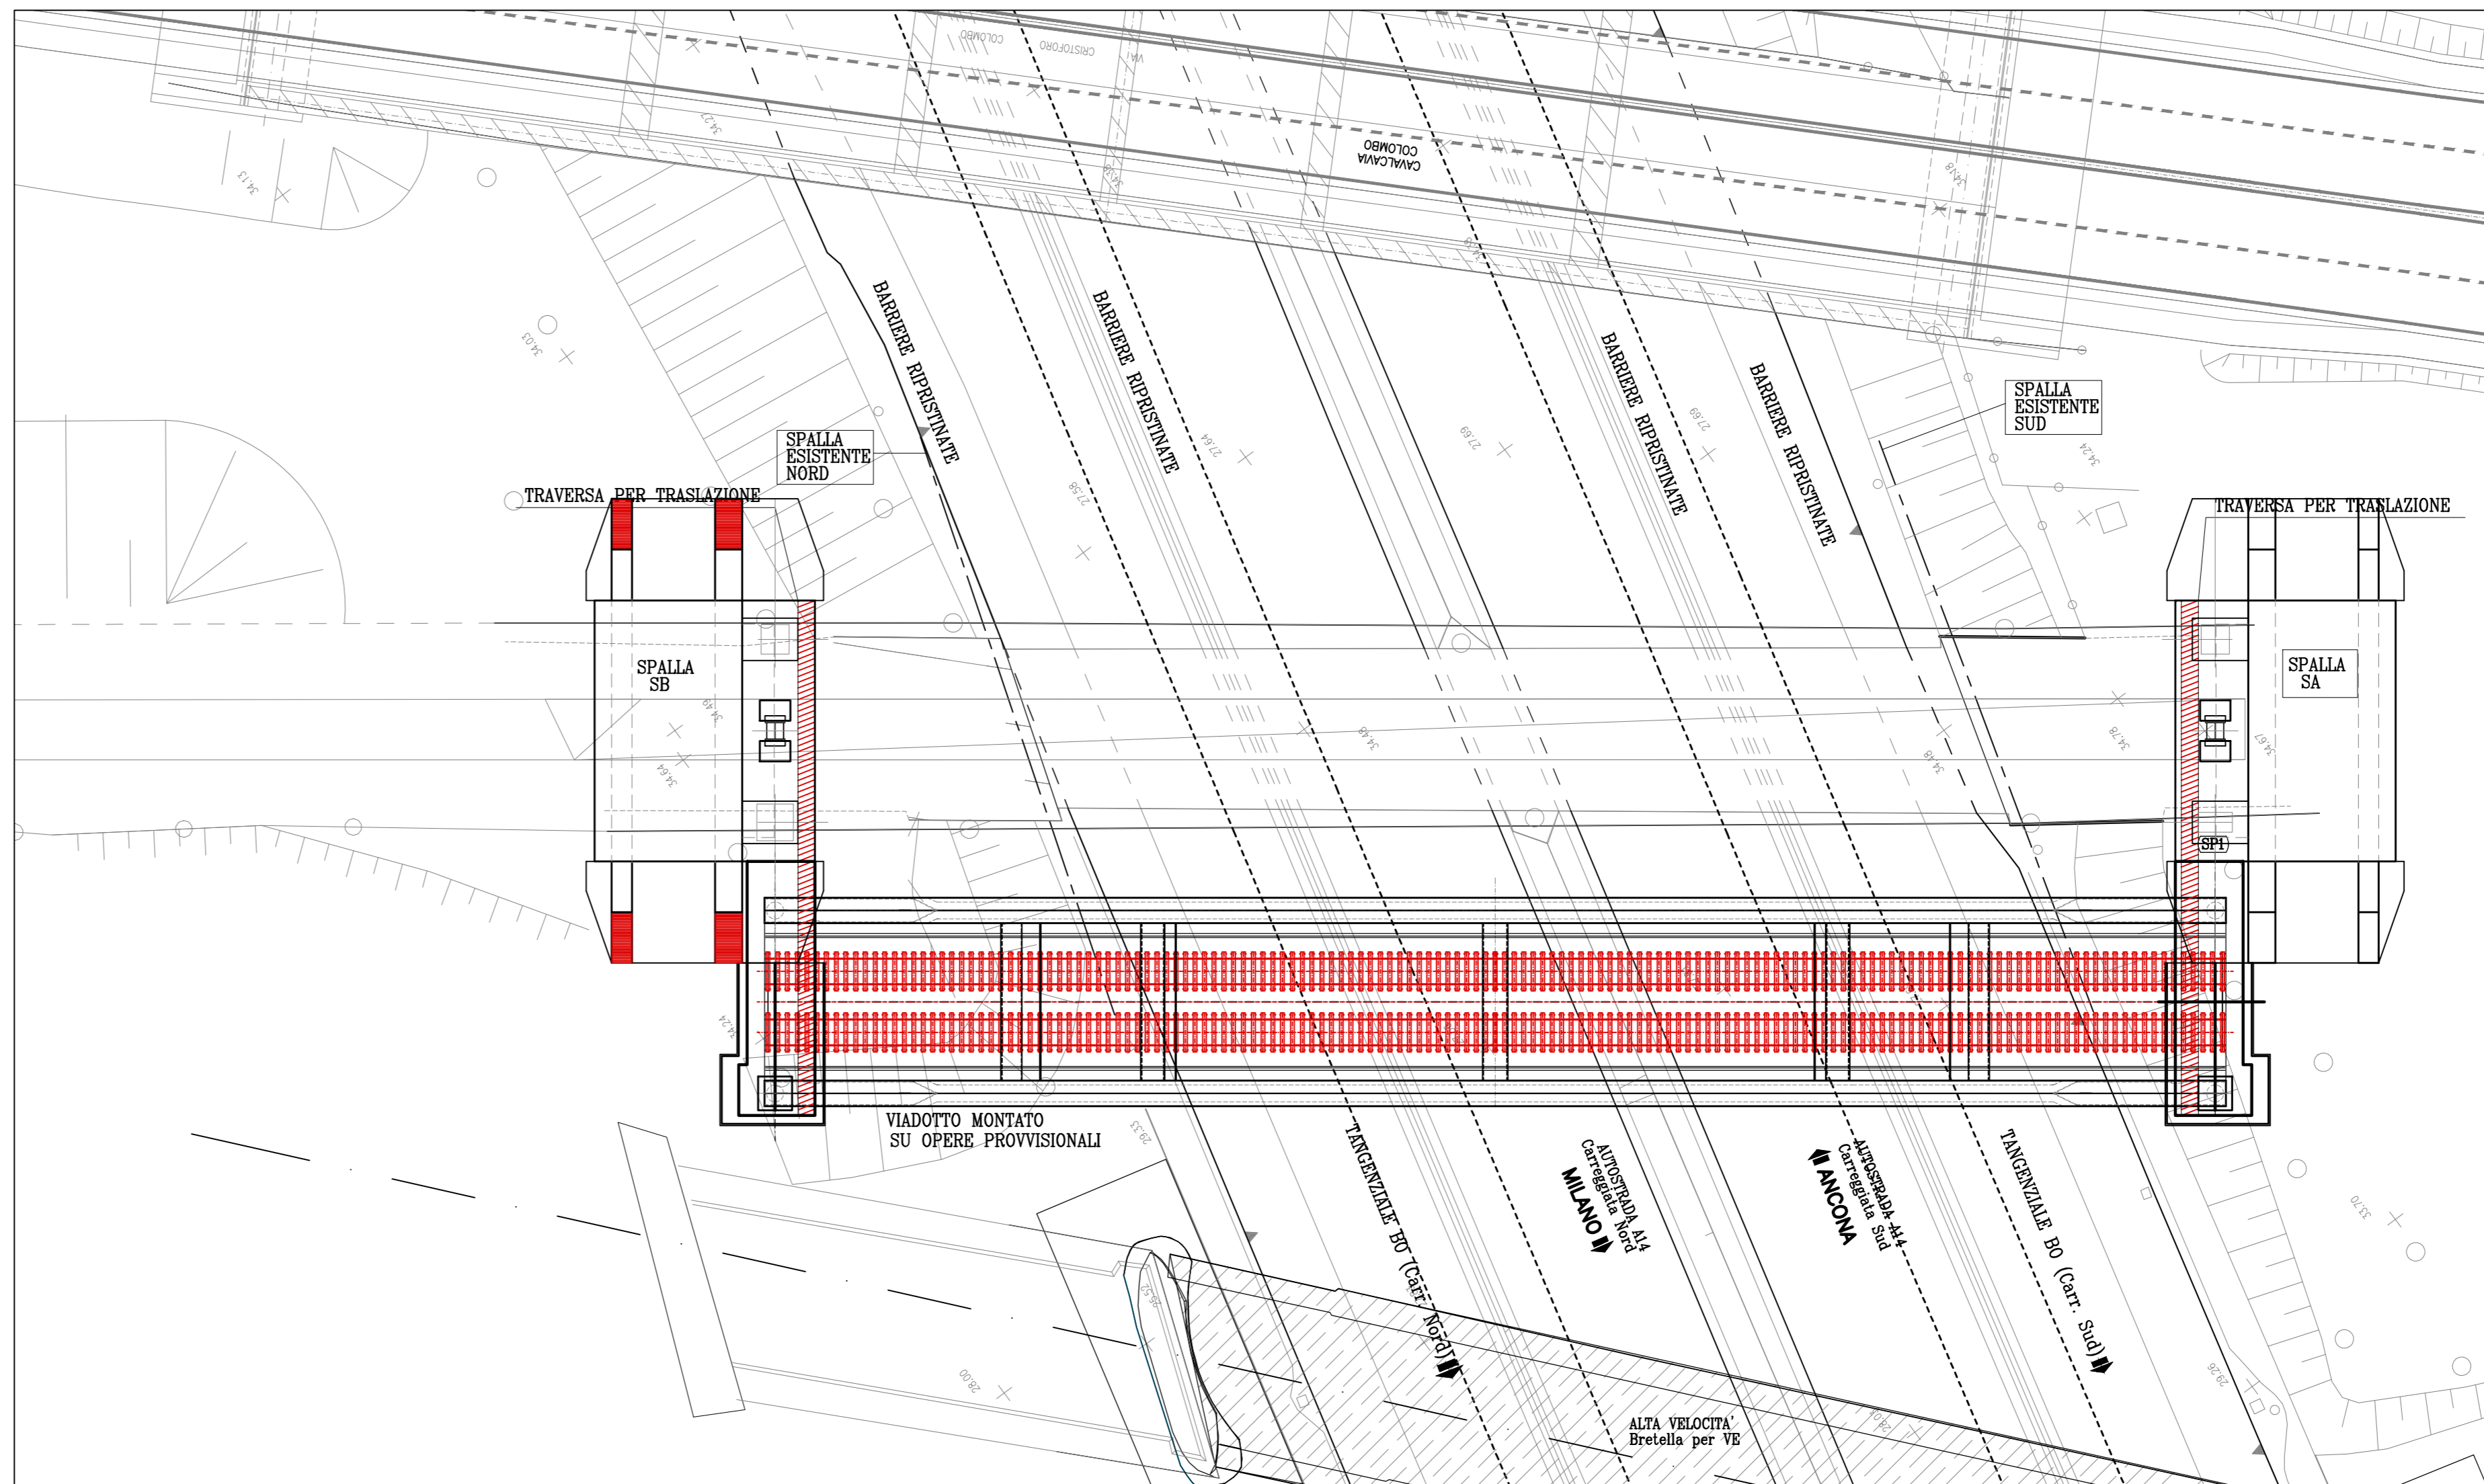


**FASE 2 -Venerdì sera dalle ore 22:00 alle 6:00 di sabato mattina**  
 -Chiusura Autostrada e tangenziale  
 -Rimozione temporanea di barriere e guard-rail  
 -Rimozione ponti esistenti e trasporto in area di smontaggio tramite carrelloni  
 -Al termine ripristino barriere e riapertura al traffico

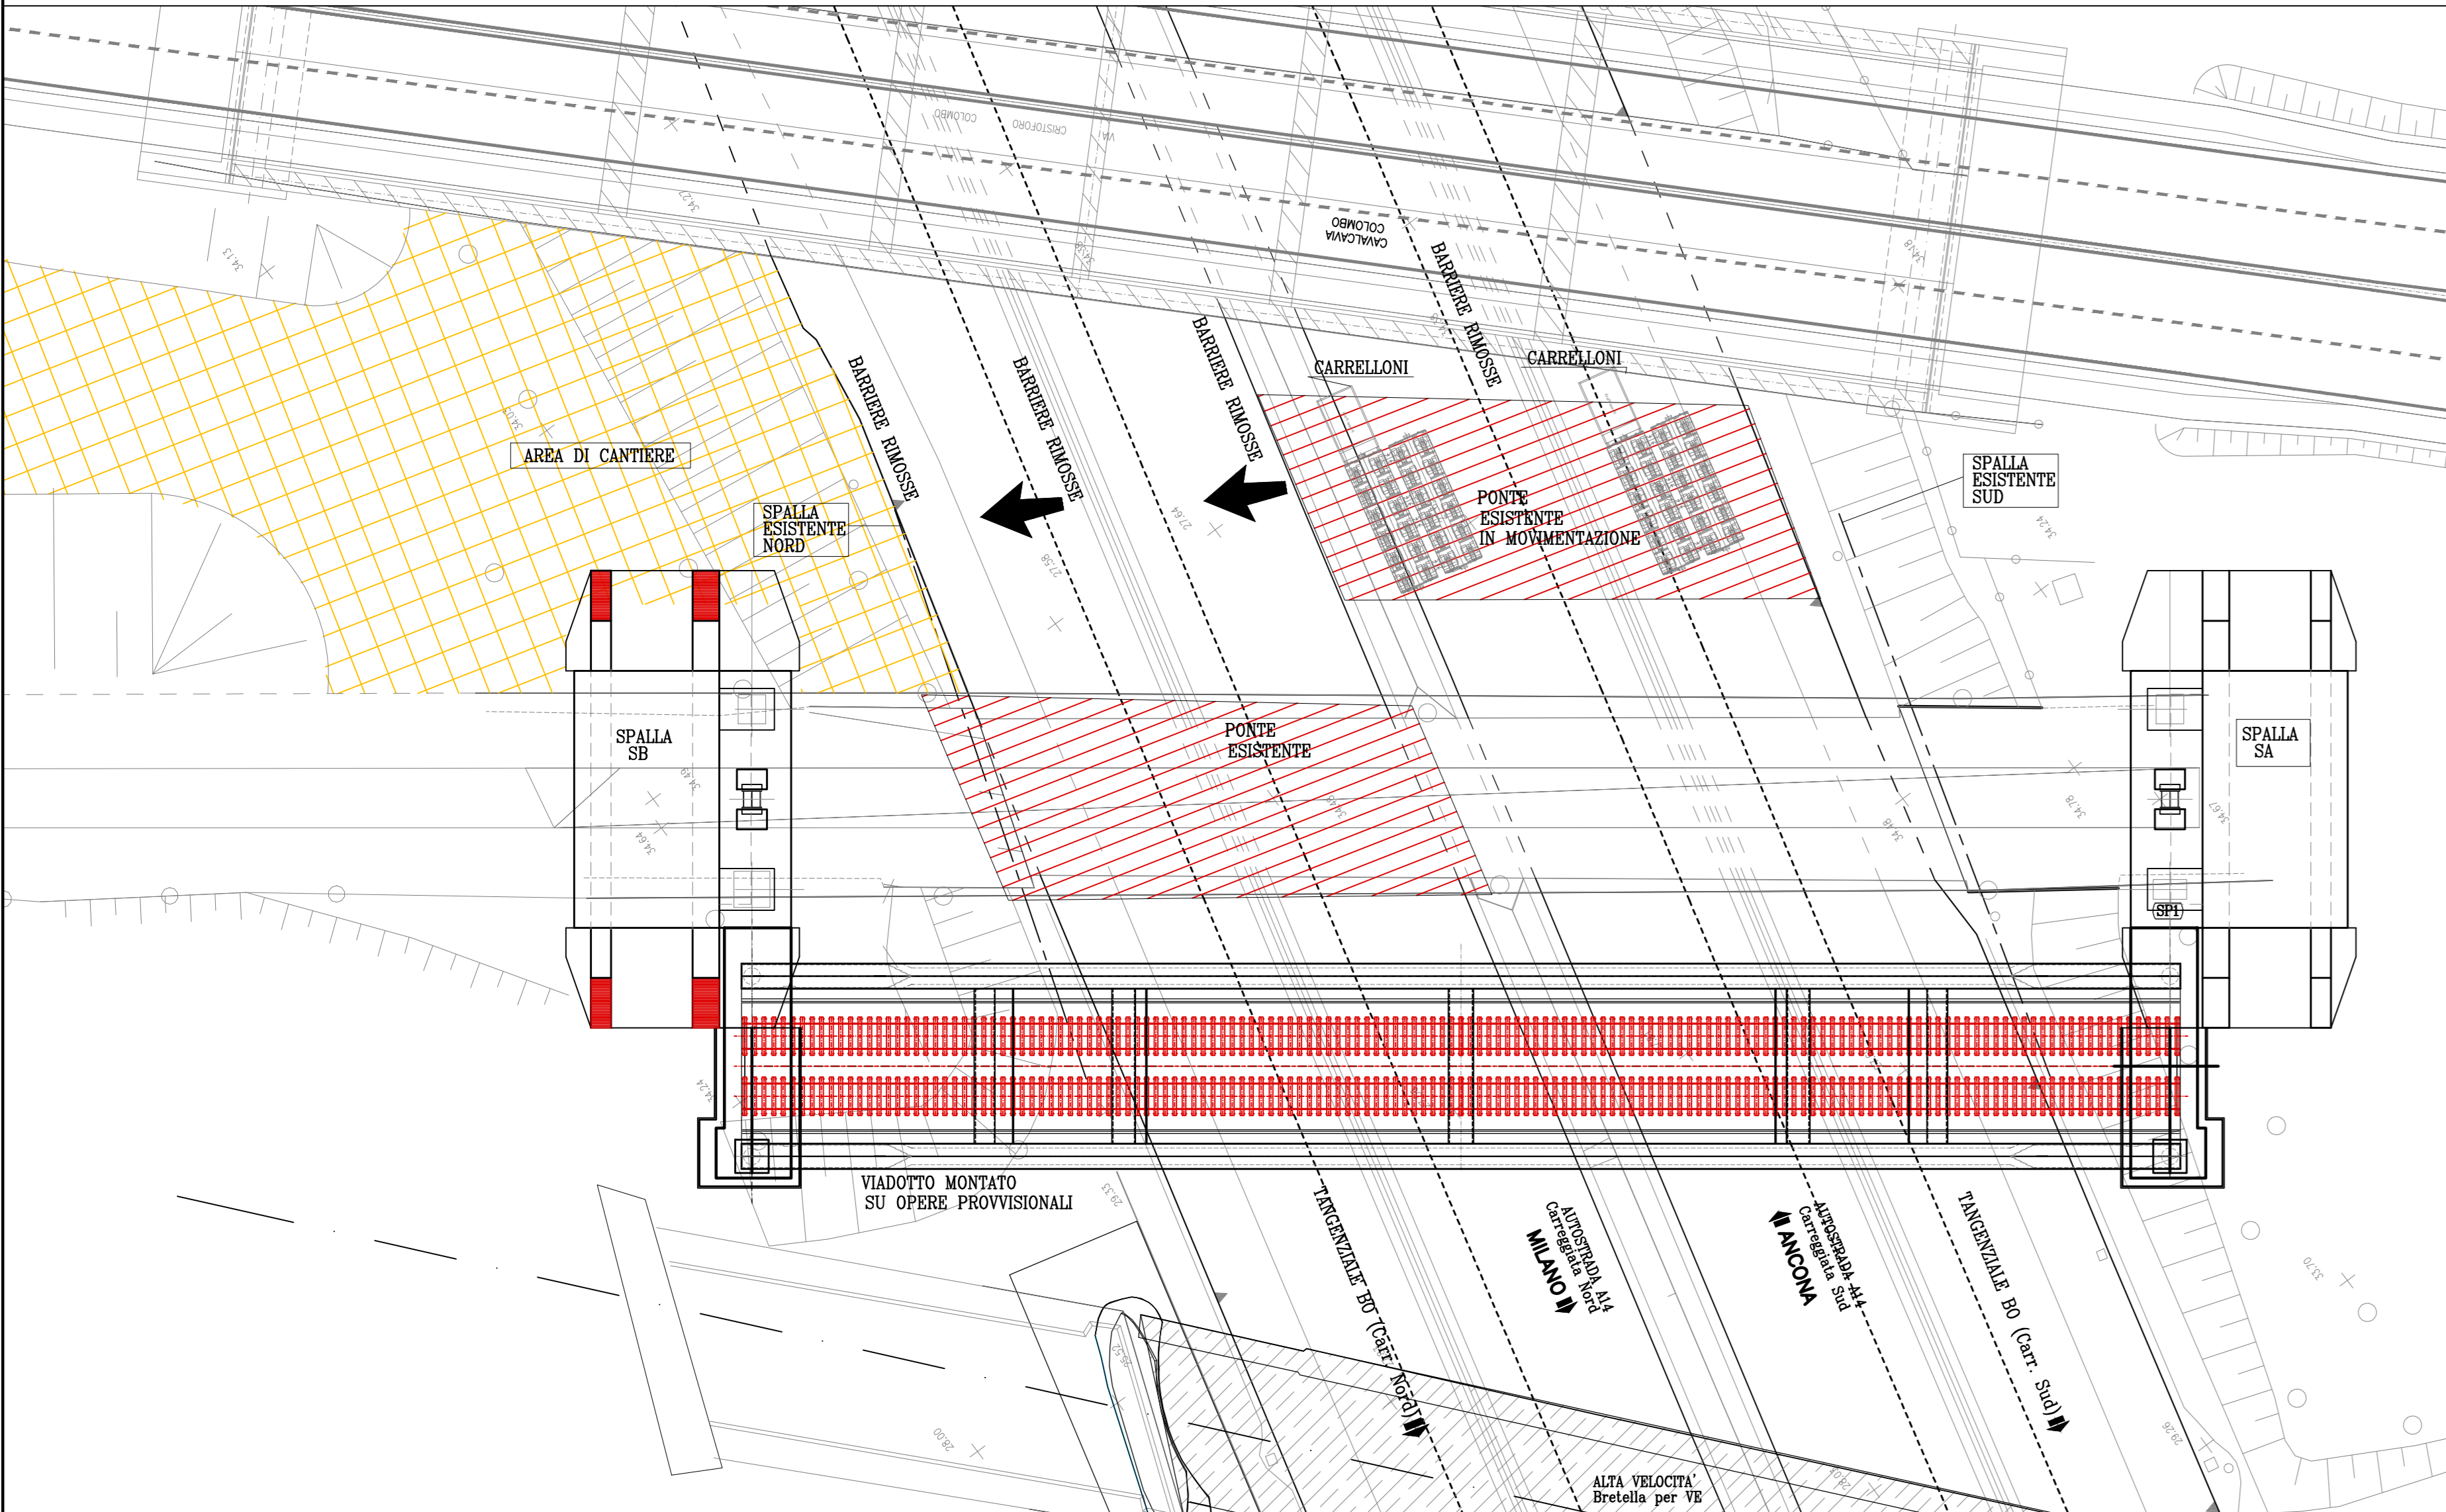


**FASE 4 -Sabato dalle 22:00 alle 6:00 di domenica**  
 -Chiusura Autostrada e tangenziale  
 -Traslazione viadotto in posizione definitiva  
 -Colaggio a quota definitiva  
 -Al termine riapertura al traffico

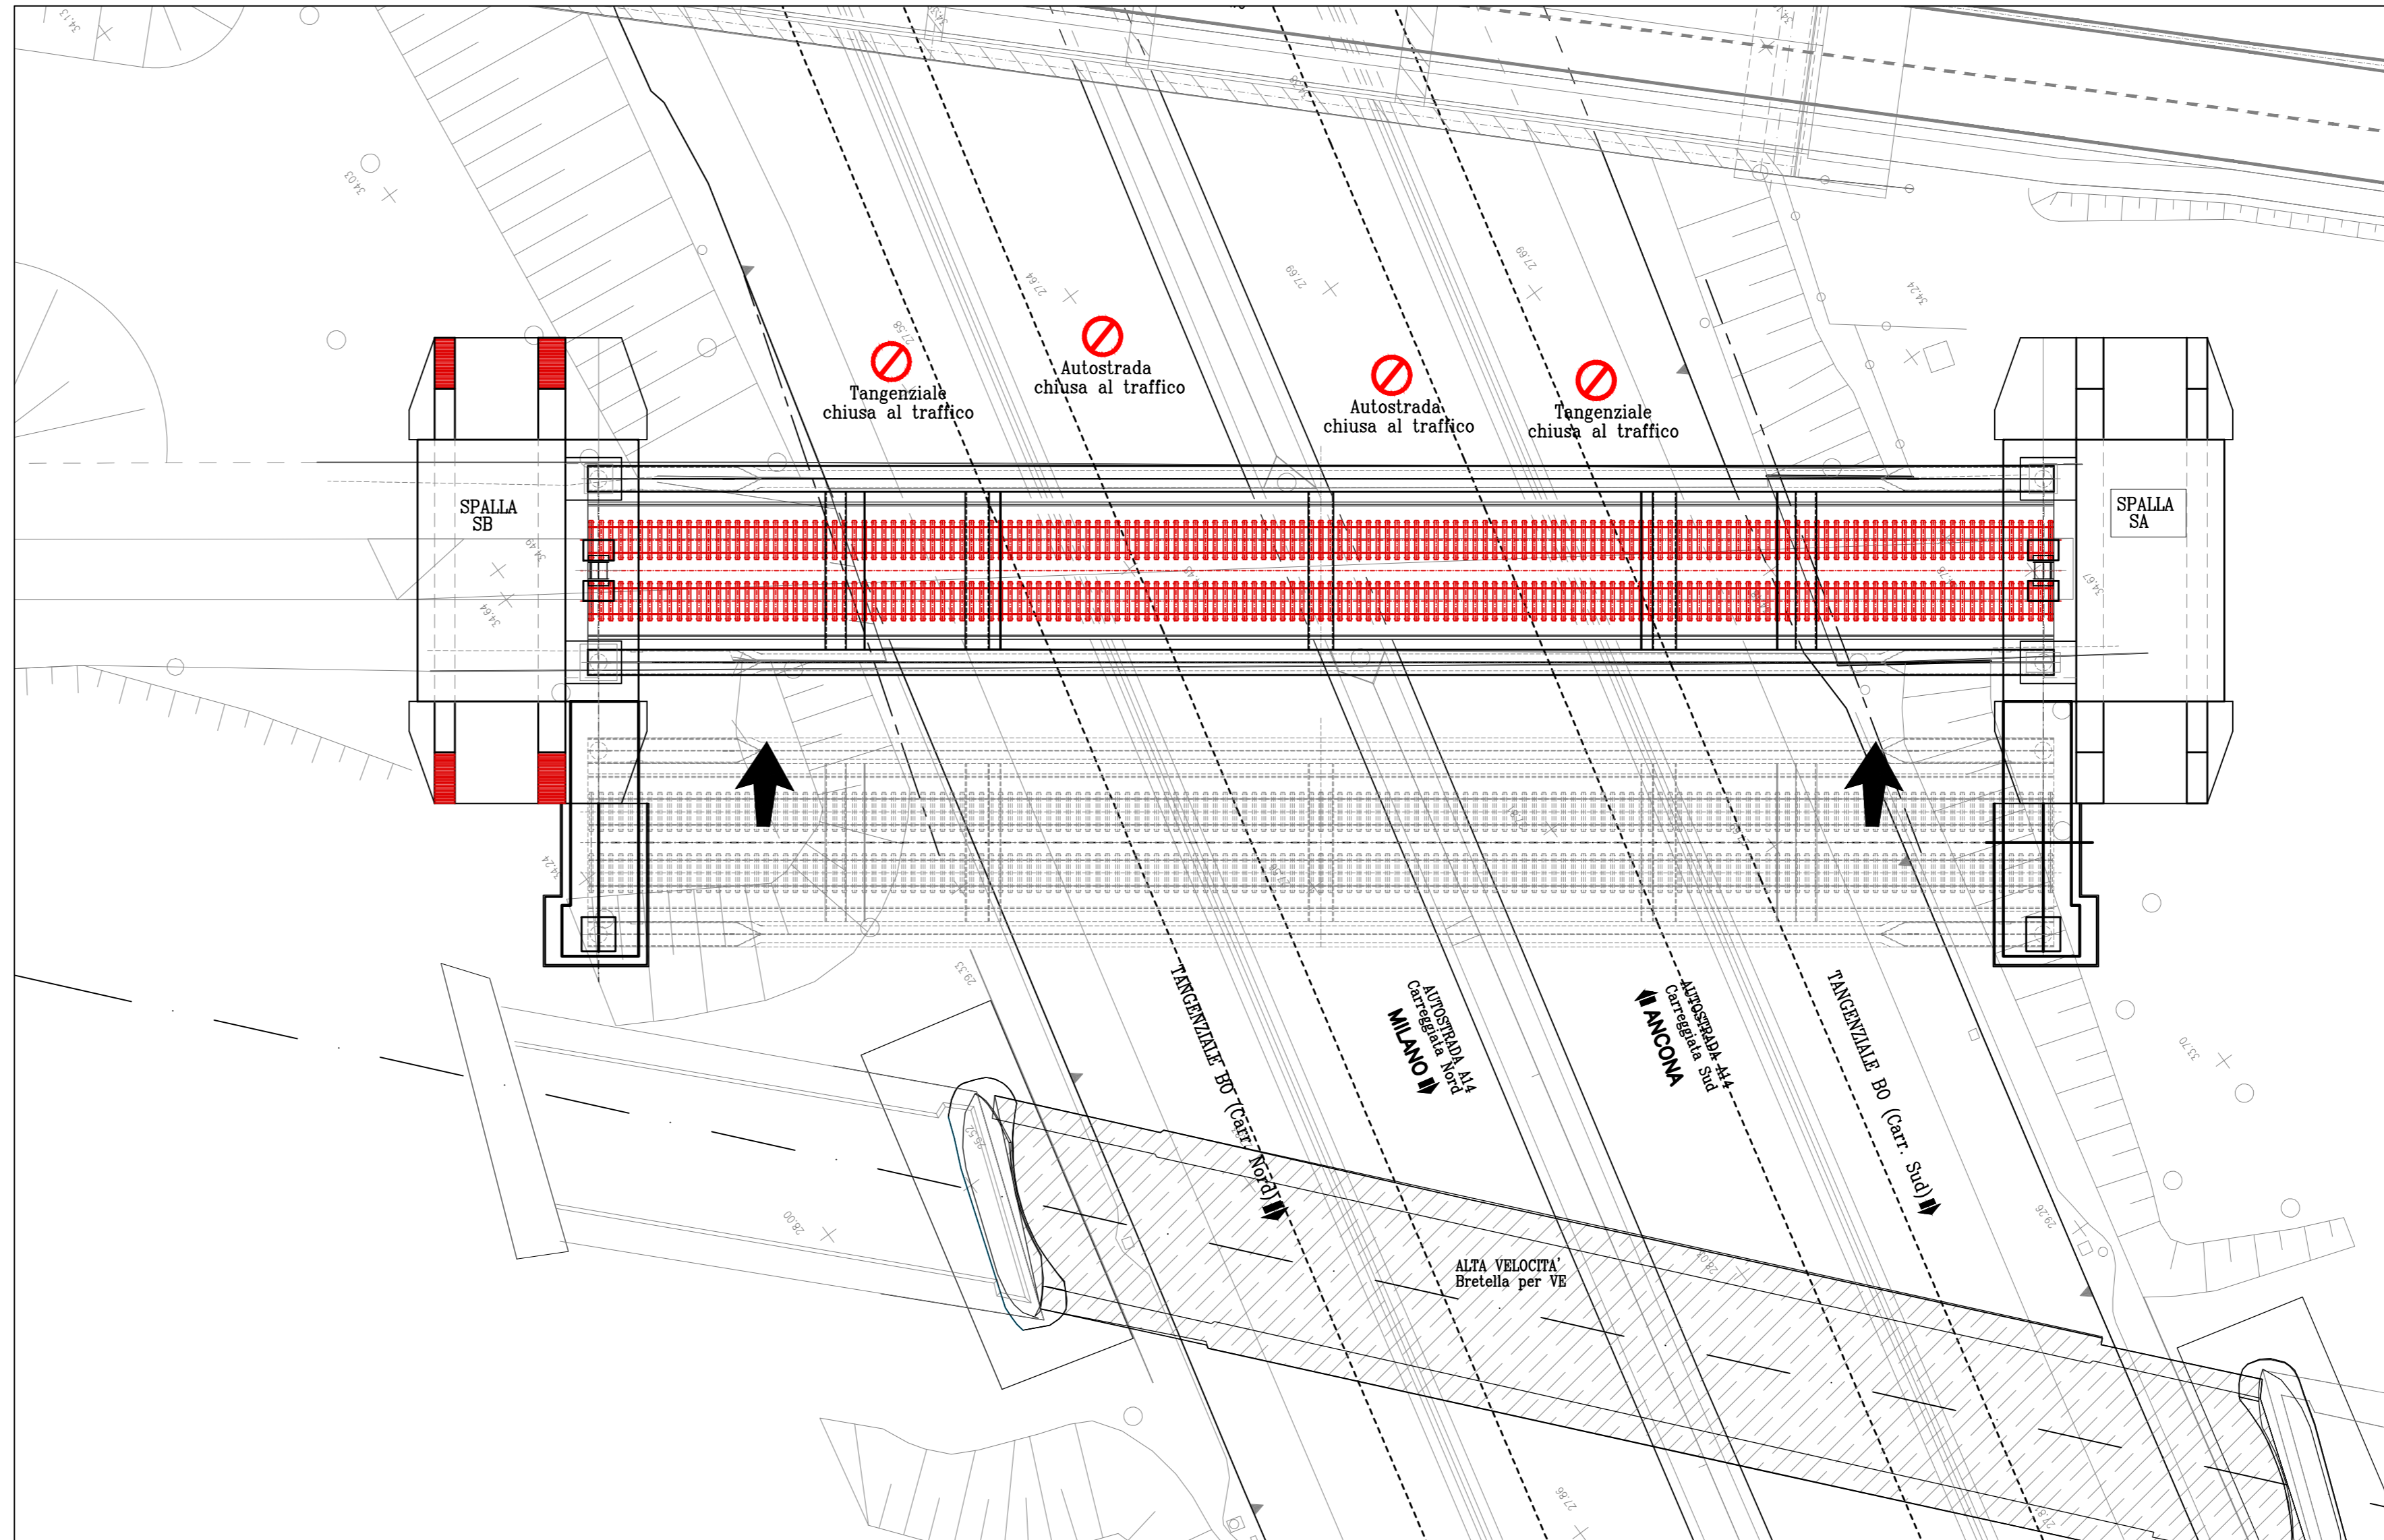

**FASE 3a -Sabato dalle 6:00 alle 22:00**  
 -Rimozione ballast spalle SPA-SPB  
 -Demolizione parziale di spalle e pila esistente

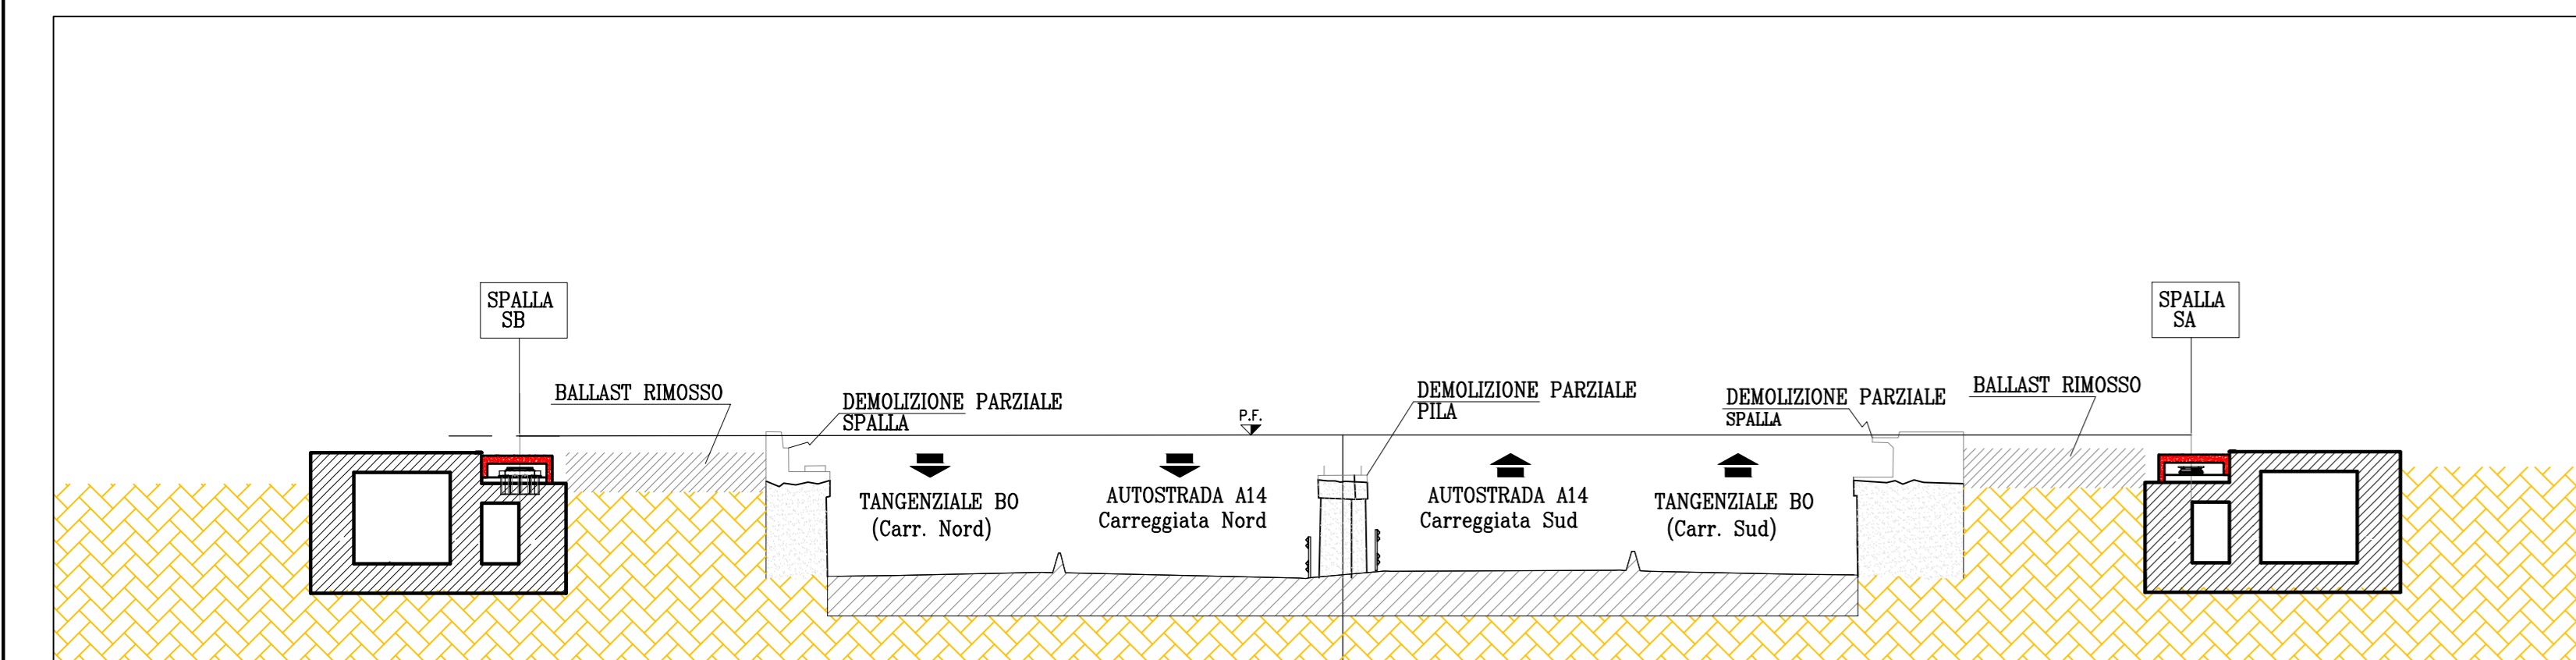

**FASE 5 -Domenica dalle 6:00 a Lunedì alle 6:00**  
 -Posizionamento binari e collegamento a linea interrotta  
 -Rincolzo ballast  
 -Ripristino linea elettrica  
 -Disposizione di eventuale segnaletica  
 -Riapertura linea ferroviaria

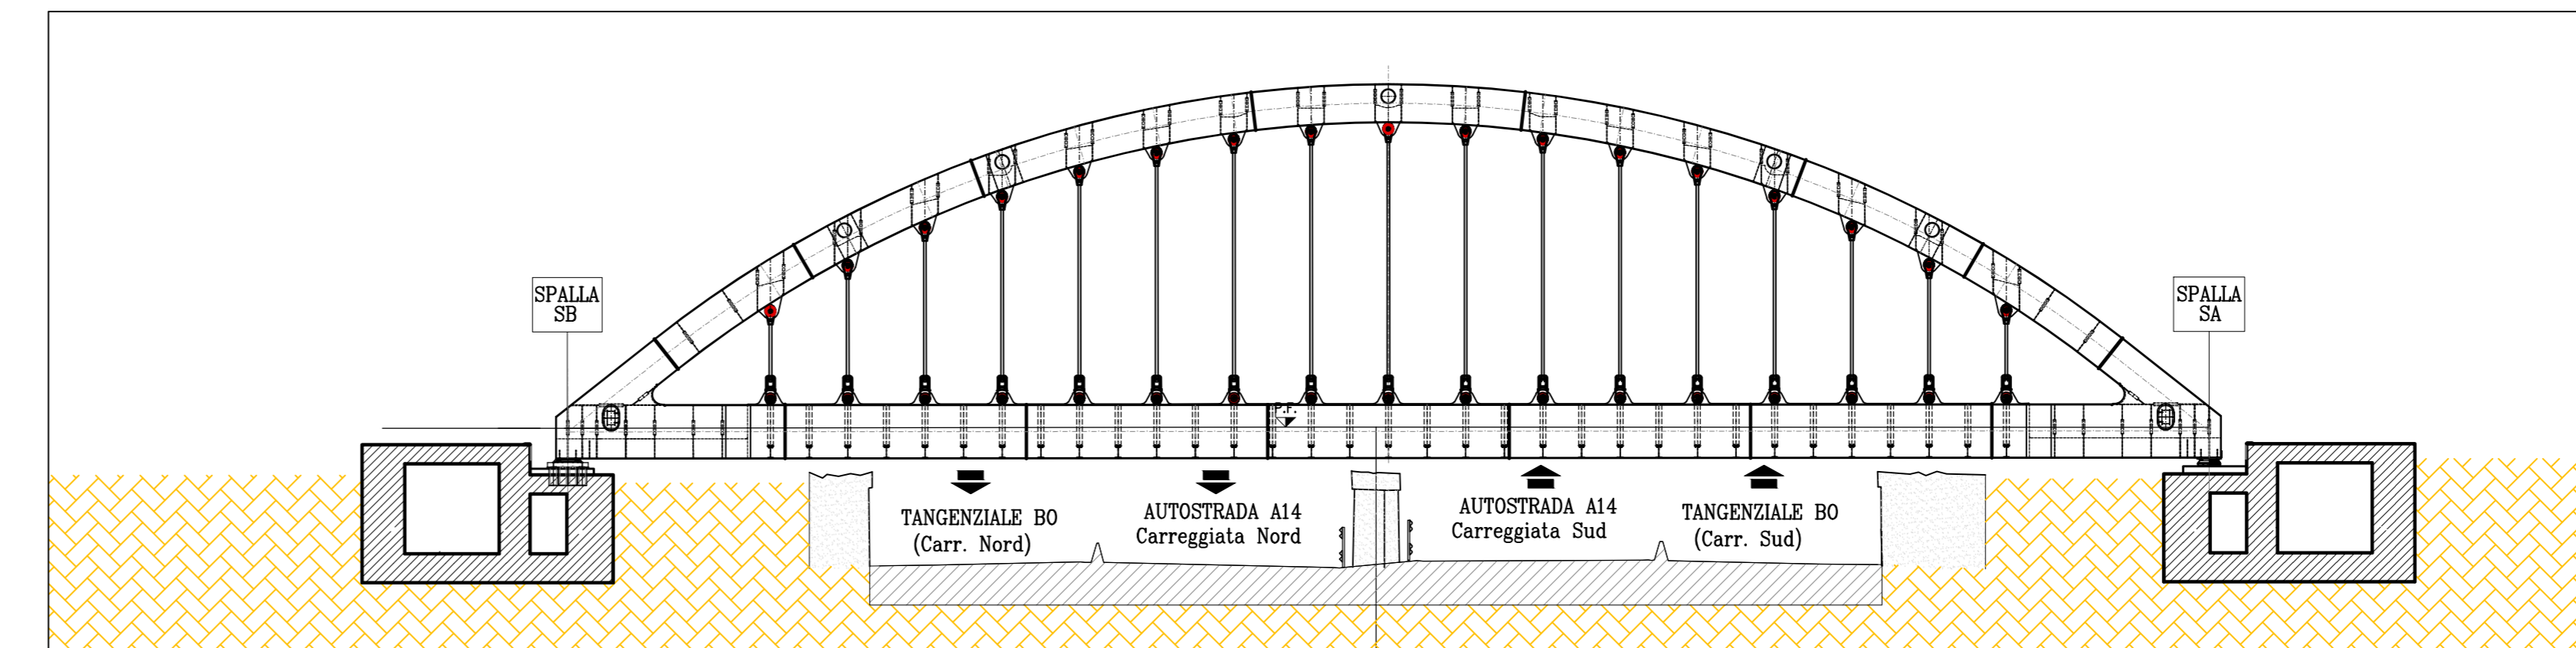

**AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO**  
 TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA  
 AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

VIABILITA' INTERFERITA

LINEA FERROVIARIA FS Bologna-Padova pk12+467

Cavalcaferrovia ex79T - F.S. - 12+467

Fasi costruttive impalcato CV79F - Tav 3 di 3

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Vittorio Masi Ord. Pogg. Milano N.18641 RESPONSABILE STRUTTURE		IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Raffaele Rinaldisi Ord. Pogg. Macerata N. 41068		IL DIRETTORE TECNICO Ing. Andrea Tassi Ord. Pogg. Parma N. 1154 PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI	
CODICE IDENTIFICATIVO 111465 0000 PD IN T03 CV79F FC000 DSTR 2691 -2					
PROJECT MANAGER Ing. Raffaele Rinaldisi Ord. Pogg. Macerata N. 41068		SUPPORTO SPECIALISTICO Ing. Paolo Moschetti Ord. Pogg. Genova N. 8972		REVISIONE Ing. Andrea Tassi Ord. Pogg. Parma N. 1154 Ing. Paolo Moschetti Ord. Pogg. Genova N. 8972	
REDATTO		VERIFICATO		DATA 11 DICEMBRE 2017 1 SETTEMBRE 2018 12 SETTEMBRE 2020	
VISTO DEL COMMITTENTE Ing. Paolo Moschetti Ord. Pogg. Genova N. 8972			VISTO DEL CONCESSIONARIO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Regionale Emilia-Romagna Ing. Paolo Moschetti		
