




PIANTA A QUOTA SCORRIMENTO  
Scala 1:100

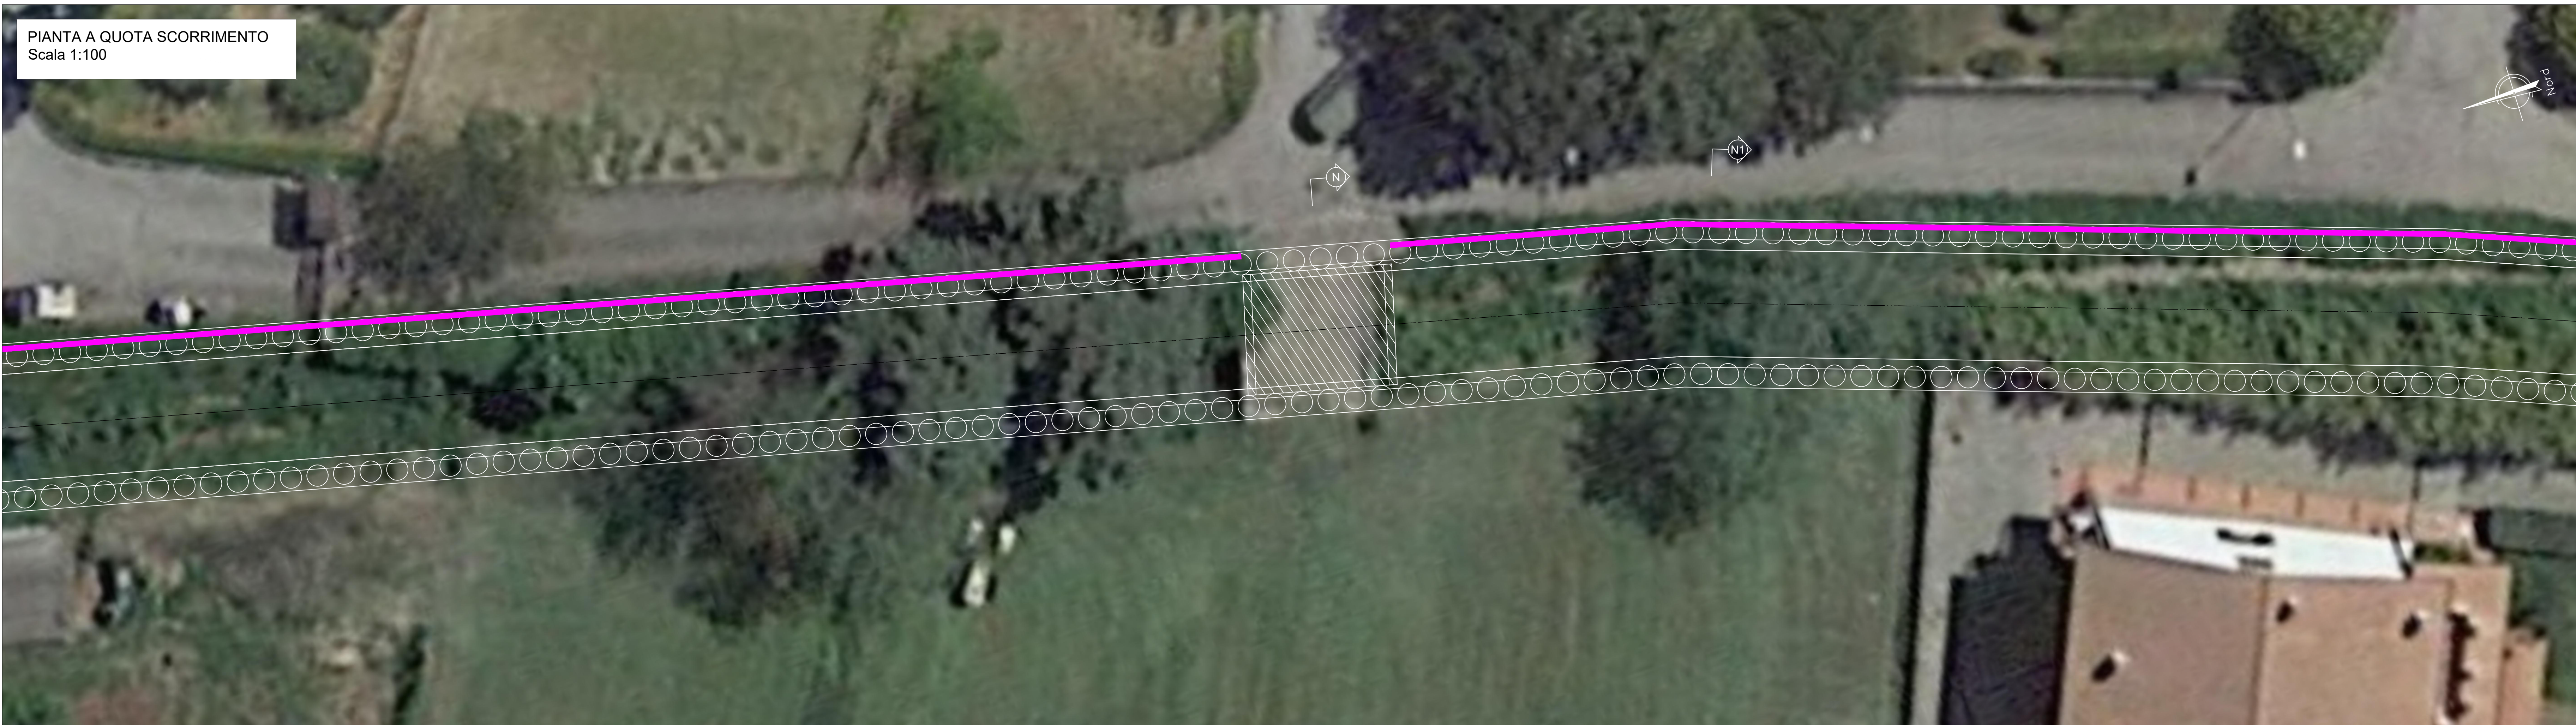


PIANTA CHIAVE

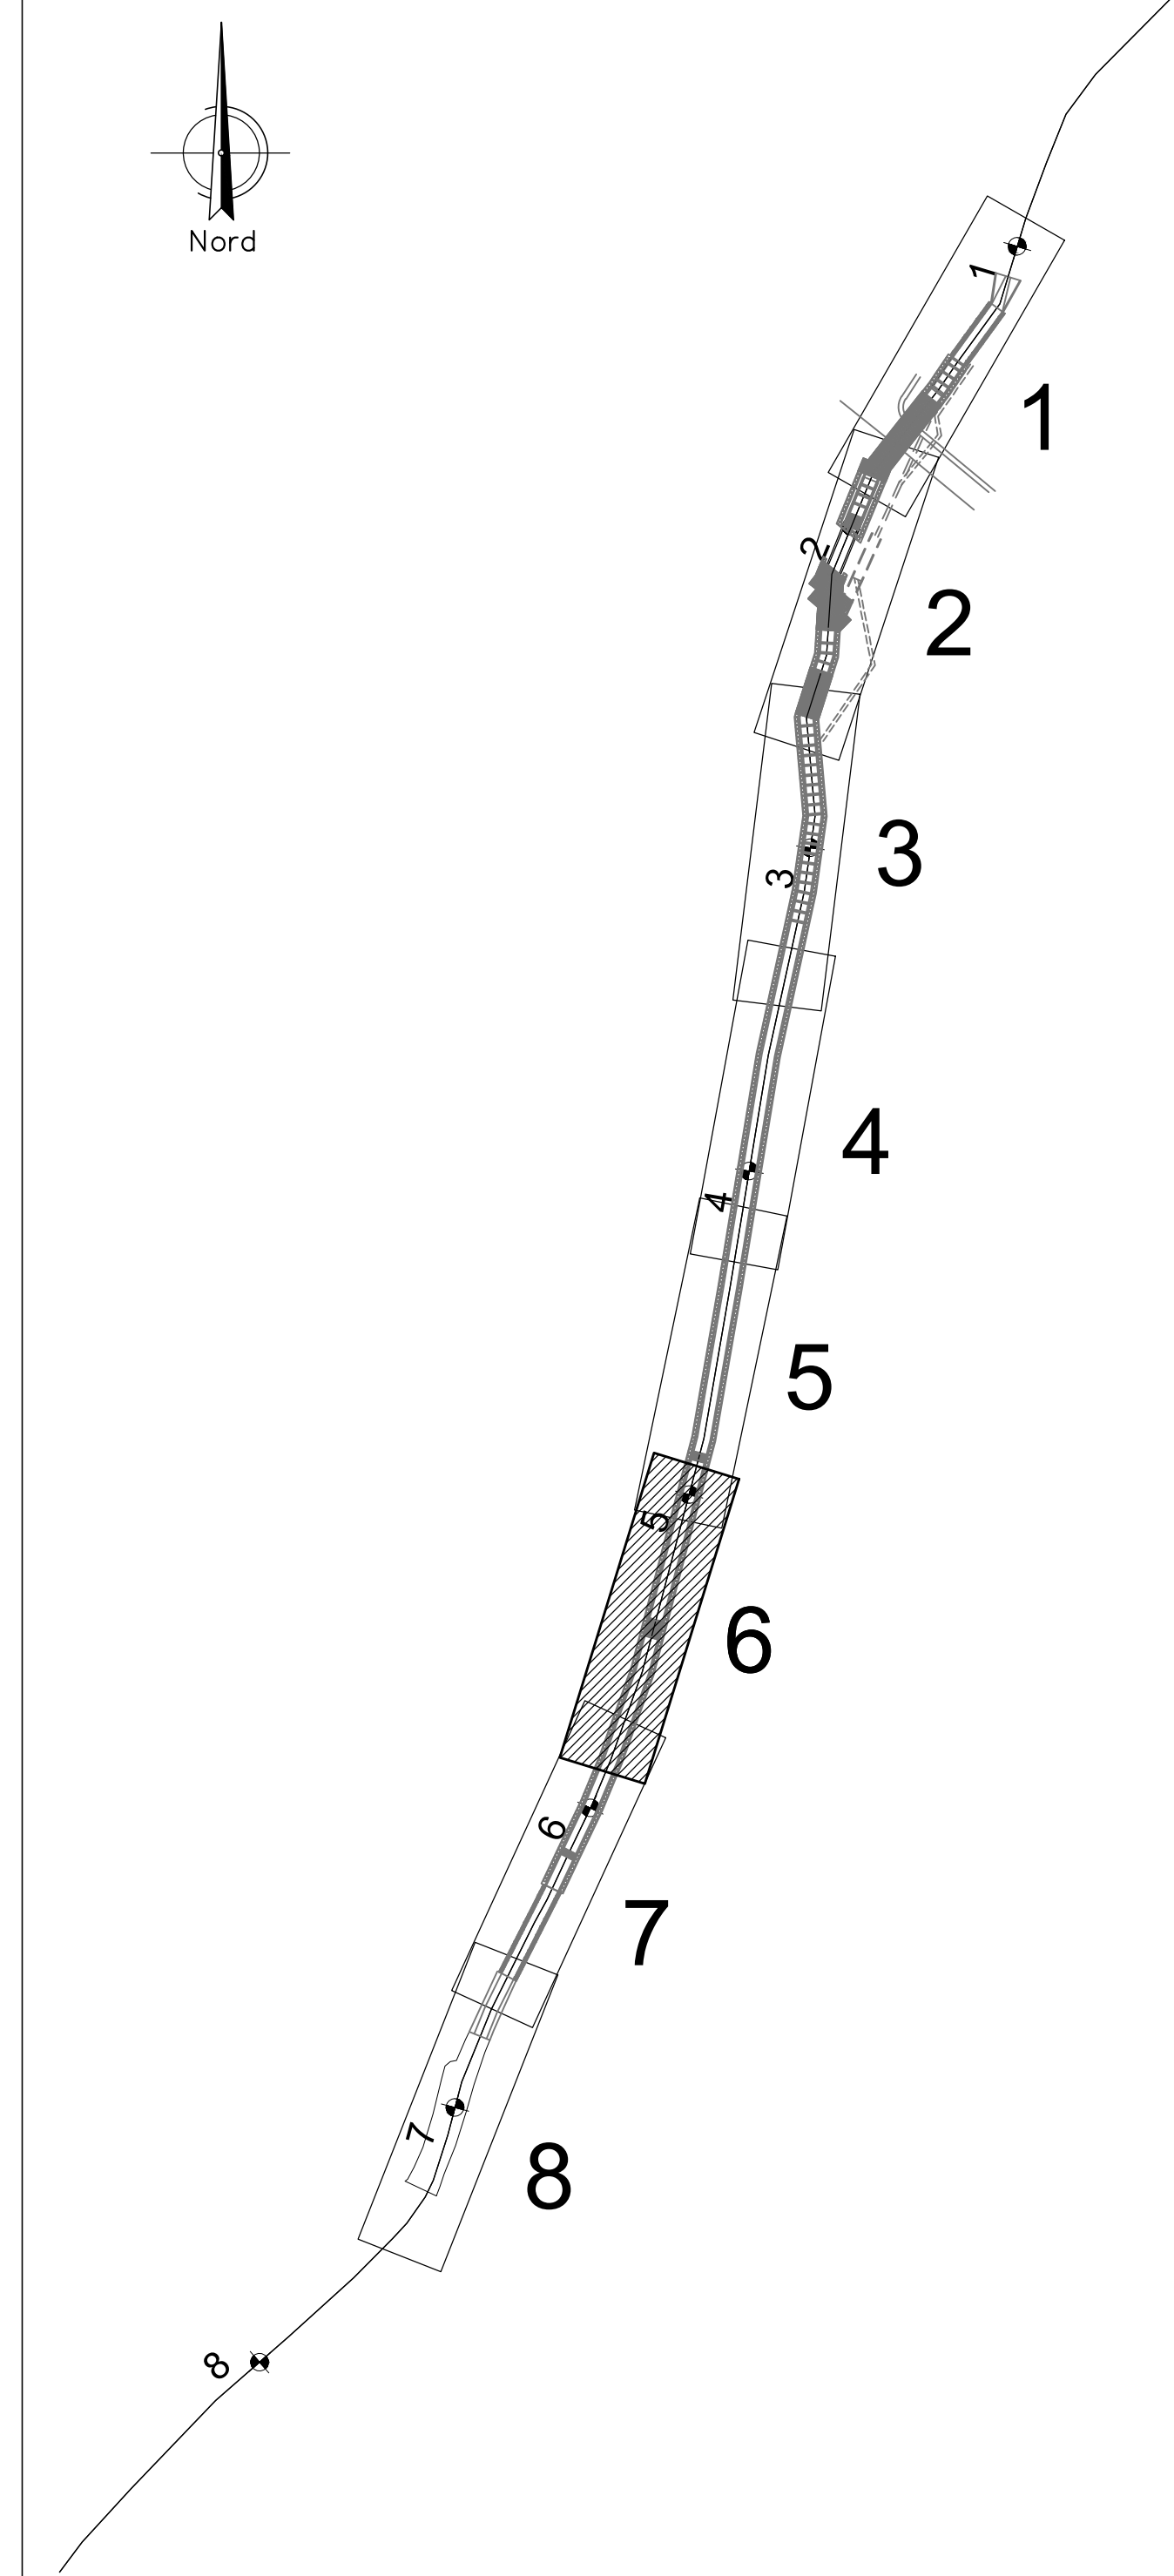

SEZIONE LONGITUDINALE  
Scala 1:100

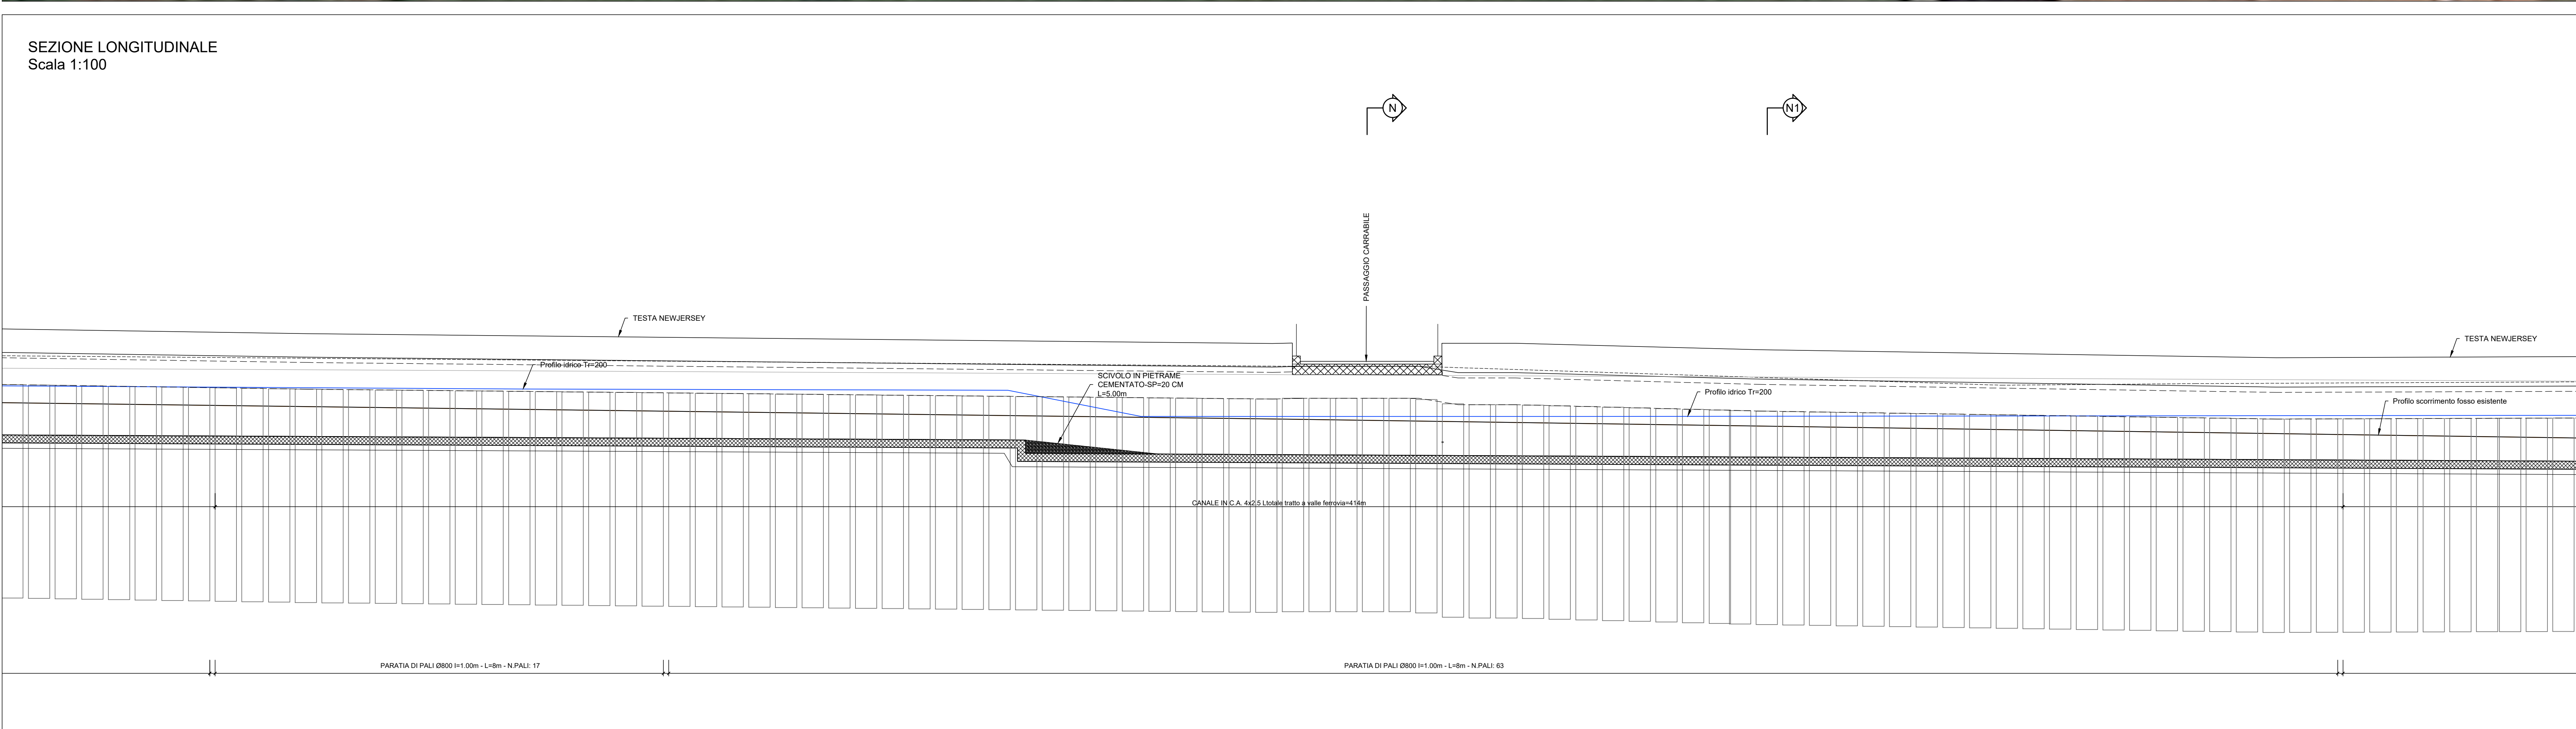


SEZIONE N-N  
scala 1:100

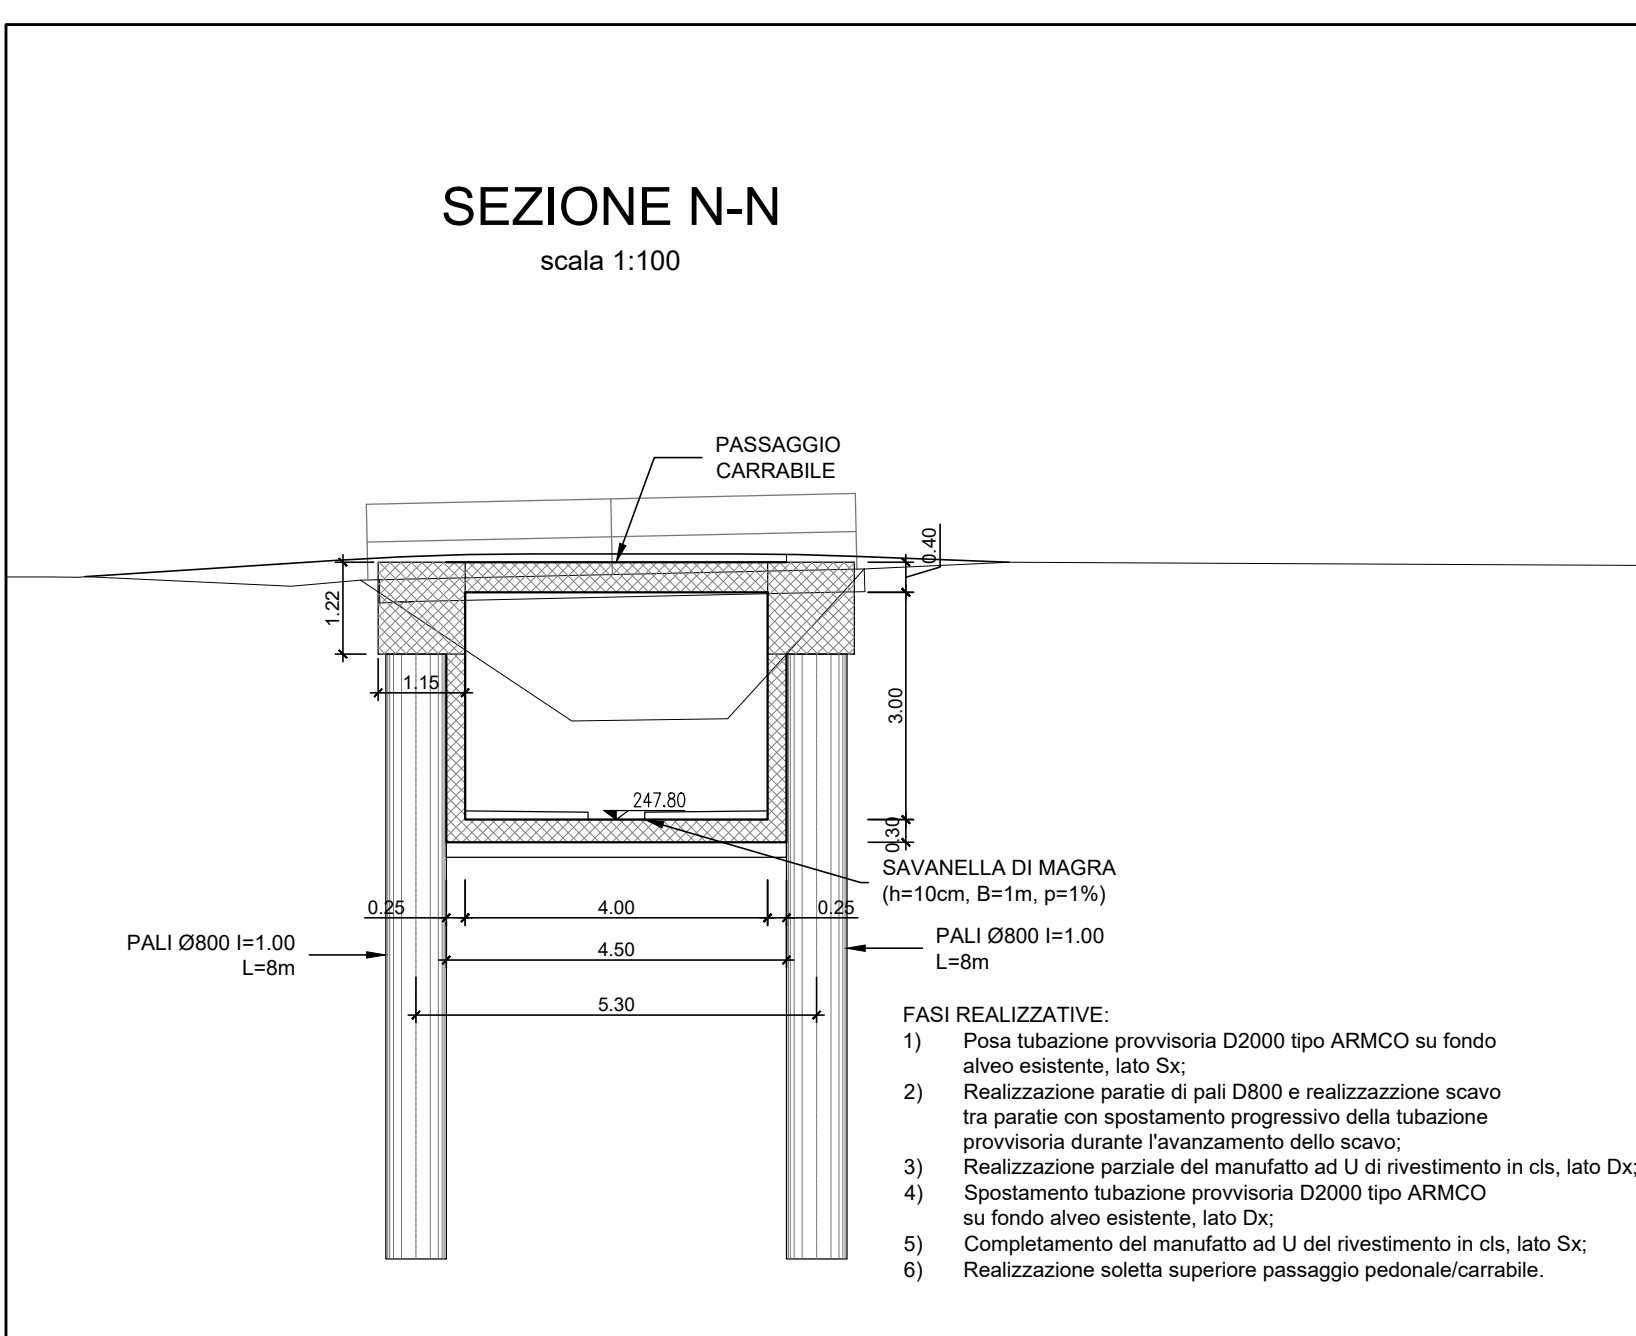

- FASI REALIZZATIVE:
- 1) Posa tubazione provvisoria D2000 tipo ARMCO su fondo alveo esistente, lato Sx.
  - 2) Realizzazione parte di pali Ø800 e realizzazione scavo tra parte con spostamento progressivo della tubazione provvisoria durante l'avanzamento dello scavo.
  - 3) Realizzazione parziale del manufatto ad U di rivestimento in cls, lato Dx.
  - 4) Spostamento tubazione provvisoria D2000 tipo ARMCO su fondo alveo esistente, lato Dx.
  - 5) Completamento del manufatto ad U del rivestimento in cls, lato Sx.
  - 6) Realizzazione soletta superiore passaggio pedonale/carriabile.

SEZIONE N1-N1  
scala 1:100

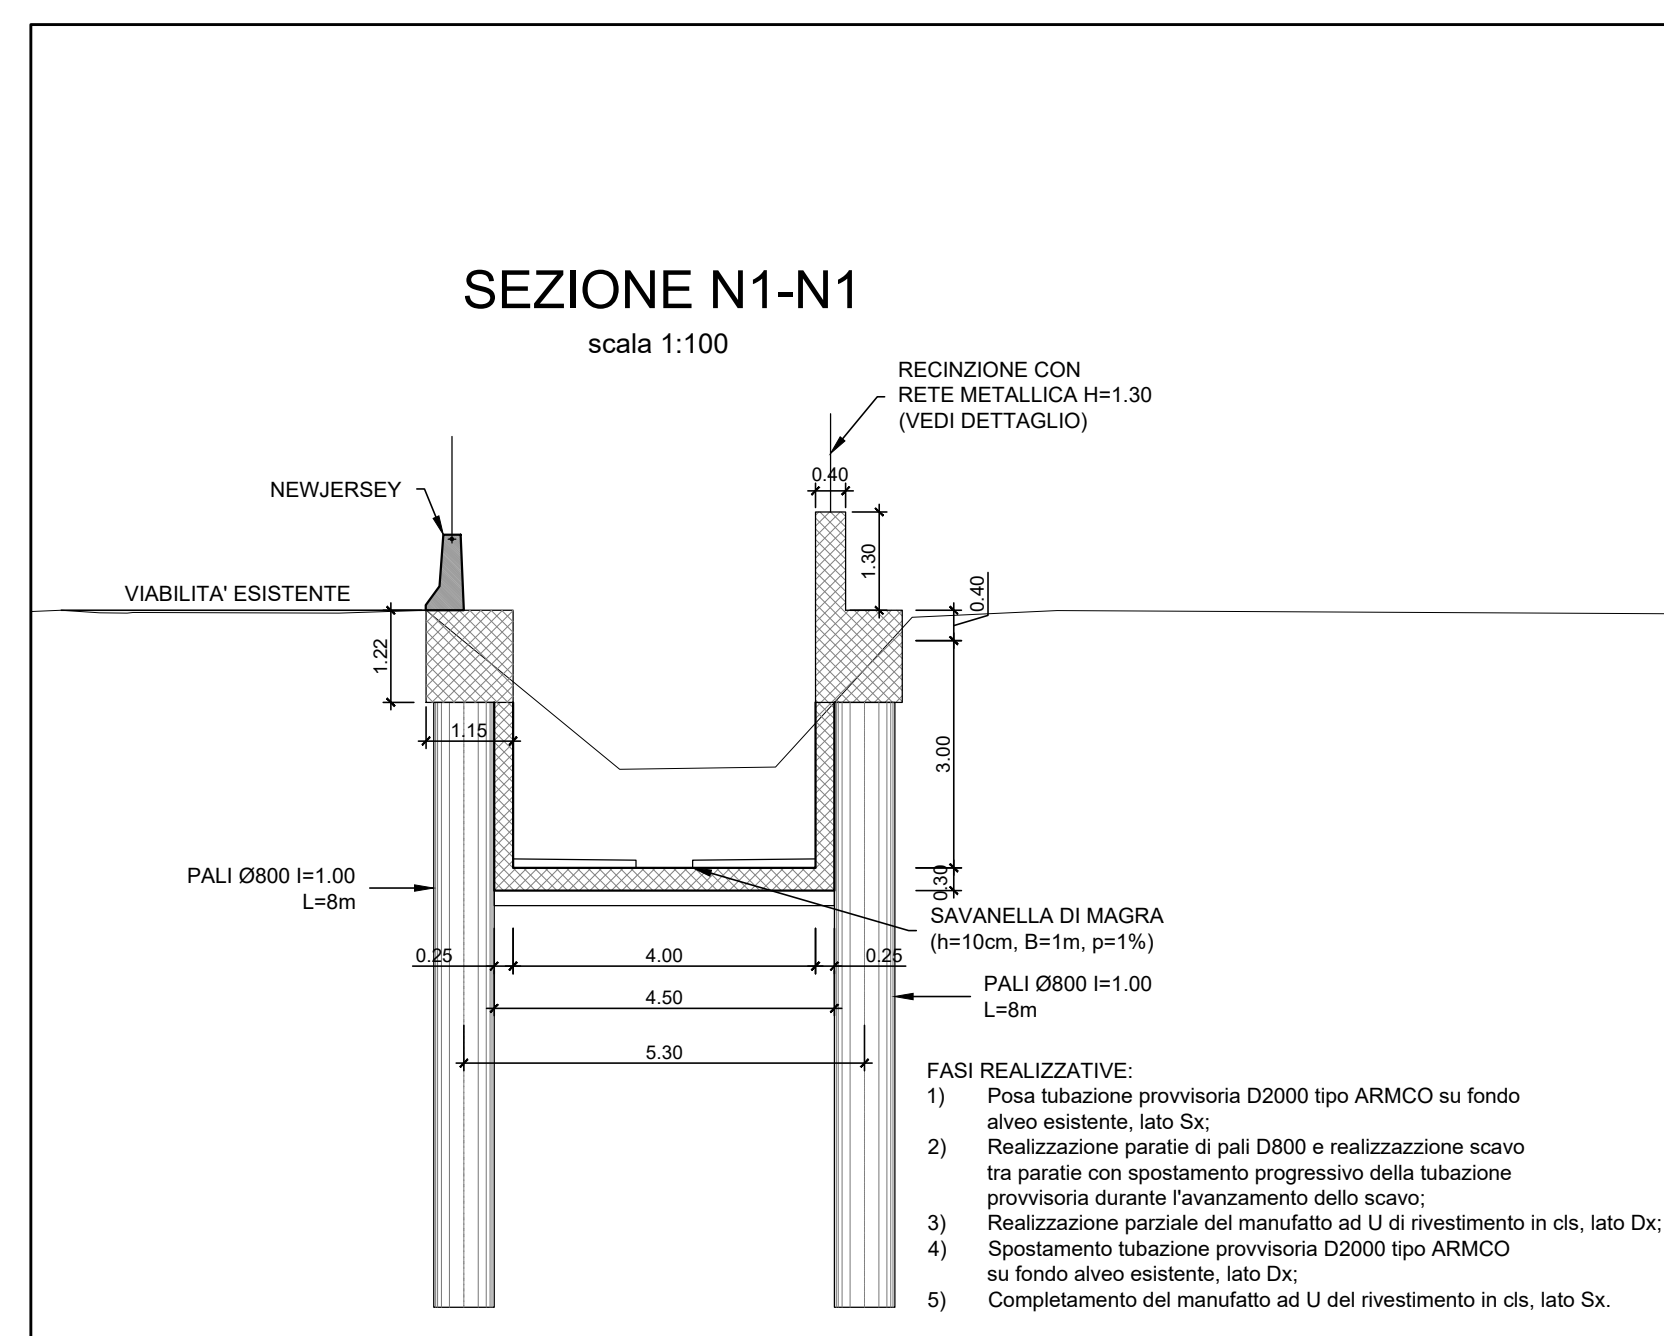

- FASI REALIZZATIVE:
- 1) Posa tubazione provvisoria D2000 tipo ARMCO su fondo alveo esistente, lato Sx.
  - 2) Realizzazione parte di pali Ø800 e realizzazione scavo tra parte con spostamento progressivo della tubazione provvisoria durante l'avanzamento dello scavo.
  - 3) Realizzazione parziale del manufatto ad U di rivestimento in cls, lato Dx.
  - 4) Spostamento tubazione provvisoria D2000 tipo ARMCO su fondo alveo esistente, lato Dx.
  - 5) Completamento del manufatto ad U del rivestimento in cls, lato Sx.

COMMITTENTE:  
**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. COORDINAMENTO NO CAPTIVE E INGEGNERIA DI SISTEMA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA**

**INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE SUL PRG DELLA STAZIONE DI ELLERA**

OPERE MINORI  
Fosso Bulagaio - pianta, sezione longitudinale e sezioni trasversali tratto 6

SCALA: 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IR08B	02	D	10	PA	1NO200	006	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione	[Signature]	Luglio 2020	[Signature]	Luglio 2020	[Signature]	Luglio 2020	[Signature]	Luglio 2020
