

**FASE 1**


Fase 1a) Demolizione degli edifici lato BD e realizzazione paratie provvisorie (puntegate nei tratti di maggiore scavo o tirantati) a protezione della Linea Storica e degli edifici limitrofi lato BP. Fino a max. 3.5m da asse L.S.

Fase 1b) Demolizione manufatto esistente limitatamente alla rampa lato BP

Fase 1c) Durante l'interruzione di esercizio: completamento paratia provvisoria con un pre-scavo di h=2.20m per ridurre le altezze, demolizione del manufatto esistente fino a imbocco rampa lato fiume e realizzazione del nuovo sottopasso in opera.

Fase 1d) Ripristino linea storica sul nuovo manufatto

Fase 1e) Riattivazione linea storica e realizzazione armamento, elettrificazione e finiture linea BD

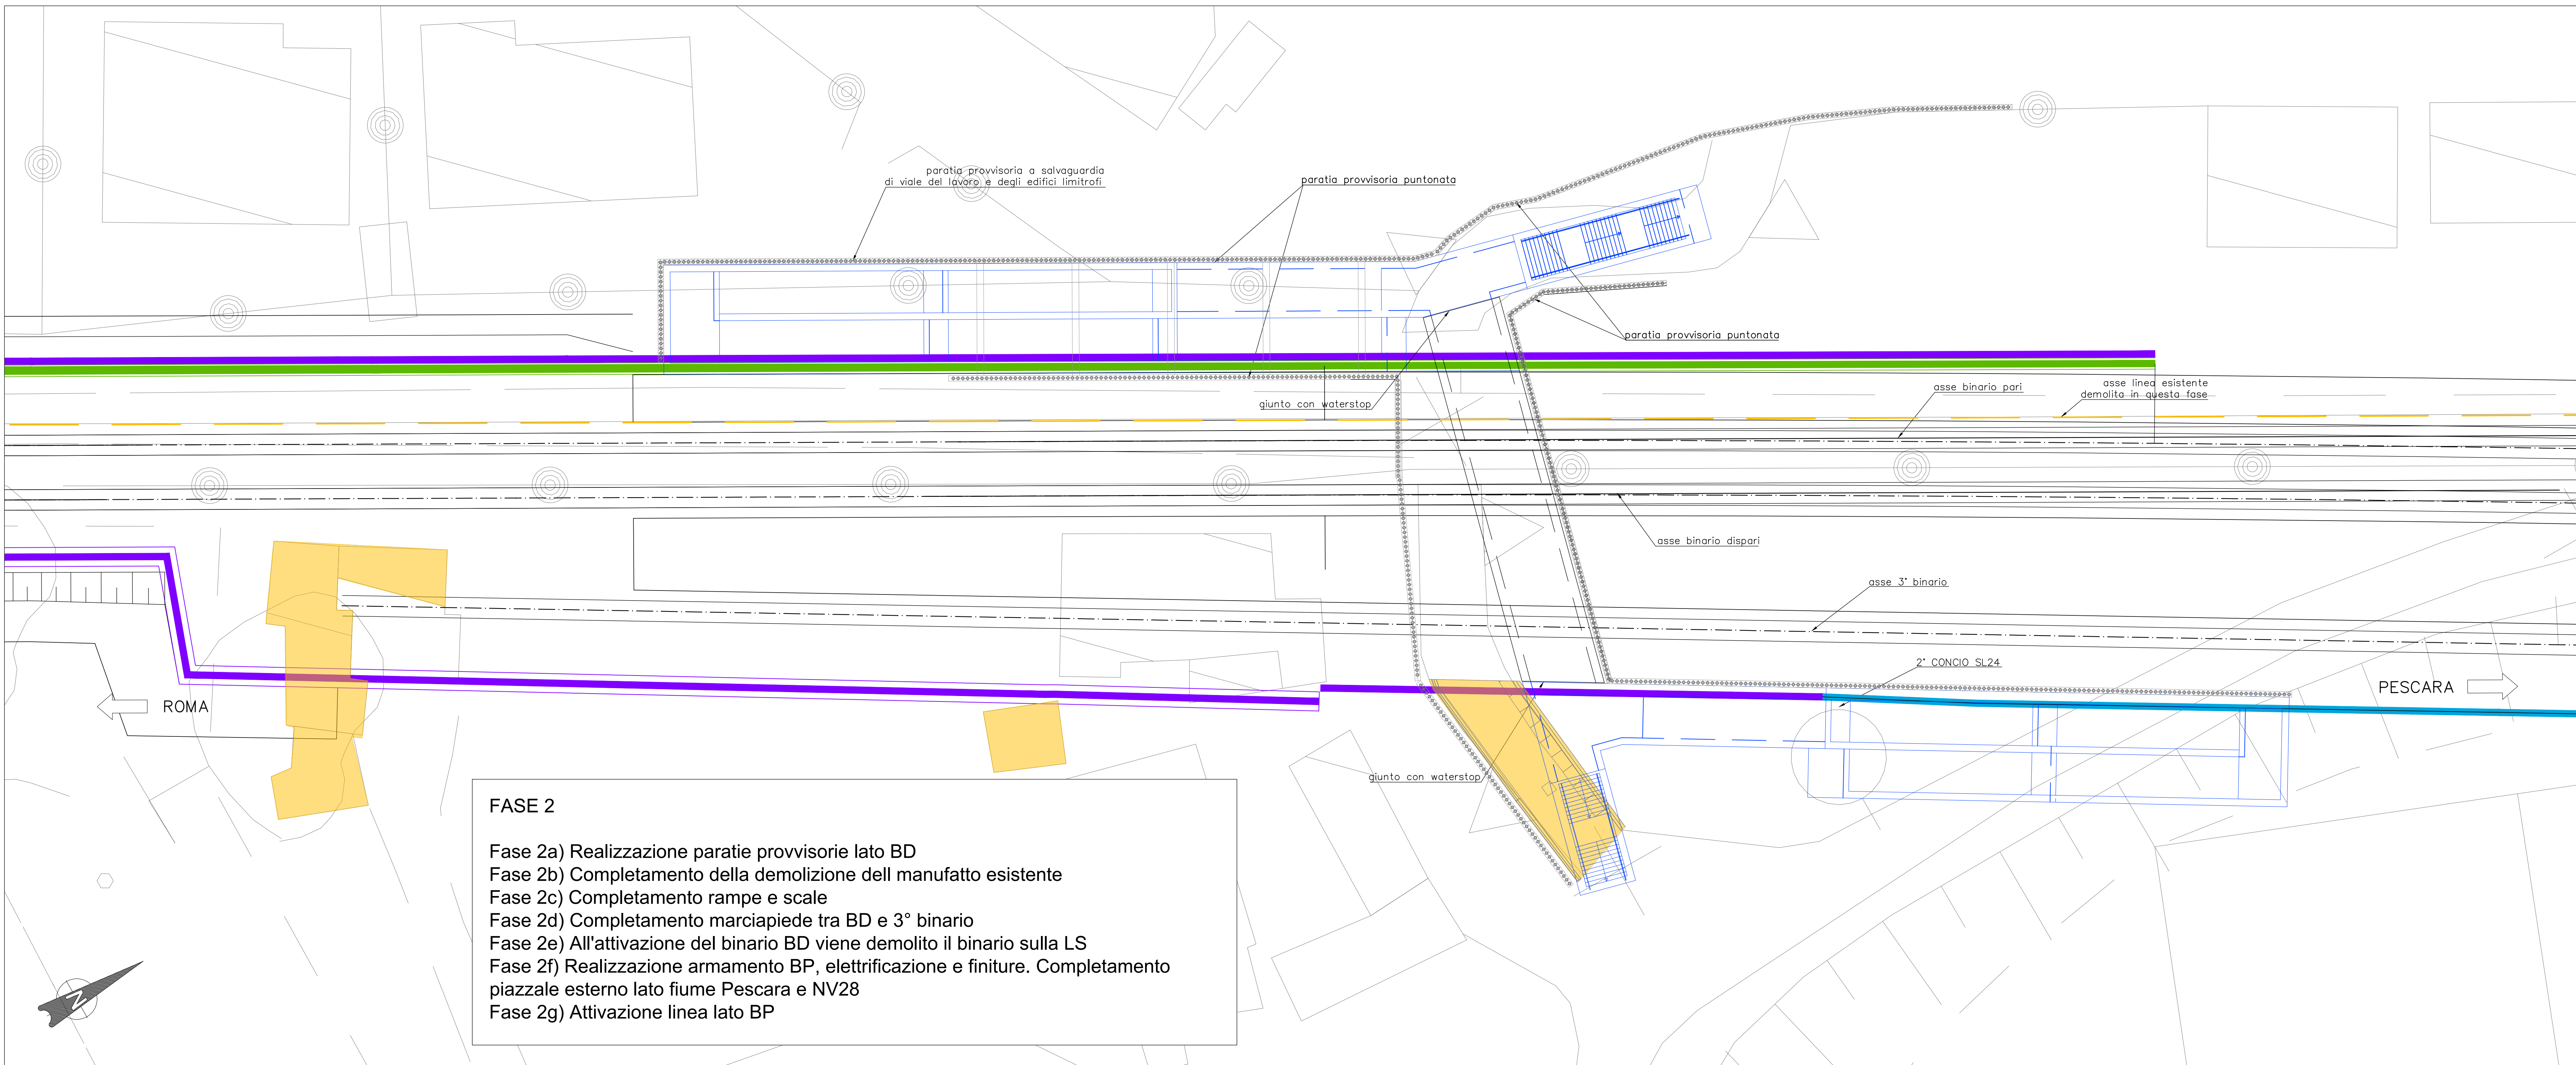

**FASE 2**

Fase 2a) Realizzazione paratie provvisorie lato BD

Fase 2b) Completamento della demolizione dell manufatto esistente

Fase 2c) Completamento rampe e scale

Fase 2d) Completamento marciapiede tra BD e 3° binario

Fase 2e) All'attivazione del binario BD viene demolito il binario sulla LS

Fase 2f) Realizzazione armamento BP, elettrificazione e finiture. Completamento piazzale esterno lato fiume Pescara e NV28

Fase 2g) Attivazione linea lato BP

**LEGENDA**

- DEMOLIZIONI
- REALIZZATO IN QUESTA FASE

**OPERE DI PROGETTO**

- BARRIERE ANTIRUMORE
- OPERE DI SOSTEGNO
- OPERE DI MITIGAZIONE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA CENTRO**  
**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA**

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA**  
**RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA SCAFA - MANOPPELLO**  
**(LOTTO 2)**

**SL24 - Sottopasso pedonale spinta alla pk 4+422,35**  
 Fasi costruttive

SCALA : 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA97	00	R	29	BZ	SL24/00	001	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	P. Luciani	Agosto 2021	P. Di Nocci	Agosto 2021	T. Pasquini	Agosto 2021	F. Arduni	Novembre 2021
B	Rev. a seguito richieste RFI	P. Luciani	Nov. 2021	P. Di Nocci	Nov. 2021	T. Pasquini	Nov. 2021		

File: I48700R29BZSL2400001B.dwg n. Elab.: 16-8
