


PLANIMETRIA DI FASI (1 di 2)


Scala 1:5000



DESCRIZIONE FASE 2.1.a

- Esercizio sulla linea storica e nel tratto di binario dispari di progetto dal Km 3+900 al Km 5+285;
- PRG di Manoppello: Chiusura binario di precedenza ed Esercizio solo sull'attuale binario di corsa "I";
- Demolizione binario di precedenza dell'attuale PRG di Manoppello;
- Adeguamento sede e marciapiede Stazione di Manoppello lato binario dispari;
- Breve chiusura di Esercizio per demolizione deviazione provvisoria e completamento nuovo binario dispari con relativa comunicazione P/D
- Ripristino Esercizio sulla linea storica e nel tratto di binario dispari di progetto dal Km 3+900 al binario "II" dell'attuale PRG di Manoppello;
- PRG di Manoppello: Ripristino Esercizio solo sul binario "II" (futuro dispari).


Tutte le lavorazioni delle OCCC vengono eseguite in presenza di esercizio ferroviario.

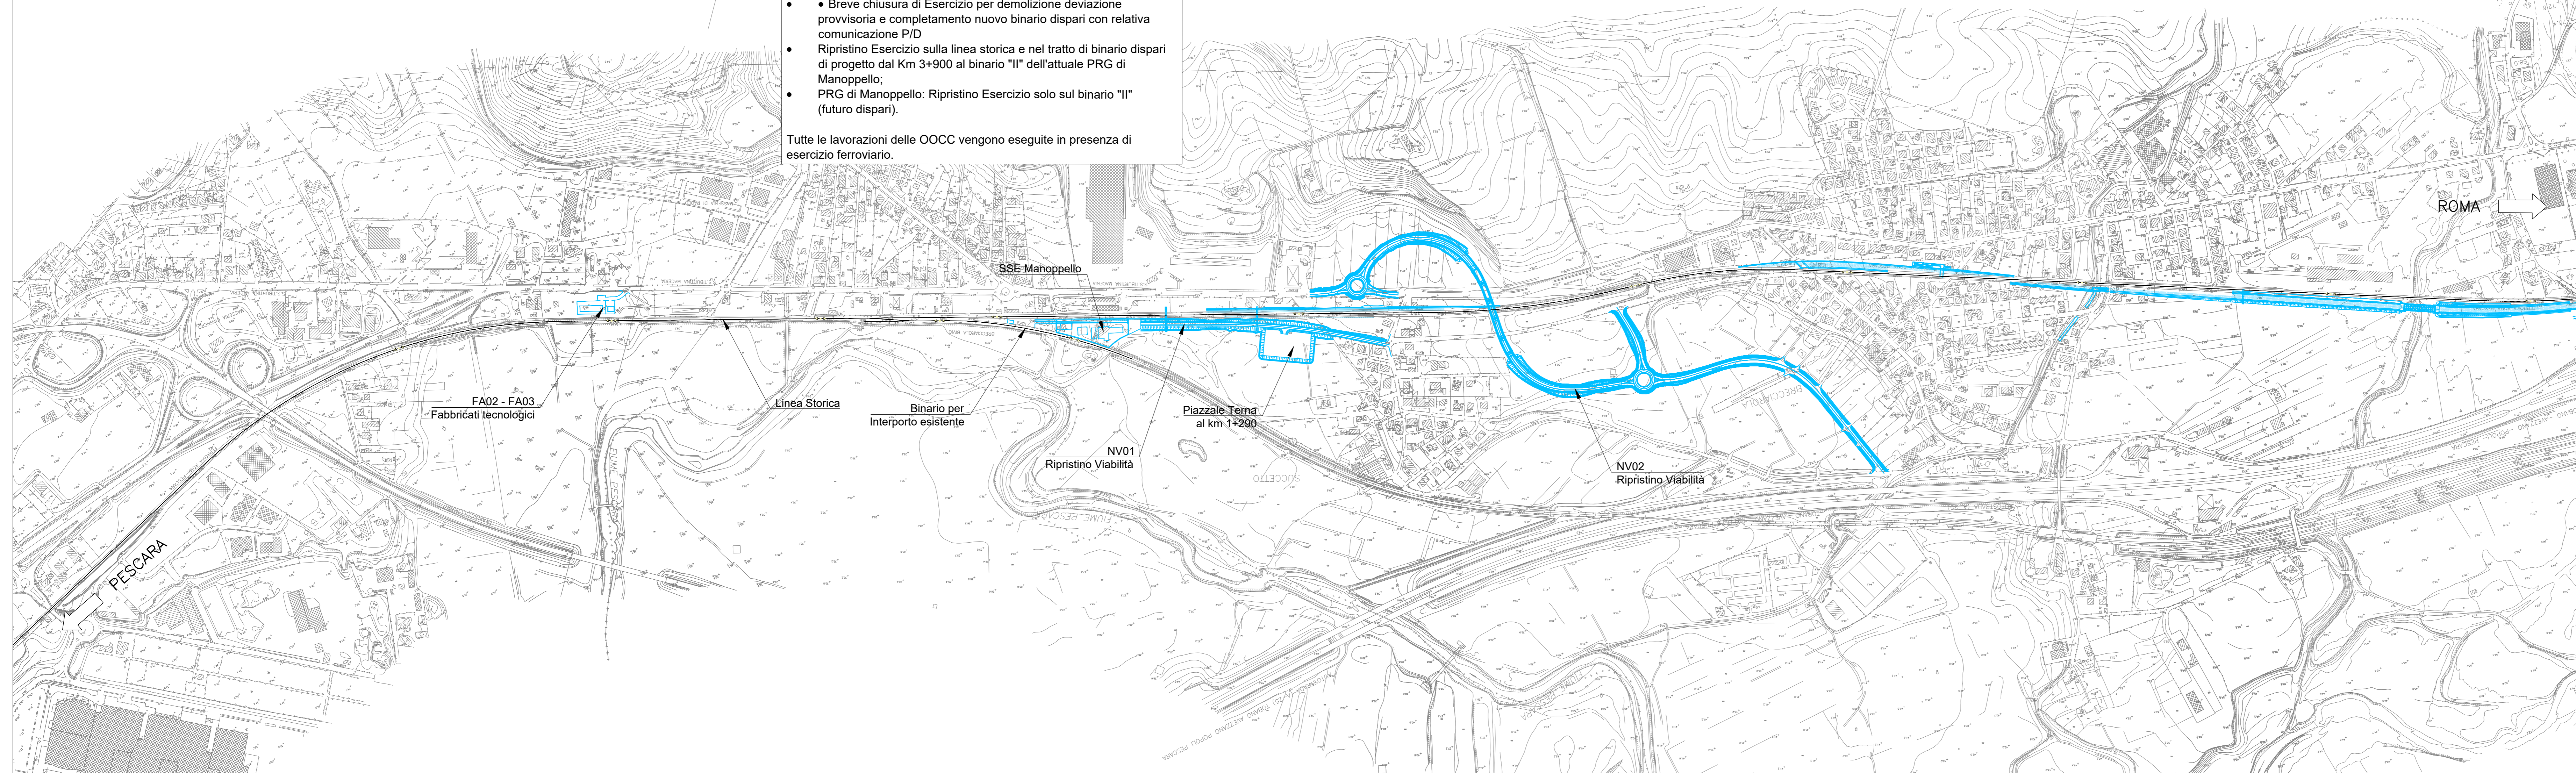

KEYPLAN

ROMA ↑

↓ PESCARA

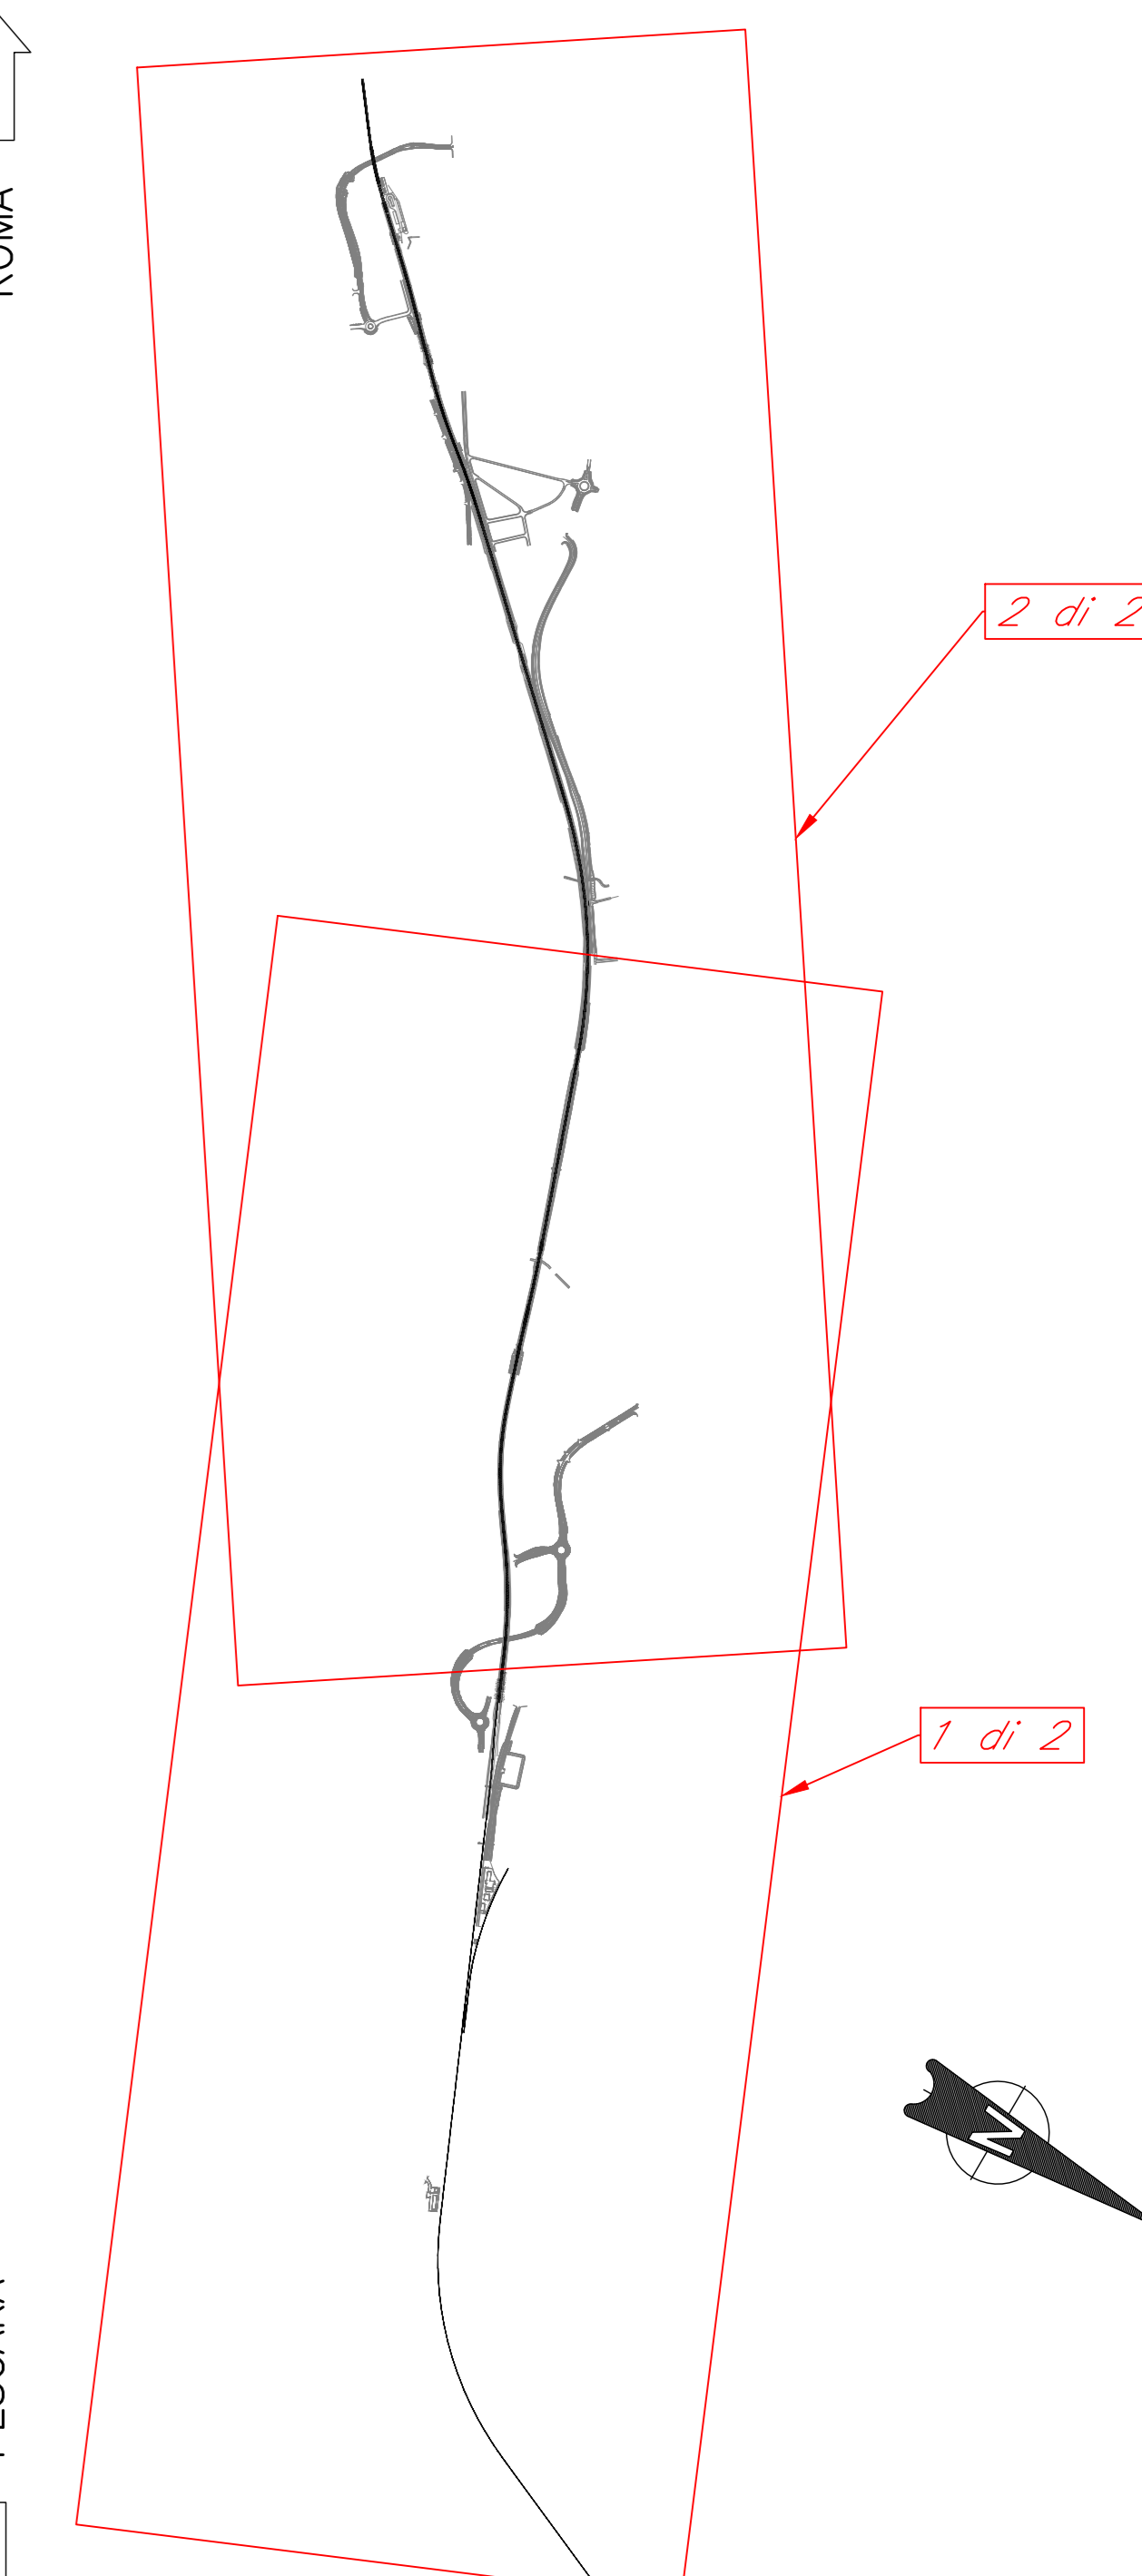


PLANIMETRIA DI FASI (2 di 2)

Scala 1:5000

DESCRIZIONE FASE 2.1.a

- Esercizio sulla linea storica e nel tratto di binario dispari di progetto dal Km 3+900 al Km 5+285;
- PRG di Manoppello: Chiusura binario di precedenza ed Esercizio solo sull'attuale binario di corsa "I";
- Demolizione binario di precedenza dell'attuale PRG di Manoppello;
- Adeguamento sede e marciapiede Stazione di Manoppello lato binario dispari;
- Breve chiusura di Esercizio per demolizione deviazione provvisoria e completamento nuovo binario dispari con relativa comunicazione P/D;
- Ripristino Esercizio sulla linea storica e nel tratto di binario dispari di progetto dal Km 3+900 al binario "II" dell'attuale PRG di Manoppello;
- PRG di Manoppello: Ripristino Esercizio solo sul binario "II" (futuro dispari).

Tutte le lavorazioni delle OCCC vengono eseguite in presenza di esercizio ferroviario.

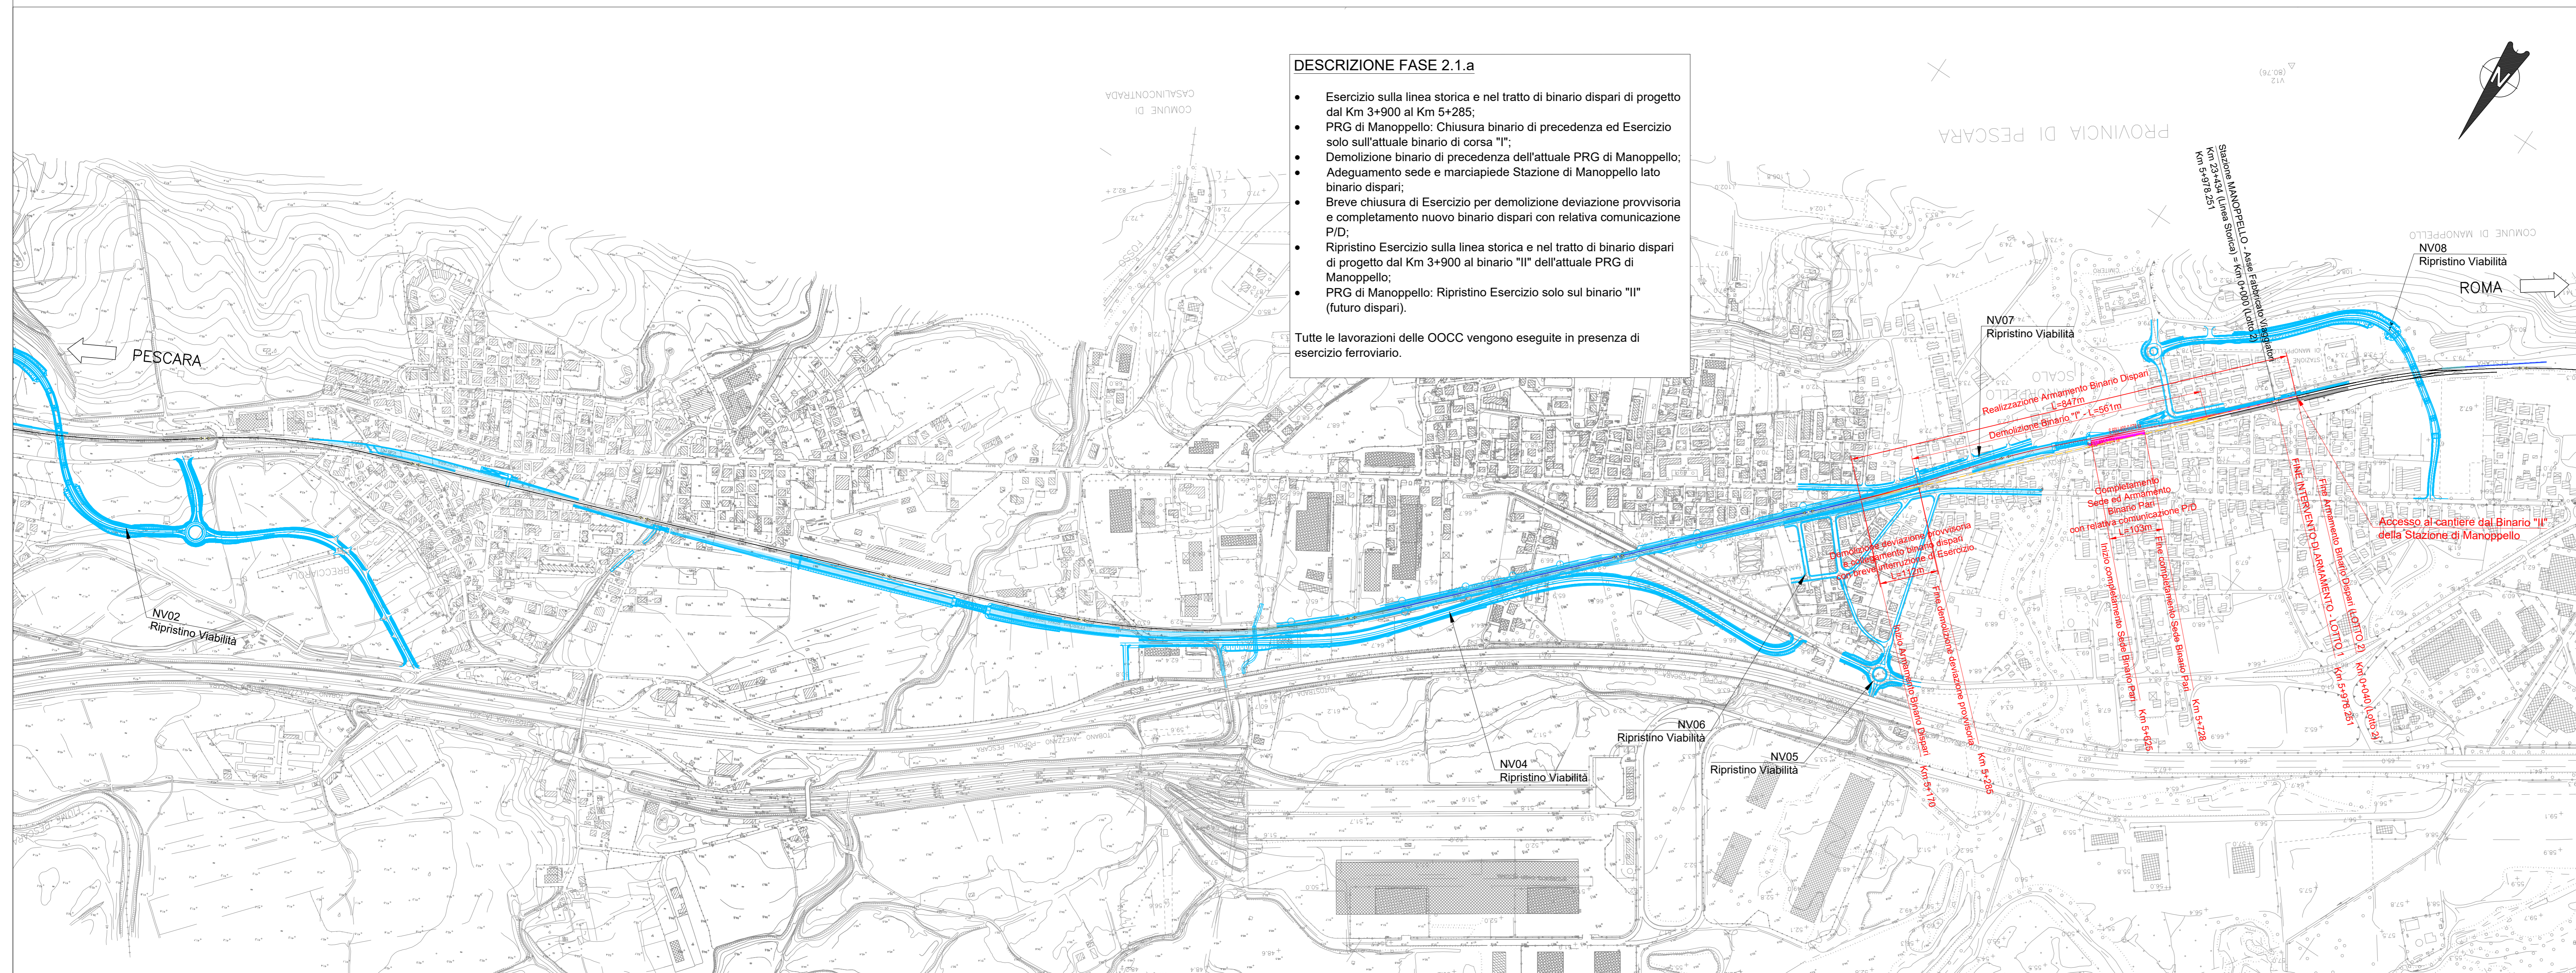

LEGENDA FASI

	Binario esistente		Binario in esercizio
	Binario demolito nella fase corrente		
	Binario di progetto costruito nella fase corrente		
	Binario di progetto costruito nelle fasi precedenti		
	Binario provvisorio costruito nella fase corrente		
	Binario provvisorio costruito nelle fasi precedenti		
	Piattaforma ferroviaria costruita nella fase corrente		
	Piattaforma ferroviaria costruita nelle fasi precedenti		
	Opere esistenti		
	Opere civili costruite nella fase corrente		
	Opere civili costruite nelle fasi precedenti		
	Opere civili demolite nella fase corrente		

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA CENTRO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA INTERPORTO D'ABRUZZO - MANOPPELLO (LOTTO 1)
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
 Fasi esecutive - Planimetria di fasi - Macrofase 2.1.a

SCALA: 1:5000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA96	00	R	29	P5	IF0004	005	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	P. Luciani	Agosto 2021	M. Pavesi	Agosto 2021	T. Pasolini	Agosto 2021		
B	Rev. richieste RFI	P. Luciani	Nov. 2021	M. Pavesi	Nov. 2021	T. Pasolini	Nov. 2021		

File: IA9600R29P5F0004005B.dwg n. Elab.: 6.30
