



FASE 1

- 1) Con esercizio Linea Tirrenica e LL Paola – Cosenza su opere esistenti, realizzazione ponte provvisorio Gui.Do. a doppio Binario
- 2) Realizzazione OOPP con paratie di pali a tergo delle spalle delle opere esistenti
- 3) Realizzazione armamento varianti provvisorie BP Linea Tirrenica su opera esistente e BD Linea Tirrenica e LL Paola – Cosenza su ponte provvisorio e attivazione all'esercizio varianti provvisorie
- 4) Demolizione impalcati esistenti BP/BD Linea Tirrenica

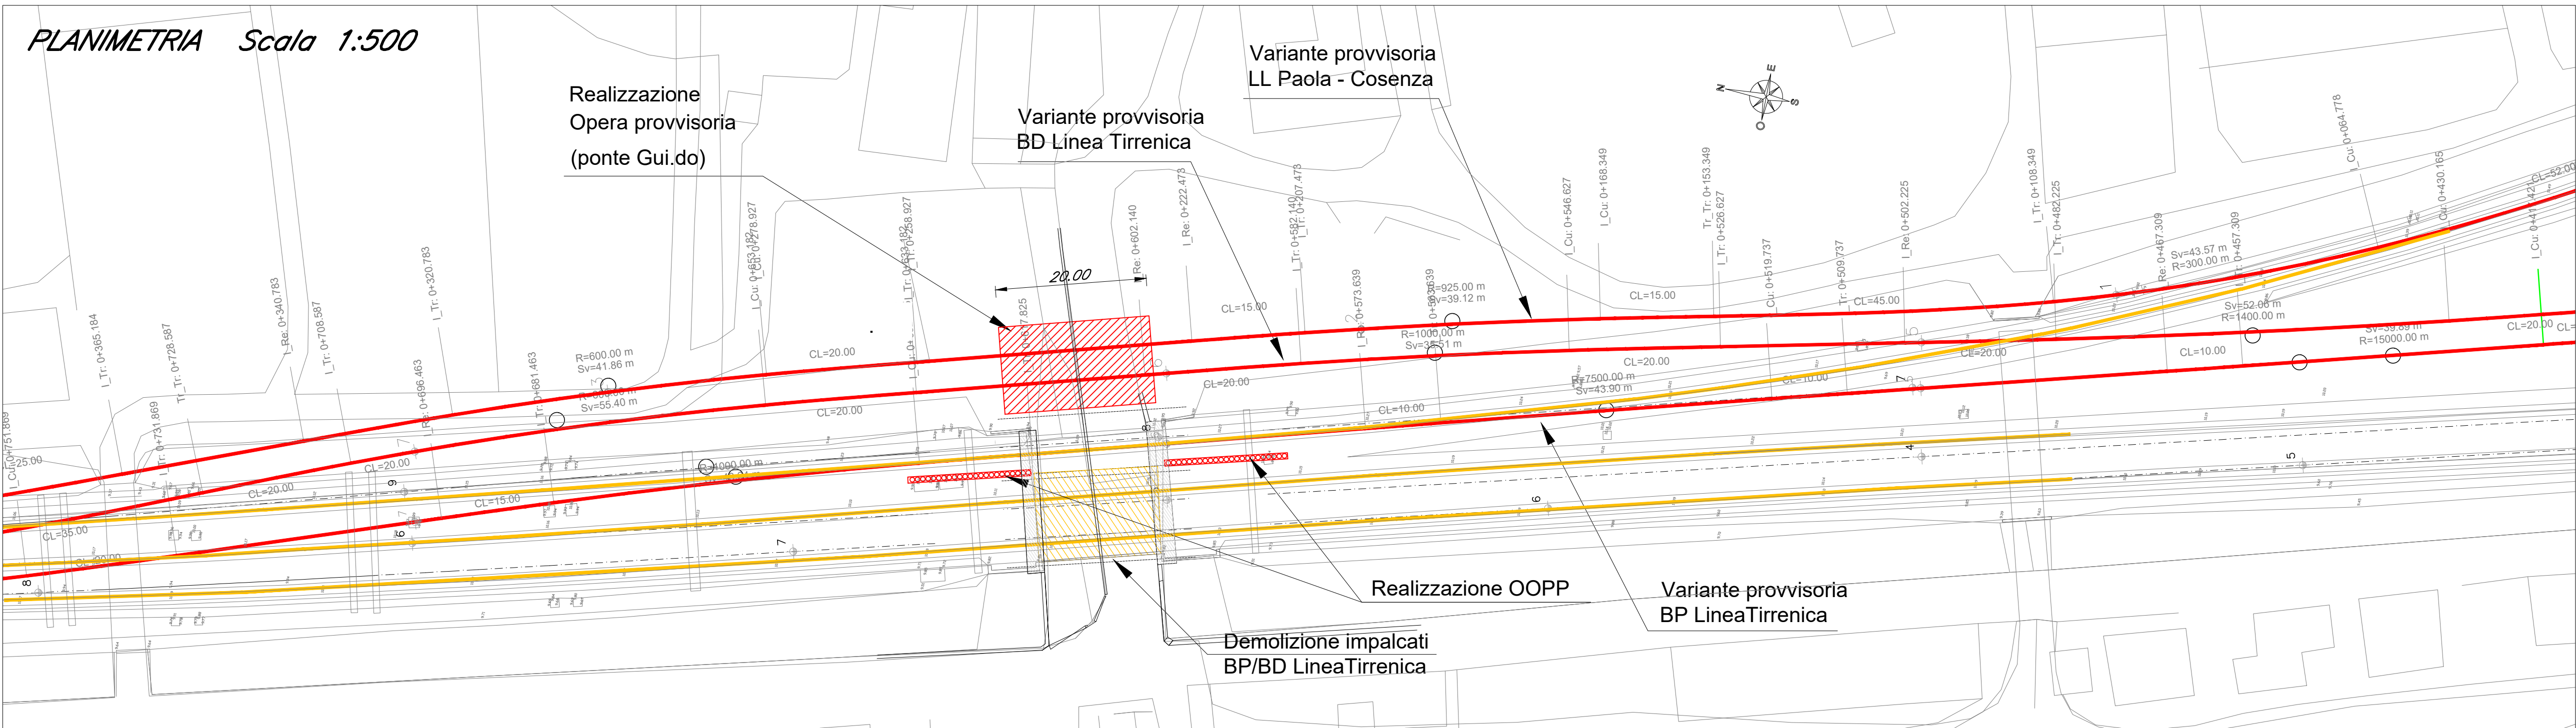


FASE 2

- 1) Con esercizio BP Linea Tirrenica su opera esistente e BD Linea Tirrenica e LL Paola – Cosenza su ponte provvisorio, realizzazione nuovo viadotto Linea Tirrenica a doppio binario (VI07B)
- 2) Realizzazione armamento definitivo Linea Tirrenica su nuova opera
- 3) Spostamento esercizio Linea Tirrenica su sede definitiva
- 4) Dismissione variante provvisoria BP Linea Tirrenica su opera esistente e BD Linea Tirrenica su ponte provvisorio e rimozione ponte provvisorio
- 5) Con esercizio LL Paola – Cosenza su ponte provvisorio, demolizione viadotto esistente LL Paola – Cosenza

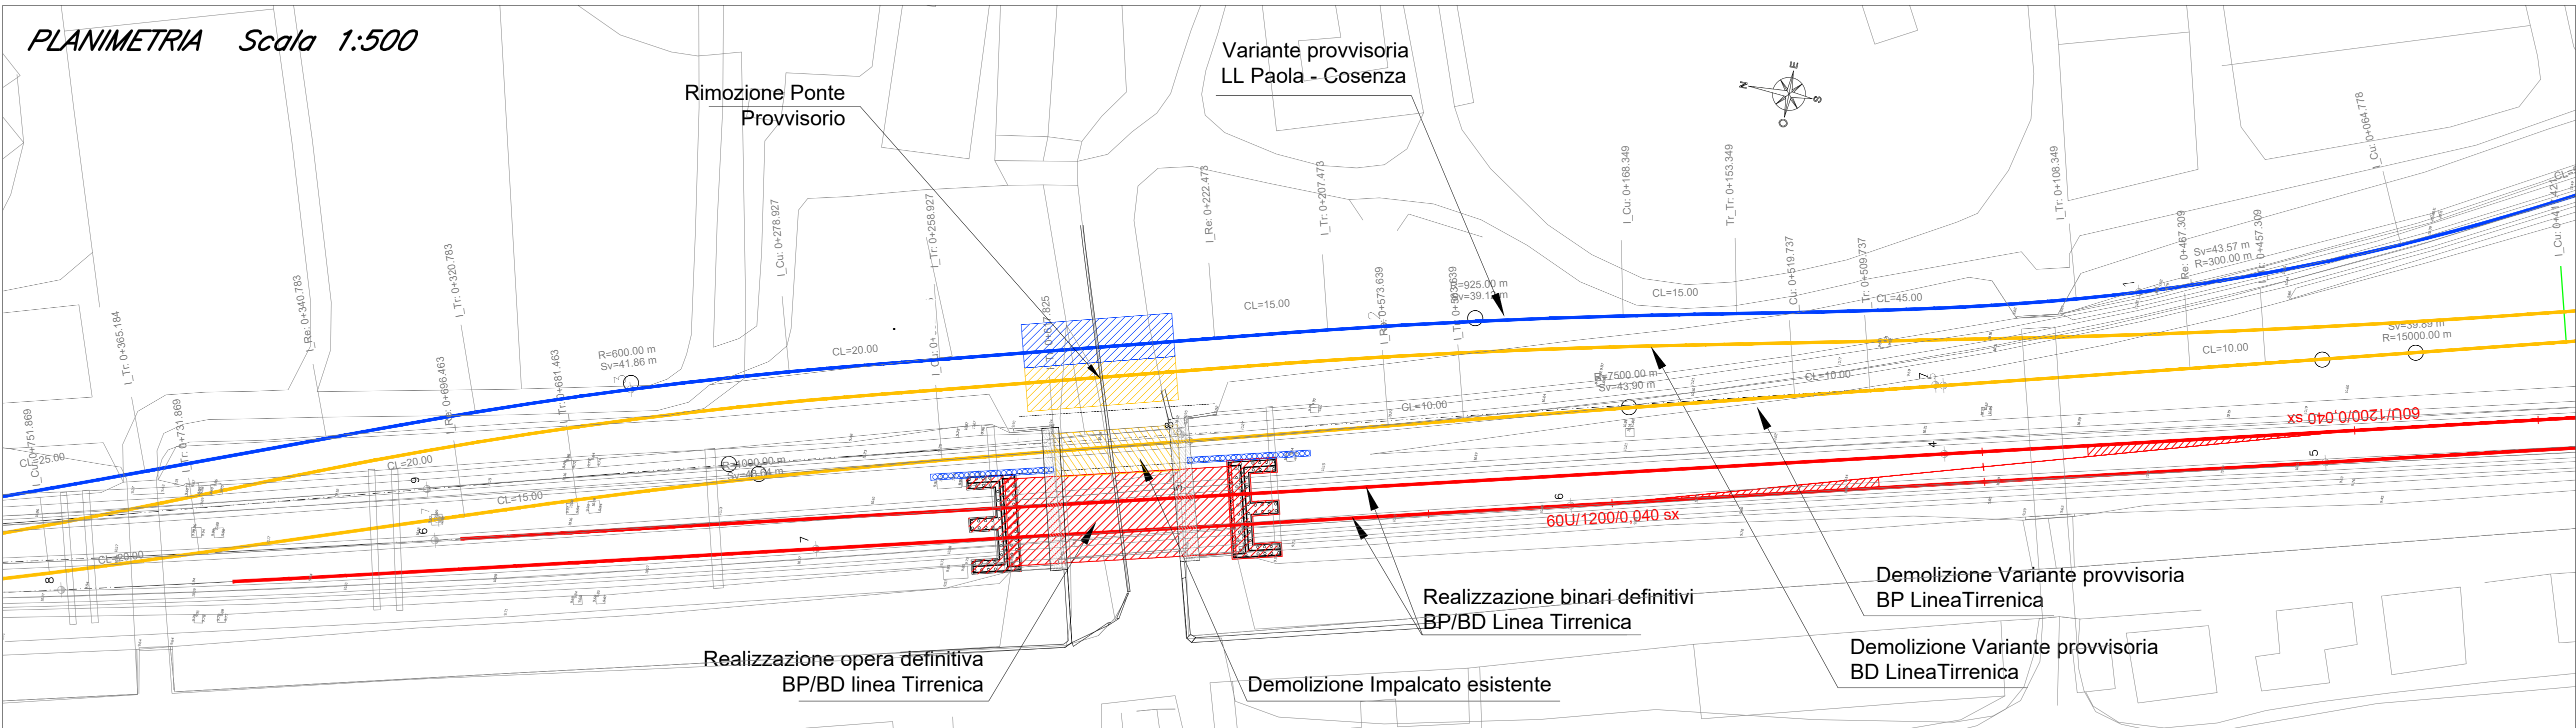


FASE 3

- 1) Demolizione porzione di paratia provvisionale interferente con le fondazioni delle spalle fino alla quota di fondo scavo
- 2) Con esercizio LL Paola – Cosenza su ponte provvisorio, realizzazione nuovo viadotto Linea Paola – Cosenza a singolo binario (VI07A)


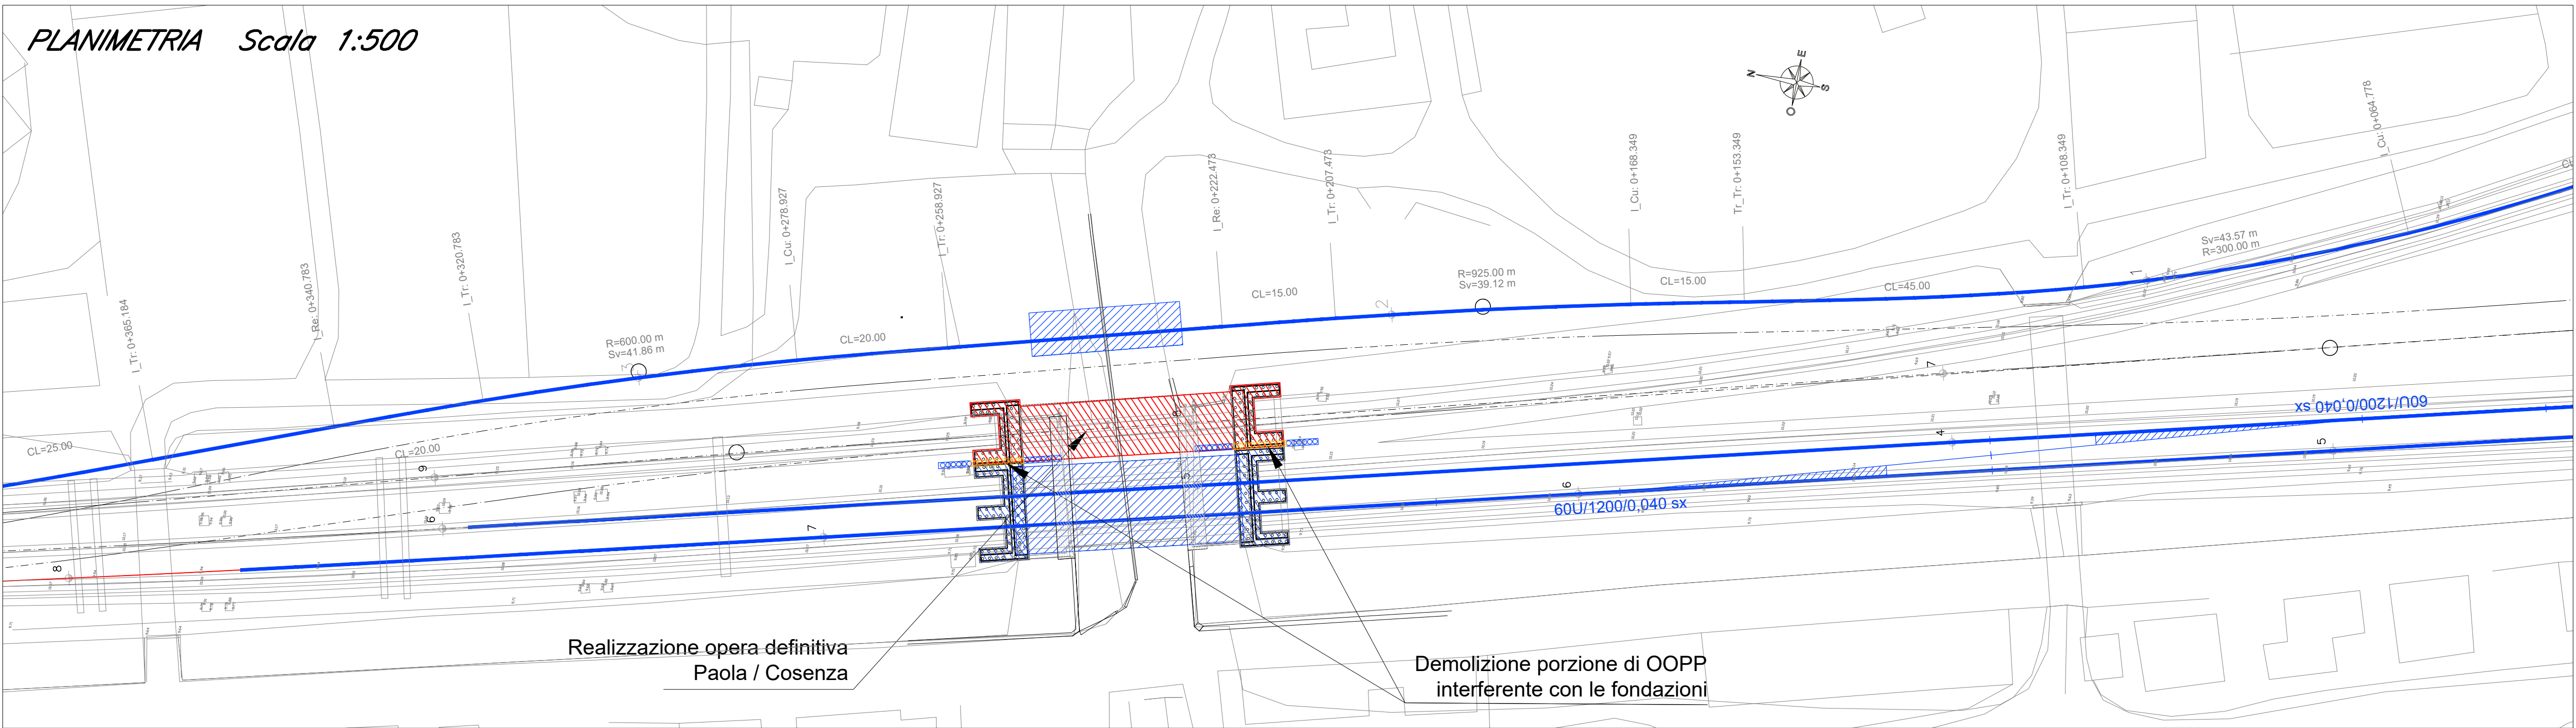


FASE 4

- 1) Completamento armamento definitivo Linea Paola – Cosenza
- 2) Esercizio su viadotto definitivo a singolo binario VI07A (linea Paola – Cosenza)
- 3) Demolizione deviata provvisoria LL Paola – Cosenza
- 4) Rimozione ponte provvisorio e demolizione sede

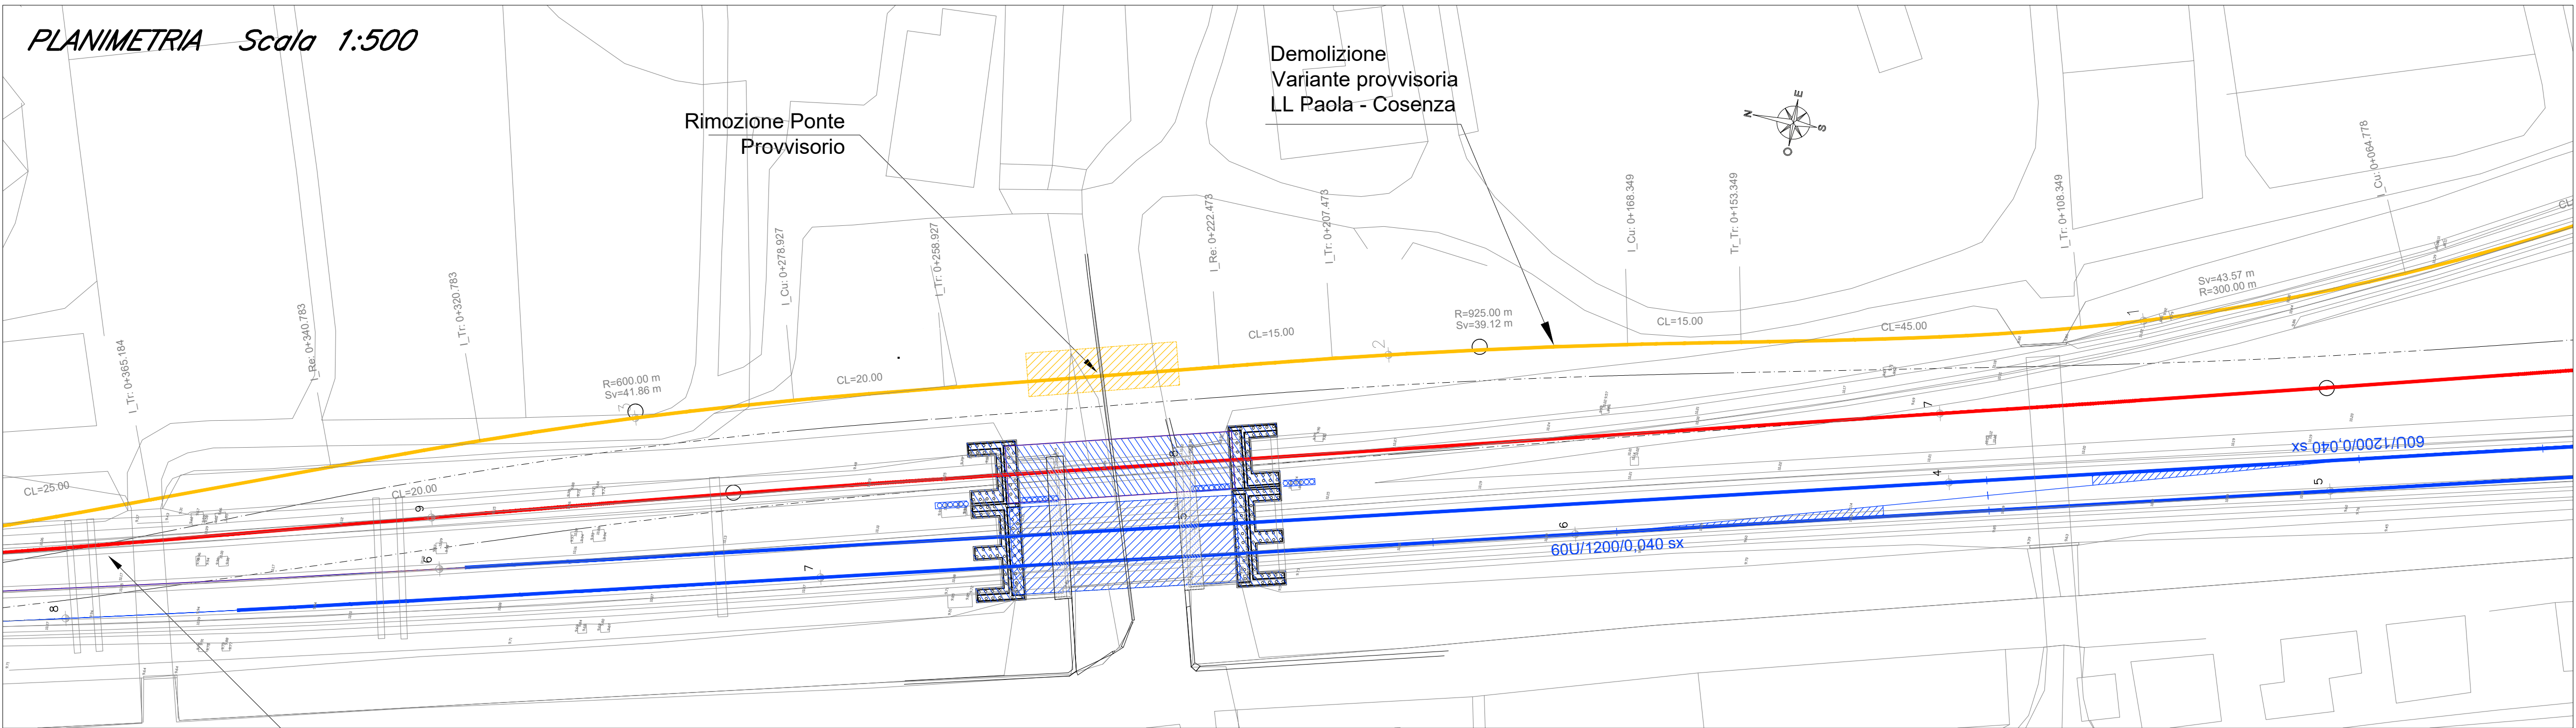

PIANTA CHIAVE

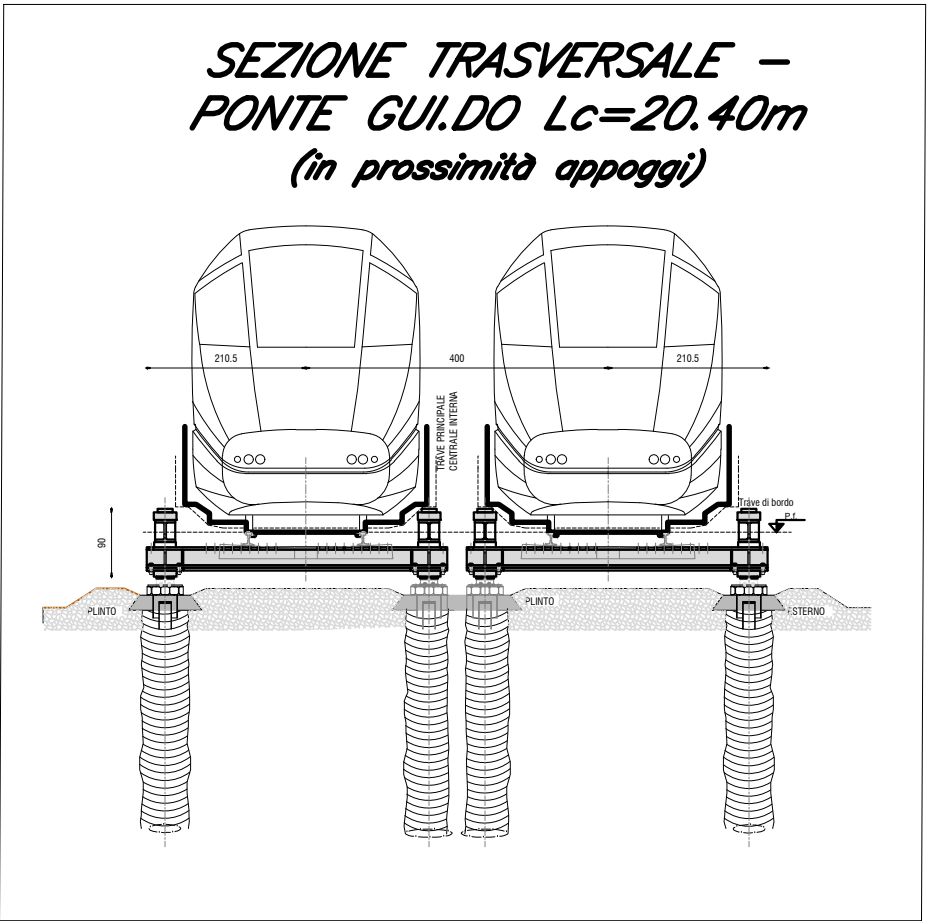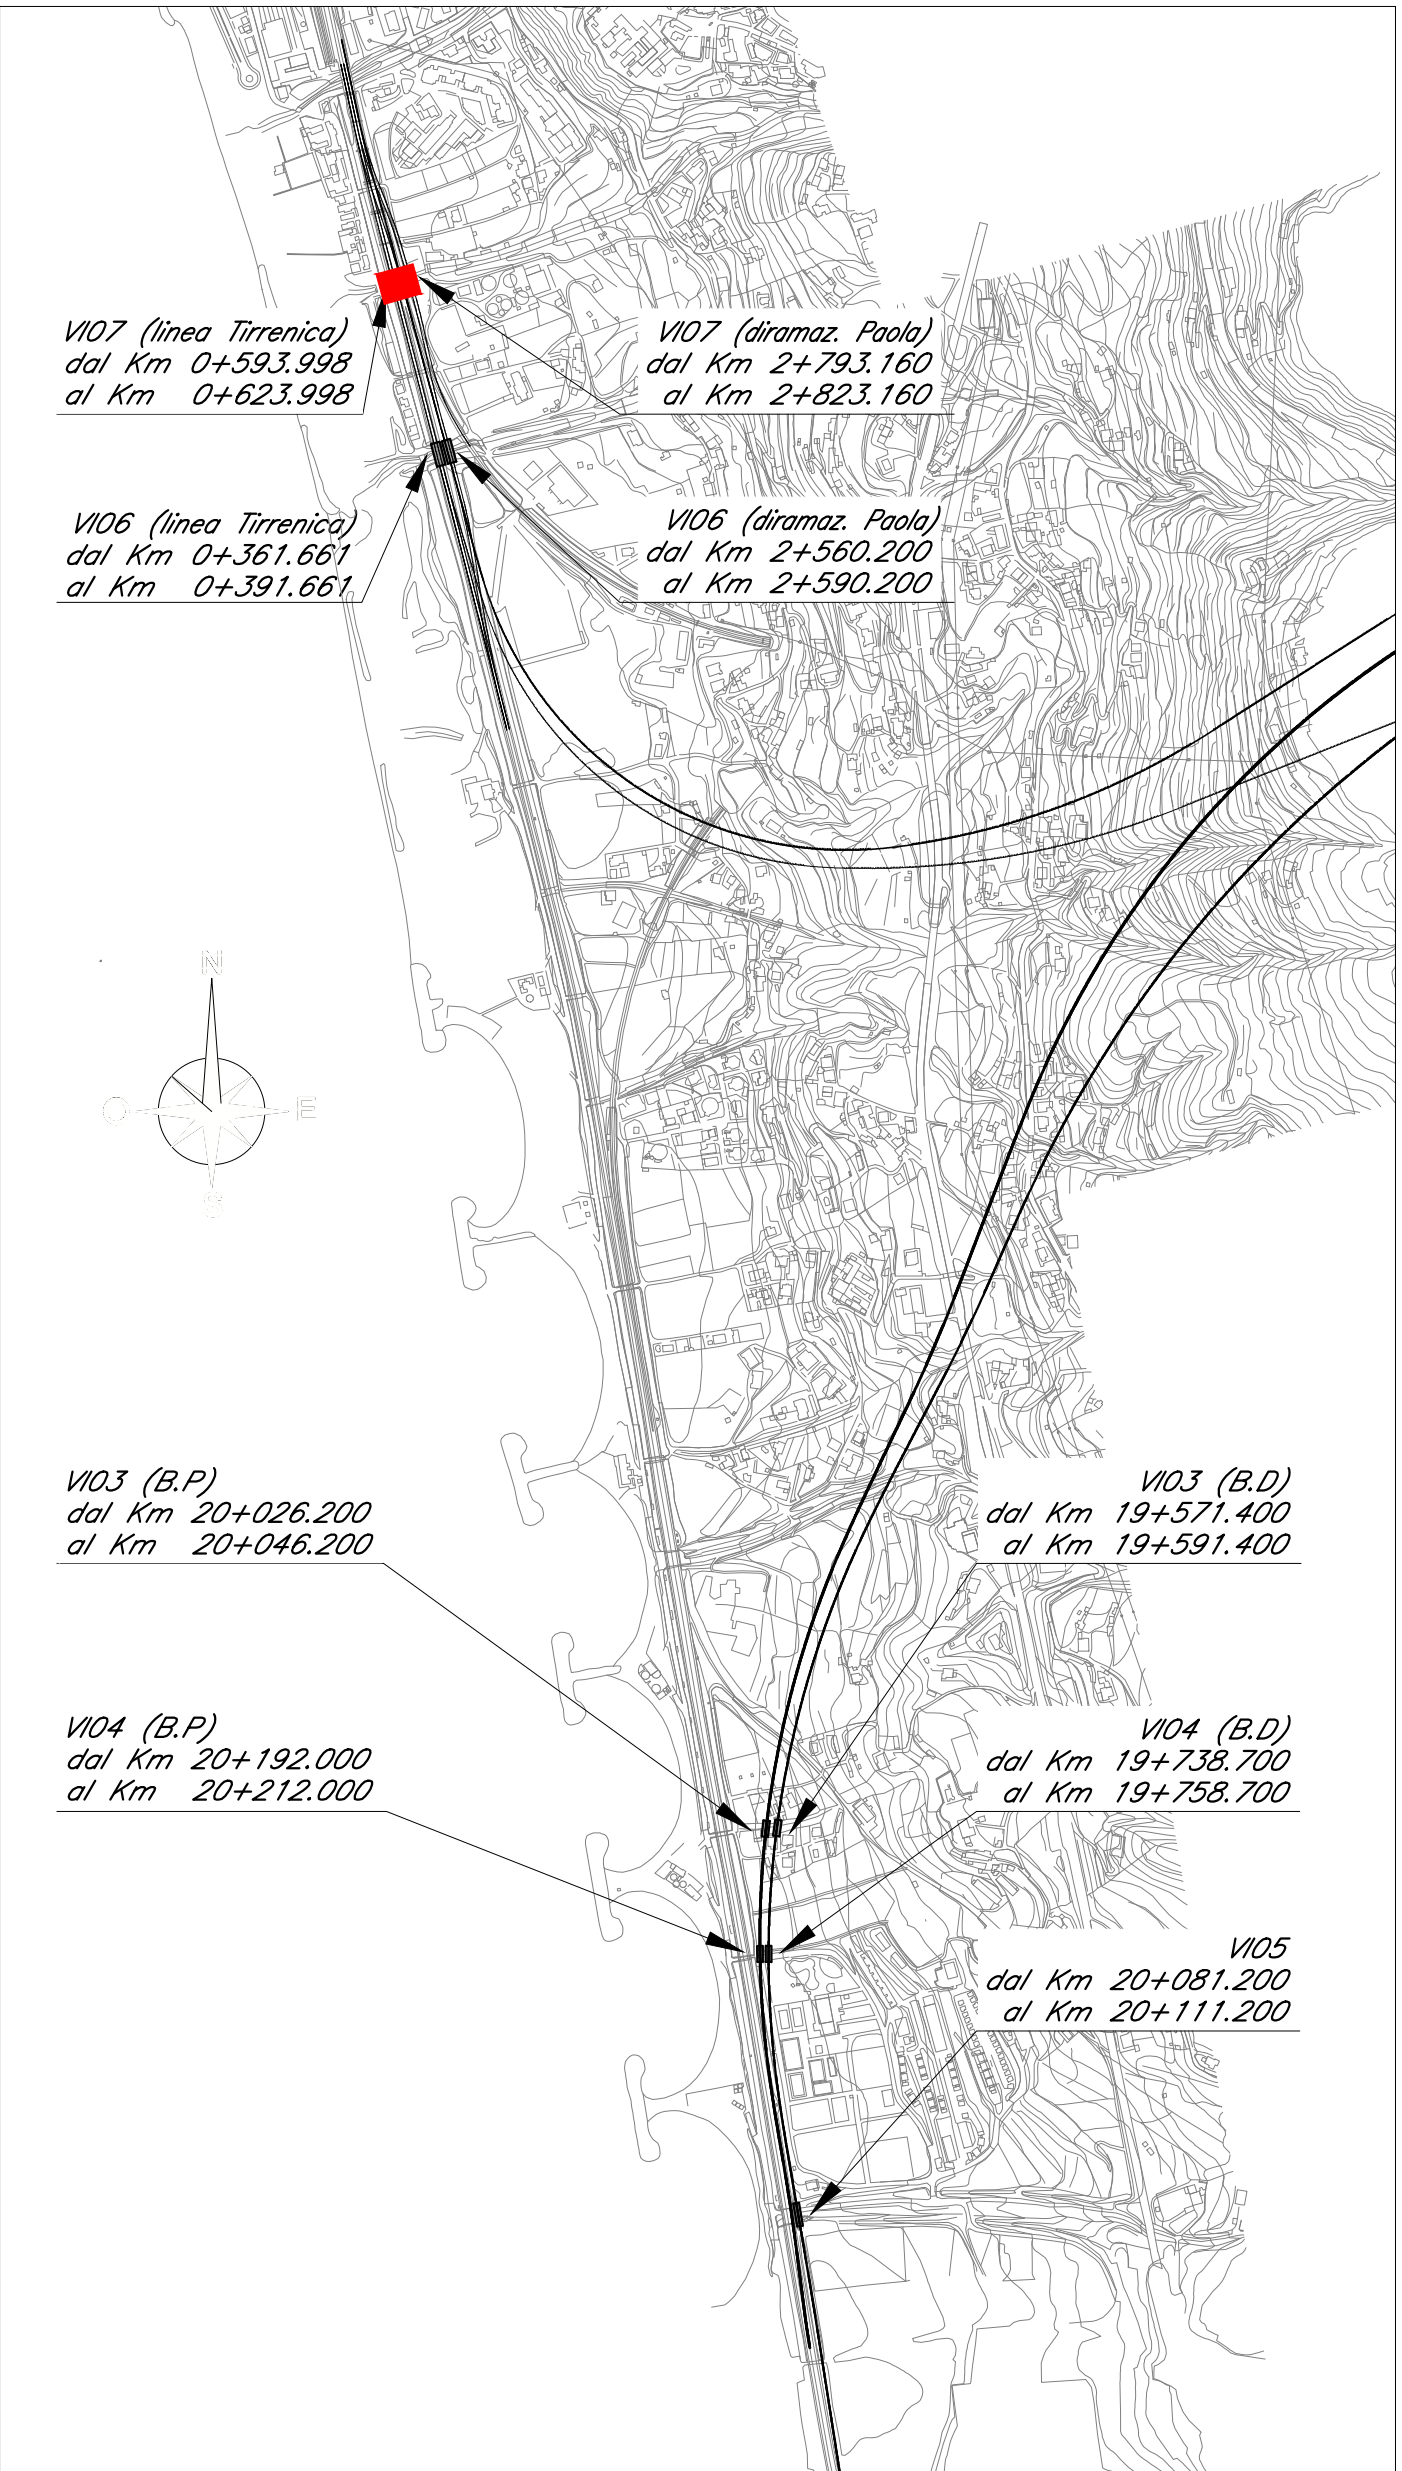

COMMITTENTE:			
PROGETTAZIONE:			
S.O. OPERE CIVILI			
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA			
LINEA COSENZA - PAOLA / S.LUCIDO NUOVA LINEA AV SALERNO - REGGIO CALABRIA RADDOPPIO COSENZA - PAOLA / S.LUCIDO			
VIADOTTI FERROVIARI VI07 - Ponte su Torrente Zio Petruzzo Fasi esecutive			
SCALA:			1:500
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE
RC1C	03	R	09
Doc.	PZ	VI	0700
Rev.	Descrizione	Redatto	Data
A	Emissione esecutiva	A. Tagliari	13/10/2013
Verificato	Data	Approvato	Data
A. Fusi	13/10/2013	G. Giliberti	13/10/2013
Autore	Data	Autore	Data
A. Vittori	13/10/2013	A. Vittori	13/10/2013
File: RC1C03R09P2VI0700001A.DWG			
n.Elab.:			
